【广东卷】

试题二

下表是一个软件项目在编码阶段各活动的计划和实际完成情况(工作量，单位：人天， 假设工作量成本：1 万元/人天)。

活动		A	B	C	D	E	F	G	H
计划工作量	第 1 周	30							
	第 2 周		30	40					
	第 3 周				70	40			
	第 4 周						80		
	第 5 周							40	70
实际工作量	第 1 周	40		—		—			
	第 2 周		30	—	—				
	第 3 周			50	60	30			
	第 4 周		—					30	
	第 5 周	—	—				100		80

【问题 1】(9 分)

为了实施项目的过程跟踪，项目经理制定了如下过程跟踪表，请补齐表中的数据 (PV/EV/AC 值保留整数，SPI/CPI 保留 2 位小数，单位：万元)

完成时间	第 1 周	第 2 周	第 3 周	第 4 周	第 5 周
PV	30	100	210		400
EV	30		210		400
AC	40	70			
SPI	1	0.6			1
CPI	0.75	0.86		1.04	0.95

【问题 2】(4 分)

请说明第 4 周时项目的绩效情况，并说明理由。

【问题 3】(3 分)

第 4 周时，项目经理准备采取如下措施，请指出各措施可能会带来的负面风险。

(1) 快速跟进

(2) 减小活动范围或降低活动要求

(3) 改进方法或技术

【问题 4】(5 分)

第 4 周时项目经理认为，照此情况，项目的这种偏差情况还会延续到项目的收尾阶段， 项目总成本会发生变化，请计算项目总成本会超出预算多少？(结果保留整数)


【全国卷】

试题二（22分）

阅读下列说明，回答问题1至问题3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某项目的网络资源计划如图所示，已知每位工程师的日均成本为400元／天。

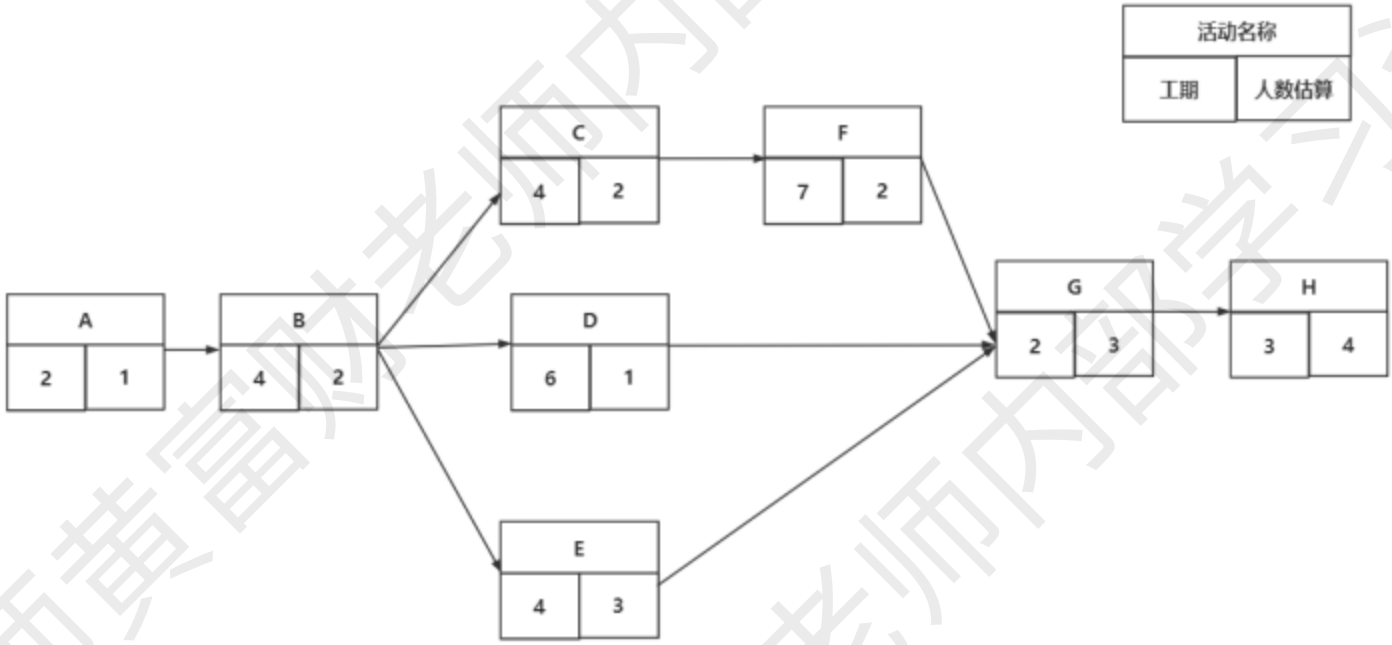

【问题1】（5分）

请计算项目的工期及关键路径，并说明活动E最晚应在哪天开始，依据是什么？

【问题2】（8分）

第9日工作结束时，项目组已完成ABC三项工作，D工作完成了三分之一，E工作完成了二分之一，其余工作尚未开展，此时人力资源管理部门统计总人力成本为9800元。

（1）请给出项目此时的挣值；

（2）计算此时项目的SV和CV，并评价项目当前的进度绩效和成本绩效。

【问题3】（9分）

假设每位工程师均可胜任各项工作，在不影响工期的前提下，可重新安排有关活动的顺序以减少项目所需人数。此种情况下，请按照项目的网络资源计划，画出项目的时标网络计划图，并判断该项目最少需要多少人？
