默写内容归纳（多看，多理解，不要死背）

1、可行性分析的内容（7个）

投资必要性、技术可行性、财务可行性、组织可行性
经济可行性、社会可行性、风险因素及对策

2、职能型，项目型结构的优缺点，矩阵型的缺点

（1）职能型组织

优点：

(1)强大的技术支持，便于知识、技能和经验的交流。
(2)清晰的职业生涯晋升路线。
(3)直线沟通、交流简单、责任和权限很清晰。
(4)有利于重复性工作为主的过程管理。

缺点：

(1)职能利益优先于项目，具有狭隘性
(2)组织横向之间的联系薄弱、部门间沟通、协调难度大
(3)项目经理极少或缺少权利、权威
(4)项目管理发展方向不明，缺少项目基准等

（2）项目型组织

优点：

(1)结构单一，责权分明，利于统一指挥。
(2)目标明确单一。
(3)沟通简洁、方便。
(4)决策快。

缺点：

(1)管理成本过高，如项目的工作量不足则资源配置效率低
(2)项目环境比较封闭，不利于沟通、技术知识等共享
(3)员工缺乏事业上的连续型和保障等

（3）矩阵型组织


缺点

(1)管理成本增加
(2)多头领导
(3)难以监测和控制
(4)资源分配与项目优先的问题产生冲突
(5)权利难以保持平衡等

3、项目管理计划、项目章程的内容

●项目管理计划的内容有13大子计划+3大基准以及下面的内容

(1)所使用的项目管理过程。
(2)每个特定项目管理过程的实施程度。
(3)完成这些项目的工具和技术的描述。
(4)选择的项目的生命周期和相关的项目阶段。
(5)如何用选定的过程来管理具体的项目。
(6)如何执行工作来完成项目目标。
(7)如何监督和控制变更。
(8)如何实施配置管理。



(9)如何维护项目绩效基线的完整性。
(10)与项目干系人进行沟通的要求和技术。
(11)为项目选择的生命周期模型。
(12)为了解决某些遗留问题和未定的决策，对于其内容、严重程度和紧迫程度进行的关键管理评审。

●项目章程的内容：（大概的，粗略的）

(1)项目的主要风险
(2)可测量的项目目标和相关的成功标准。
(3)总体预算。
(4)项目的总体要求，包括项目的总体范围和总体质量要求。
(5)总体里程碑进度计划。
(6)项目描述和项目产品描述。
(7)项目目的或批准项目的理由
(8)发起人或批准项目章程的人员的姓名和职权。
(9)项目的审批要求
(10)委派的项目经理及其职责和职权。

4、项目经理作为整合者的工作

整合者是项目经理承担的重要角色之一，他要通过沟通来协调，通过协调来整合。作为整合者，项目经理必须从宏观视角来审视项目。
作为整合者，项目经理必须：
(1)通过与项目干系人主动、全面的沟通，来了解他们对项目的需求。
(2)在相互竞争的众多干系人之间寻找平衡点。
(3)通过认真、细致的协调工作，来达到各种需求间的平衡，实现整合。
其他九大领域的管理，最终是为了实现项目的整体管理，实现项目目标的综合最优。

5、项目章程的作用

（1）确定项目经理，规定项目经理的权力。
（2）正式确认项目的存在，给项目一个合法的地位。
（3）规定项目的总体目标，包括范围、时间、成本和质量等。
（4）通过叙述启动项目的理由，把项目与执行组织的日常经营运作及战略计划等联系起来。

6、变更流程,变更的原因

●项目变更的原因

项目变更的原因很多，常见的有：
(1)产品范围（成果）定义的过失或者疏忽；
(2)项目范围（工作）定义的过失或者疏忽；
(3)客户提出新需求；
(4)应对风险的紧急措施或规避措施；
(5)项目执行过程与项目基准要求不一致带来的被动调整（如进度、质量、成本等）；
(6)项目团队人员调整；
(7)技术革新的要求；
(8)外部事件（例如政策变动或自然环境变化等）。

●变更流程

(1)提出变更申请
(2)变更影响分析
(3)CCB 审查批准

(4)实施变更
(5)监控变更实施
(6)验证和发布


7、范围说明书的内容（标书求姐夫制假）
(1)项目目标
(2)产品范围描述
(3)项目需求
(4)项目边界
(5)项目的可交付成果
(6)项目的制约因素
(7)假设条件

8、WBS 的分解的过程，8 个原则（注意事项）
(1)在层次上保持项目的完整性，避免遗漏必要的组成部分。
(2)一个工作单元只能从属于某个上层单元，避免交叉从属。
(3)相同层次的工作单元应用相同性质。
(4)工作单元应能分开不同的责任者和不同的工作内容。
(5)便于项目管理计划和项目控制的需要。
(6)最底层工作应该具有可比性，是可管理的，可定量检查的。
(7)应包括项目管理工作，包括分包出去的工作。
(8)一般情况下，工作分解结构应控制在 3～6 层为宜。
(9)WBS 的最低层次的工作单元是工作包。需要遵守 8/80 原则。

9、树型，列表型优缺点
1.分级的树型结构
优点:树型结构图的 WBS 层次清晰，非常直观，结构性强
缺点:但是不容易修改，对于大型的、复杂的项目也很难表示出项目的全缺点现。
适用:由于其直观性，一般在一些小的、适中的应用项目中用得较多
2.表格形式
优点:格能够反映出项目所有的工作要素
缺点:直观性较差。
适用:但在一些大型的、复杂的项目中使用还是较多的，因为有些项目分解后，内容分类较多、容量较大，用缩进表的形式表示比较方便也可装订为手册

10、缩短工期的方法，进度压缩优缺点
●缩短工期的方法:
(1)赶工，投入更多的资源或增加工作时间，以缩短关键活动的工期；
(2)快速跟进，并行施工，以缩短关键路径的长度；
(3)使用高素质的资源或经验更丰富的人员；
(4)减小活动范围或降低活动要求；
(5)改进方法或技术，以提高生产效率；
(6)加强质量管理，及时发现问题，减少返工，从而缩短工期。
●进度压缩优缺点:
赶工:
优：通过增加资源，以最小的成本增加来压缩进度工期的一种技术。

缺：可能导致风险和/或成本的增加。



快速跟进：

优：一种进度压缩技术，将正常情况下按顺序进行的活动或阶段改为至少是部分并行开展。

缺：快速跟进可能造成返工和风险增加。

11、资源平衡和资源平滑的区别，关键链法的作用

●资源平衡：

是一种进度网络分析技术，用于已经利用关键路线法分析过的进度模型之中。资源平衡的用途是调整时间安排需要满足规定交工日期的计划活动，处理只有在某些时间才能动用或只能动用有限数量的必要的共用或关键资源的局面，或者用于在项目工作具体时间段按照某种水平均匀地使用选定资源。这种均匀使用资源的办法可能会改变原来的关键路线。

●资源平滑：

对进度模型中的活动进行调整，从而使项目资源需求不超过预定的资源限制的一种技术。相对于资源平衡而言，资源平滑不会改变项目关键路径，完工日期也不会延迟。资源平滑技术可能无法实现所有资源的优化。

●关键链法的作用：

是一种进度规划方法，允许项目团队在任何项目进度路径上设置缓冲，以应对资源限制和项目的不确定性。这种方法建立在关键路径法之上，考虑了资源分配、资源优化、资源平衡和活动历时不确定性对关键路径的影响。

关键链法增加了作为“非工作活动”的持续时间缓冲，用来应对不确定性。关键链末端的缓冲称为项目缓冲，用来保证项目不因关键链的延误而延误。

12、四个依赖关系

(1)强制性依赖关系：是法律或合同要求的或工作的内在性质决定的依赖关系

(2)选择性依赖关系：有时又称首选逻辑关系、优先逻辑关系或软逻辑关系。

(3)外部依赖关系：是项目活动与非项目活动之间的依赖关系。这些依赖关系往往不在项目团队的控制范围内。例如，软件项目的测试活动取决于外部硬件的到货等。

(4)内部依赖关系：是项目活动之间的紧前关系，通常在项目团队的控制之中。

13、成本估算步骤

(1)识别并分析成本的构成科目。

(2)根据已识别的项目成本构成科目，估算每一科目的成本大小。

(3)分析成本估算结果，找出各种可以相互替代的成本，协调各种成本之间的比例关系。

14、成本类别，风险的类别，风险登记册的内容

●成本类别

(1)可变成本：随着生产量、工作量或时间而变的成本为可变成本。可变成本又称变动成本。

(2)固定成本：不随生产量、工作量或时间的变化而变化的非重复成本为固定成本。

(3)直接成本：直接可以归属于项目工作的成本为直接成本。如项目团队差旅费、工资、项目使用的物料及设备使用费等。

(4)间接成本：来自一般管理费用科目或几个项目共同担负的项目成本所分摊给本项目的费用，就形成了项目的间接成本，如税金、额外福利和保卫费用等。

(5)机会成本：是利用一定的时间或资源生产一种商品时，而失去的利用这些资源生产其他最佳替代品的机会就是机会成本，泛指一切在做出选择后其中一个最大的损失。

(6)沉没成本：是指由于过去的决策已经发生了的，而不能由现在或将来的任何决策改变的成本。沉没成本是一种历史成本，对现有决策而言是不可控成本，会很大程度上影响人们的行为方式与决

策，在投资决策时应排除沉没成本的干扰。



●风险的类别

(1)按照性质划分

(1)纯粹风险：是指只有损失可能性而无获利可能性的风险。

(2)投机风险：是相对于纯粹风险而言的，是指既有损失的可能又有获利机会的风险。

(2)按照产生原因划分

(1)自然风险(2)社会风险(3)政治风险(4)经济风险(5)技术风险

●风险登记册的内容

1.识别风险的输出

(1)风险登记册

(2)已识别的风险清单

(3)潜在应对措施清单

2.定性风险的输出

(1)对每个风险的概率和影响评估;

(2)风险评级和分值:

(3)风险紧迫性或风险分类

(4)定性风险的输出

(5)低概率风险的观察清单;或需要进一步分析的风险

3.定量风险的输出

(1)项目文件(风险登记册)更新

(2)项目的概率分析

(3)实现成本和时间目标的概率

(4)量分风险优先级的清单

(5)定量风险的输出

(6)定量风险分析结果的趋势

15、成本预算步骤在得到项目总预算的前提下

(1)将项目总成本分摊到项目工作分解结构的各个工作包。

(2)将各个工作包成本再分配到该工作包所包含的各项活动上。

(3)确定各项成本预算支出的时间计划及项目成本预算计划。

16、质量工具、新七、老七等

新七：关联图、活动网络图、过程决策程序图、亲和图、优先矩阵、矩阵图、树形图

【口诀：联网过河先锯树】

老七：因果图、流程图、核查表、帕累托图（即排列图）、直方图、控制图、散点图

【口诀：因流核帕直控散】

17、质量审计的目标是

（1）识别全部正在实施的良好及最佳实践；

（2）识别全部违规做法、差距及不足；

（3）分享所在组织或行业中类似项目的良好实践；


（4）积极、主动地提供协助，以改进过程的执行，从而帮助团队提高生产效率；

（5）强调每次审计都应对组织经验教训的积累做出贡献。

18、质量成本的内容

质量成本指在产品生命周期中发生的所有成本，包括为预防不符合要求、为评价产品或服务是否符

合要求，以及因未达到要求而发生的所有成本。**质量成本类型**如图所示：

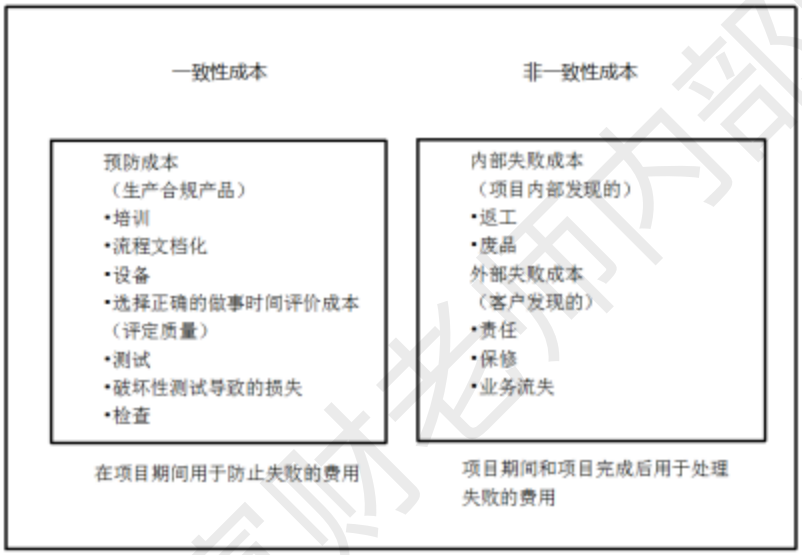

19、瀑布，迭代模型的特点（理解就行）

●瀑布模型的特点：

(1)从上一项开发活动接受其成果作为本次活动的输入。

(2)利用这一输入，实施本次活动应完成的工作内容。

(3)给出本次活动的工作成果，作为输出传给下一项开发活动。

(4)对本次活动的实施工作成果进行评审。若其工作成果得到确认，则继续进行下一项开发活动；否则返回前一项，甚至更前项的活动。尽量减少多个阶段间的反复。以相对来说较小的费用来开发软件。

●迭代模型的特点：

每一次迭代都是一个完整的瀑布模型，反复进行需要经过多期开发完成。用于需求变化多，可以降低项目复杂性，或产品部分交付有利于干系人，且不会影响最终可交付成果交付的项目，可用于大型复杂的项目。

20、范围确认跟质量控制的区别


范围确认是关注可交付成果的验收

质量控制是关注可交付成果的正确性及是否满足质量要求。先质量控制然后范围确认，二者也可以同时进行。

21、管理储备、应急储备

应急储备（有时称为时间储备或缓冲时间），应纳入项目进度计划中，用来应对进度方面的不确定性。应急储备是包含在进度基准中的一段持续时间，用来应对已经接受的已识别风险，以及已经制定应急或减轻措施的已识别风险。应急储备与“已知—未知”风险相关，项目经理使用应急储备时，不需要走变更流程。

管理储备是为管理控制的目的而特别留出的项目时段，用来应对项目范围中不可预见的工作。管理储备用来应对会影响项目的“未知-未知”风险。管理储备不包括在进度基准中，但属于项目总持续时间的一部分。使用管理储备可能需要变更进度基准。



22、人力资源五个阶段（团队建设5阶段）

(1)形成阶段：一个个独立的个体成员转变为团队成员，开始形成共同目标，对未来团队往往有美好的期待。

(2)震荡阶段：团队成员开始执行分配的任务，一般会遇到超出预想的困难，希望被现实打破。个体之间开始争执，互相指责，并且开始怀疑项目经理的能力。

(3)规范阶段：经过一定时间的磨合，团队成员之间相互熟悉和了解，矛盾基本解决，项目经理能够得到团队的认可。

(4)发挥阶段：随着相互之间的配合默契和对项目经理的信任，成员积极工作，努力实现目标。

(5)结束阶段：随着项目的结束，团队也被遣散了。

新增一个人或者减少一个人，团队建设又会回到形成阶段。

23、冲突的解决办法，马斯洛，X,Y

●冲突的解决办法：

(1)问题解决。

问题解决就是冲突各方一起积极地定义问题、收集问题的信息、制定解决方案，最后直到选择一个最合适的方案来解决冲突，此时为双赢或多赢。但在这个过程中，需要公开地协商，这是冲突管理中最理想的一种方法。

(2)合作。集合多方的观点和意见，得出一个多数人接受和承诺的冲突解决方案。

(3)强制。

强制就是以牺牲其他各方的观点为代价，强制采纳一方的观点。一般只适用于赢-输这样的零-和游戏情景里。

(4)妥协。

妥协就是冲突的各方协商并且寻找一种能够使冲突各方都有一定程度满意、但冲突各方没有任何一方完全满意、是一种都做一些让步的冲突解决方法。

(5)求同存异。

求同存异的方法就是冲突各方都关注他们一致的一面，而淡化不一致的一面。一般求同存异要求保持一种友好的气氛，但是回避了解决冲突的根源。也就是让大家都冷静下来，先把工作做完。

(6)撤退。撤退就是把眼前的或潜在的冲突搁置起来，从冲突中撤退。

●马斯洛

(1)生理需要：对衣食住行等需要都是生理需要，这类需要的级别最低，人们在转向较高层次的需要之前，总是尽力满足这类需要。

(2)安全需要：安全需要包括对人身安全、生活稳定、不致失业以及免遭痛苦、威胁或疾病等的需要。和生理需要一样，在安全需要没有得到满足之前，人们一般不追求更高层的需要。

(3)社会交往的需要：社会交往(社交)需要包括对友谊、爱情以及隶属关系的需要。当生理需要和安全需要得到满足后，社交需要就会突出出来，进而产生激励作用。这些需要如果得不到满足，就会影响员工的精神，导致高缺勤率、低生产率、对工作不满及情绪低落。

(4)自尊的需要：指自尊心和荣誉感。

(5)自我实现的需要：指想获得更大的空间以实现自我发展的需要。

●X,Y理论：

X理论

主要体现了独裁型管理者对人性的基本判断，这种假设认为：

(1)一般人天性好逸恶劳，只要有可能就会逃避工作。


(2)人生来就以自我为中心，漠视组织的要求。

(3)人缺乏进取心，逃避责任，甘愿听从指挥，安于现状，没有创造性。

(4)人们通常容易受骗，易受人煽动。

(5)人们天生反对改革。

崇尚 X 理论的领导者认为，在领导工作中必须对员工采取强制、惩罚和解雇等手段，强迫员工努力工作，对员工应当严格监督、控制和管理。在领导行为上应当实行高度控制和集中管理，在领导风格上采用独裁式的领导方式。



Y 理论

Y 理论对人性的假设与 X 理论完全相反，其主要观点为：

(1)一般人天生并不是好逸恶劳，他们热爱工作，从工作得到满足感和成就感。

(2)外来的控制和处罚对人们实现组织的目标不是一个有效的办法，下属能够自我确定目标，自我指挥和自我控制。

(3)在适当的条件下，人们愿意主动承担责任。

(4)大多数人具有一定的想象力和创造力。

(5)在现代社会中，人们的智慧和潜能只是部分地得到了发挥。

基于 Y 理论对人的认识，信奉 Y 理论的管理者对员工采取民主型和放任自由型的领导方式，在领导行为上遵循以人为中心的、宽容的及放权的领导原则，使下属目标和组织目标很好地结合起来，为员工的智慧和能力的发挥创造有利的条件。

24、优秀的团队特点

(1)团队的目标明确，成员清楚自己的工作对目标的贡献。

(2)团队的组织结构清晰，岗位明确。

(3)有成文或习惯的工作流程和方法，而且流程简明有效。

(4)项目经理对团队成员有明确的考核和评价标准，工作结果公正公开、赏罚分明。

(5)共同制订并遵守的组织纪律。

(6)协同工作，也就是一个成员工作需要依赖于另一个成员的结果，善于总结和学习。

25、虚拟团队优缺点，项目经理五个权力

优点：

①在公司内部建立一个由不同地区员工组成的团队。

②为项目团队增加特殊技能的专家，即使这个专家不在本地。

③把在家办公的员工纳入虚拟团队，以协同工作。

④由不同班组(早班、中班和夜班)员工组成一个虚拟团队。

⑤把行动不便或残疾的员工纳入团队。

⑥可以实施那些原本因为差旅费用过高而被忽略的项目。

缺点：能产生误解、有孤立感、团队成员之间难以分享知识和经验、采用通信技术也要花费成本等。

26、沟通的方法（3 个）沟通的方式（4 个）

●沟通的方法（3 个）：

①交互式沟通。

在两方或多方之间进行多向信息交换。包括会议、电话、即时通信、视频会议等。


②推式沟通。把信息发送给需要接收这些信息的特定接收方。这种方法可以确保信息的发送，但不能确保信息送达受众或被目标受众理解。推式沟通包括信仲、备忘录、报告、电子邮件、传真、语音邮件、日志、新闻稿等。

③拉式沟通。用于信息量很大或受众很多的情况。要求接收者自主、自行地访问信息内容。这种方法包括企业内网、电子在线课程、经验教训数据库、知识库等。

●沟通的方式（4 个）：参与讨论方式、征询方式、推销方式（说明）、叙述方式（穿针说细）

27、权利利益方格，干系人参与评估矩阵

●权利利益方格：

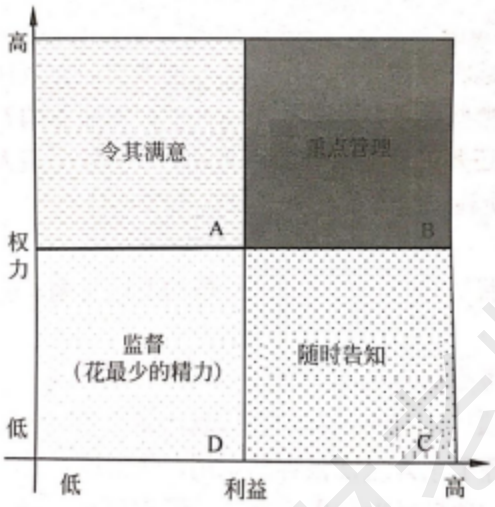

P125 这个图必须能画出来

A区令其满意

例如：不是直接管理的部门领导、政府、部门内领导

B区重点管理

例如：项目的客户，项目经理的主管领导、甲乙项目团队成员，直接管理的政府部门

C区随时告知

例如：粉丝、用户、供应商

D区监督

例如：不同行业的企业、竞争者

●干系人参与评估矩阵

“干系人参与评估矩阵”记录干系人的当前参与程度，如图所示。其中，C 表示干系人当前参与程度，D 表示所需干系人参与程度。

干系人	不知晓	抵制	中立	支持	领导
干系人 1	C			D	
干系人 2			C	D	
干系人 3				DC	

28、风险的各工具和技术，风险应对策略

●识别风险的工具与技术

（1）文档审查
（2）信息收集技术（头脑风暴、德尔菲技术、访谈、根本原因分析）
（3）核对单分析
（4）假设分析
（5）图解技术：因果图、系统或过程流程图、影响图
（6）**SWOT 分析**

●规划风险应对的工具与技术

（1）消极风险或威胁的应对策略：**规避、转移、减轻、接受**
（2）积极风险或机会的应对策略：**开拓、提高、分享、接受**
（3）应对应急策略


●控制风险的工具与技术

（1）风险再评估
（2）风险审计
（3）偏差和趋势分析
（4）技术绩效测量
（5）储备分析

29、变更请求的四种措施

纠正措施、适应性措施、预防性措施、完善性措施（更新）

30、配置管理的 6 个活动，配置库，配置审计的内容



●**配置管理的 6 个活动：**制定配置管理计划、配置标识、配置控制、配置状态报告、配置审计、发布管理和交付

●**配置库：**可以分为**开发库、受控库、产品库** 3 种类型。

（1）开发库：也称为动态库、程序员库或工作库，用于保存开发人员当前正在开发的配置实体。动态中的配置项被置于版本管理之下。动态库是开发人员的个人工作区，由开发人员自行控制。库中的信息可能有较为频繁的修改，只要开发库的使用者认为有必要，无需对其进行配置控制，因为这通常不会影响到项目的其他部分。

（2）受控库：也称为主库，包含当前的基线加上对基线的变更。受控库中的配置项被置于完全的配置管理之下。在信息系统开发的某个阶段工作结束时，将当前的工作产品存入受控库。

（3）产品库：也称为静态库、发行库、软件仓库，包含已发布使用的各种基线的存档，被置于完全的配置管理之下。在开发的信息系统产品完成系统测试之后，作为最终产品存入产品库内，等待交付用户或现场安装。

●**配置审计的内容**

配置审计：也称配置审核或配置评价，包括功能配置审计和物理配置审计，分别用以验证当前配置项的一致性和完整性。

1.功能配置审计：是审计配置项的一致性(配置项的实际功效是否与其需求一致)，具体验证以下几个方面：

(1)配置项的开发已圆满完成。

(2)配置项已达到配置标识中规定的性能和功能特征。

(3)配置项的操作和支持文档已完成并且是符合要求的。

2.物理配置审计：是审计配置项的完整性(配置项的物理存在是否与预期一致)，具体验证如下几个方面：

(1)要交付的配置项是否存在。

(2)配置项中是否包含了所有必需的项目。

31、变更管理的角色和职责, CCB 作用

●**变更管理的角色和职责**

（1）变更申请人:提出变更申请的相关人员。

（2）项目经理:对变更管理负责。负责变更申请的影响分析、召开变更控制委员会会议、监控变更及已批准变更的正确实施等。

（3）变更控制委员会:是变更管理的决策机构。

（4）变更实施人:实施已批准的变更的相关人员。

●**CCB 作用**

（1）批准配置项的标识，以及信息系统的基线建立

（2）制定访问控制策略

（3）建立更改基线的设置，审核变更申请

（4）根据配置管理员的报告决定相应的对策

32、SOW, 合同，沟通管理计划，干系人管理计划的大概内容

●**SOW:**

（1）业务需要。（2）产品范围描述。

（3）战略计划。（4）质量要求，变更管理（5）甲乙双方，送货时间

●**合同的内容：**

（1）当事人各自权利、义务

（2）项目费用及及工程款的支付方式

（3）项目变更的约定
（4）违约责任，验收标准，质量要求，签约时间，合同截止日期
（5）甲乙双方姓名，联系方式，联系地址
（6）支付方式等

●干系人管理计划

(1)关键干系人的所需参与程度和当前参与程度；干系人变更的范围和影响；
(2)干系人之间的相互关系和潜在交叉；
(3)项目现阶段的干系人沟通需求；
(4)需要分发给干系人的信息，包括语言、格式、内容、详细程度和发送频率；
(5)分发相关信息的理由，以及可能对干系人参与所产生的影响；
(6)随着项目的进展，更新和优化干系人管理计划的方法。

●沟通管理计划

(1)干系人的沟通需求。
(2)针对沟通信息的描述，包括格式、内容、详尽程度等。
(3)发布信息的原因。
(4)负责信息沟通工作的具体人员。
(5)负责信息保密工作的具体人员的授权。
(6)信息接收的个人或组织。
(7)沟通渠道的选择。
(8)信息传递过程中所需的技术或方法。
(9)进行有效沟通所必须分配的各种资源，包括时间和预算。
(10)沟通频率，例如，每周沟通等。

33、分包的特点，合同的类型及特点

●分包的特点

签订分包合同应当同时具备两个条件：第一，承包人只能将自己承包的非关键、非主体部分工程分包给具有相应资质条件的分包人，而且不可以进行二次分包；第二，分包工程必须经过发包人同意。

●合同的类型

(1)按信息系统范围划分的合同分类
1.总承包合同
2.单项工程承包合同
3.分包合同
(2)按项目付款方式划分的合同分类
1.总价合同**用于需求明确风险在乙方**
2.成本补偿合同**用于需求很不明确风险在甲方，开口合同**
3.工料合同**用于增加人员，需求不很明确风险平摊开口合同**

34、招投标流程，立项流程

●邀请招标流程如下：

（一）发布投标邀请；（二）发放招标文件；
（三）资格预审；（四）投标预备会；
（五）开标；（六）评标（资格后审）；
（七）中标；（八）合同谈判与签订

●立项流程

甲立项流程：需求调研--编写项目申请书--可行性研究--项目论证--项目评估--评审获取批准--发布招标文件

●**乙方立项流程：**看到招标文件--进行项目识别--可行性研究--项目论证--项目评估--参加投标--中标--签订合同



35、采购单一来源、竞争性谈判，询价，邀请招标流程

●**采购单一来源**

（1）只能从唯一供应商处采购的；

（2）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；

（3）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。

●**询价**

（1）成立询价小组。询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

（2）确定被询价的供应商名单。询价小组根据采购需求，从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价。

（3）询价。询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。

（4）确定成交供应商。采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。

●**竞争性谈判**

（1）成立谈判小组。谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

（2）制定谈判文件。

（3）确定邀请参加谈判的供应商名单。谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判，并向其提供谈判文件。

（4）谈判。谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

（5）确定成交供应商。谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

●**邀请招标流程：**

邀请招标流程如下：

（一）发布投标邀请；（二）发放招标文件；

（三）资格预审；（四）投标预备会；

（五）开标；（六）评标（资格后审）；

（七）中标；（八）合同谈判与签订

36、识别干系人的 3 步骤

(1)识别全部潜在项目干系人及其相关信息。

(2)识别每个干系人可能产生的影响或提供的支持，并把他们分类，以便制定管理策略。

(3)评估关键干系人对不同情况可能做出的反应或应对，以便策划如何对他们施加影响，提高他们的支持和减轻他们的潜在负面影响。

37、合同变更的原则和方法，索赔流程

● **合同变更的原则和方法：**

“公平合理”是合同变更的处理原则，变更合同价款按下列方法进行。

（1）首先确定合同变更量清单，然后确定变更价款。



（2）合同中已有适用于项目变更的价格，按合同已有的价格变更合同价款。
（3）合同中只有类似于项目变更的价格，可以参照类似价格变更合同价款。
（4）合同中没有适用或类似项目变更的价格，由承包人提出适当的变更价格，经监理工程师和业主确认后执行。

- **索赔流程：**

（1）提出索赔要求

在知道或应当知道索赔事项发生后 28 天内，索赔方应以书面的索赔通知书形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知。

（2）报送索赔资料

在索赔通知书发出后的 28 天内，索赔方应向监理工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的详细索赔报告及有关资料。索赔报告的内容主要有总论部分、根据部分、计算部分和证据部分。

（3）监理工程师答复

监理工程师在收到索赔方送交的索赔报告及有关资料后，应于 28 天内给予答复，或要求索赔方进一步补充索赔理由和证据。

监理工程师逾期答复后果：监理工程师在收到承包人送交的索赔报告及有关资料后，28 天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经得到认可。

（4）索赔认可

如果索赔方或发包人均接受监理工程师对索赔的答复，即索赔获得认可。

38、常见的采购文件

常见的采购文件有方案邀请书（RFP）、报价邀请书（RFQ）、征求供应商意见书（RFI）、投标邀请书（IFB）、招标通知、洽谈邀请以及承包商初始建议征求书。

39、控制工作的内容和输出的五大件

控制工作的内容：

1.监控状态
2.对变更的因素施加影响
3.判断变更是否发生
4.发生了要走变更控制的流程
5.提出必要的措施

控制输出的五大件：

①项目管理计划更新②变更请求③工作绩效信息
④项目文件更新⑤组织过程资产更新

40、供应商立项的内容和原因

- **供应商立项的内容**

系统集成供应商在进行项目内部立项时一般包括的内容有项目资源估算、项目资源分配、准备项目任务书和任命项目经理等。

- **供应商立项的原因**

系统集成商进行项目内部立项主要有几方面原因。

第一，通过项目立项方式为项目分配资源。

第二，通过项目立项方式确定合理的项目绩效目标，有助于提升人员的积极性，以真实客观所需的资源成本作为考核项目的重要指标，从而调动人员的积极性。通过项目型的组织方式提升项目的实施效率。

第三，以项目型工作方式，提升项目实施效率。

41、十大管理每个管理下的过程

看“螃蟹图”

看到**文件缺少什么，想到记叙文，时间，地点，人物，事件!!!

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料
