

系统集成项目管理工程师

辅导班课程　主讲老师：黄老师

学习是上坡路，只要坚持，一定能登顶

放弃学习是下坡路，虽然容易，但很危险

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

22年下半年系统集成项目管理工程师下午真题（广东卷）

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

22年11月广东卷

试题二

下表是一个软件项目在编码阶段各活动的计划和实际完成情况
(工作量，单位：人天， 假设工作量成本：1万元/人天)。

活动		A	B	C	D	E	F	G	H
计划工作量	第1周	30							
	第2周		30	40					
	第3周				70	40			
	第4周						80		
	第5周							40	70
实际工作量	第1周	40		—		—			
	第2周		30	—	—				
	第3周			50	60	30			
	第4周		—					30	
	第5周	—	—				100		80

22年11月广东卷

【问题1】(9分)

为了实施项目的过程跟踪，项目经理制定了如下过程跟踪表，请补齐表中的数据(PV/EV/AC值保留整数，SPI/CPI保留2位小数，单位：万元)

完成时间	第1周	第2周	第3周	第4周	第5周
PV	30	100	210	290	400
EV	30	60	210	250	400
AC	40	70	210	240	420
SPI	1	0.6	1	0.86	1
CPI	0.75	0.86	1	1.04	0.95

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

22年11月广东卷

【问题2】(4分)

请说明第4周时项目的绩效情况，并说明理由。

PV=30+30+40+70+40+80=290万元

AC=40+30+50+60+30=240万元

EV=AC*CPI=240*1.04=250万元

SPI=EV/PV=250/290=0.86　进度落后

CPI=1.04　　成本节约

本项目第4周时，进度落后，成本节约

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

【问题3】(3分)

第4周时，项目经理准备采取如下措施，请指出各措施可能会带来的负面风险。

（1）快速跟进 （2）减小活动范围或降低活动要求 （3）改进方法或技术

（1）快速跟进可能造成返工和风险增加。

（2）减小活动范围或降低活动要求可能导致干系人不满

（3）改进方法或技术容易增加风险

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

22年11月广东卷

【问题4】(5分)

第4周时项目经理认为，照此情况，项目的这种偏差情况还会延续到项目的收尾阶段，项目总成本会发生变化，请计算项目总成本会超出预算多少？(结果保留整数)

又因为BAC=30+30+40+70+40+80+40+70=400万元

典型偏差EAC=BAC/CPI=400/1.04=384.6万元

VAC=BAC-EAC=400-384.6=15万元

表示项目结束时候不会超出预算，成本会节约15万元。

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

22年下半年系统集成项目管理工程师下午真题（全国卷）


广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

22年11月全国卷

试题二（22分）

阅读下列说明，回答问题1至问题3，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】某项目的网络资源计划如图所示，已知每位工程师的日均成本为400元/天。

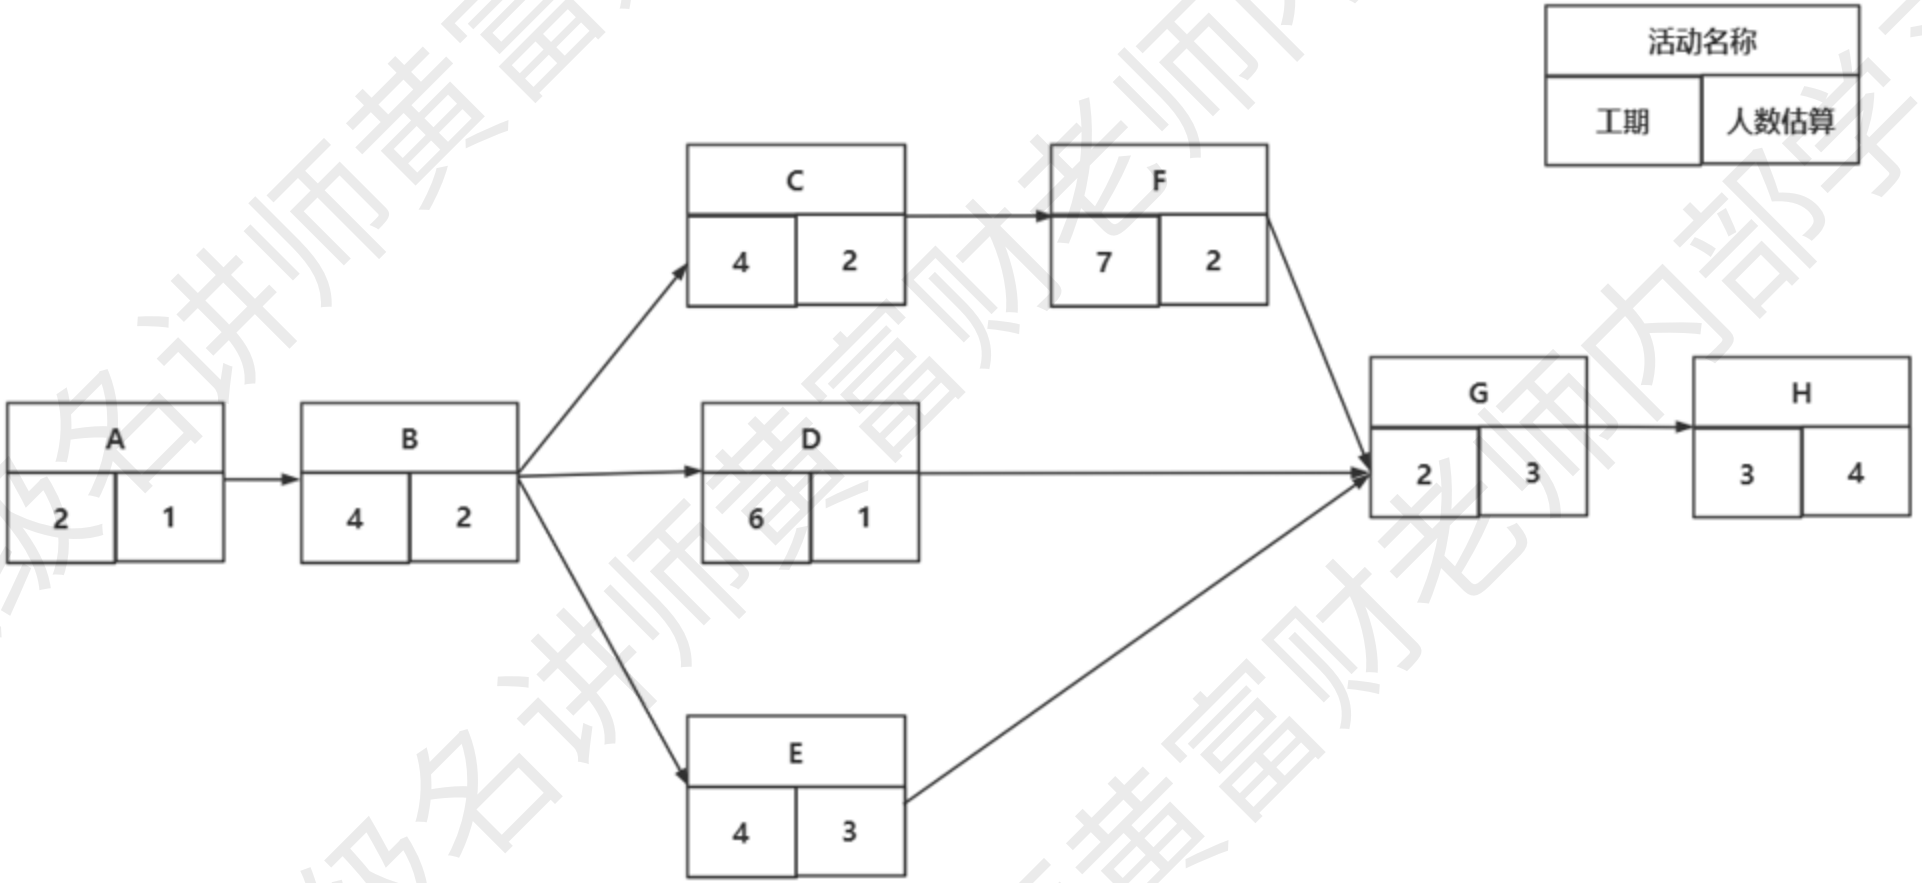

22年11月全国卷

【问题1】（5分）

请计算项目的工期及关键路径，并说明活动E最晚应在哪天开始，依据是什么？

项目的工期为22天，关键路径为A-B-C-F-G-H，活动E最晚开始时间为第13天（假设　项目开始时间为“0”），依据是根据关键路径法反推出活动E的LS为13天结束。

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

22年11月全国卷


【问题2】（8分）
第9日工作结束时，项目组已完成ABC三项工作，D工作完成了三分之一，E工作完成了二分之一，其余工作尚未开展，此时人力资源管理部门统计总人力成本为9800元。
（1）请给出项目此时的挣值：
（2）计算此时项目的SV和CV，并评价项目当前的进度绩效和成本绩效。

（1）挣值
EV=A+B+C+1/3D+1/2E=2*1*400+4*2*400+4*2*400+2*1*400+2*3*400=10400元
（2）第9日工作结束时，
PV= A+B+3/4C+1/2D+3/4E
=800+3200+2400+1200+3600
=11200元；
AC=9800元；
SV=EV-PV=10400-11200=-800元；
CV=EV-AC=10400-9800=600元；
目前项目绩效情况为进度滞后、成本节约。

22年11月全国卷

【问题3】（9分）

假设每位工程师均可胜任各项工作，在不影响工期的前提下，可重新安排有关活动的顺序以减少项目所需人数。此种情况下，请按照项目的网络资源计划，画出项目的时标网络计划图，并判断该项目最少需要多少人？

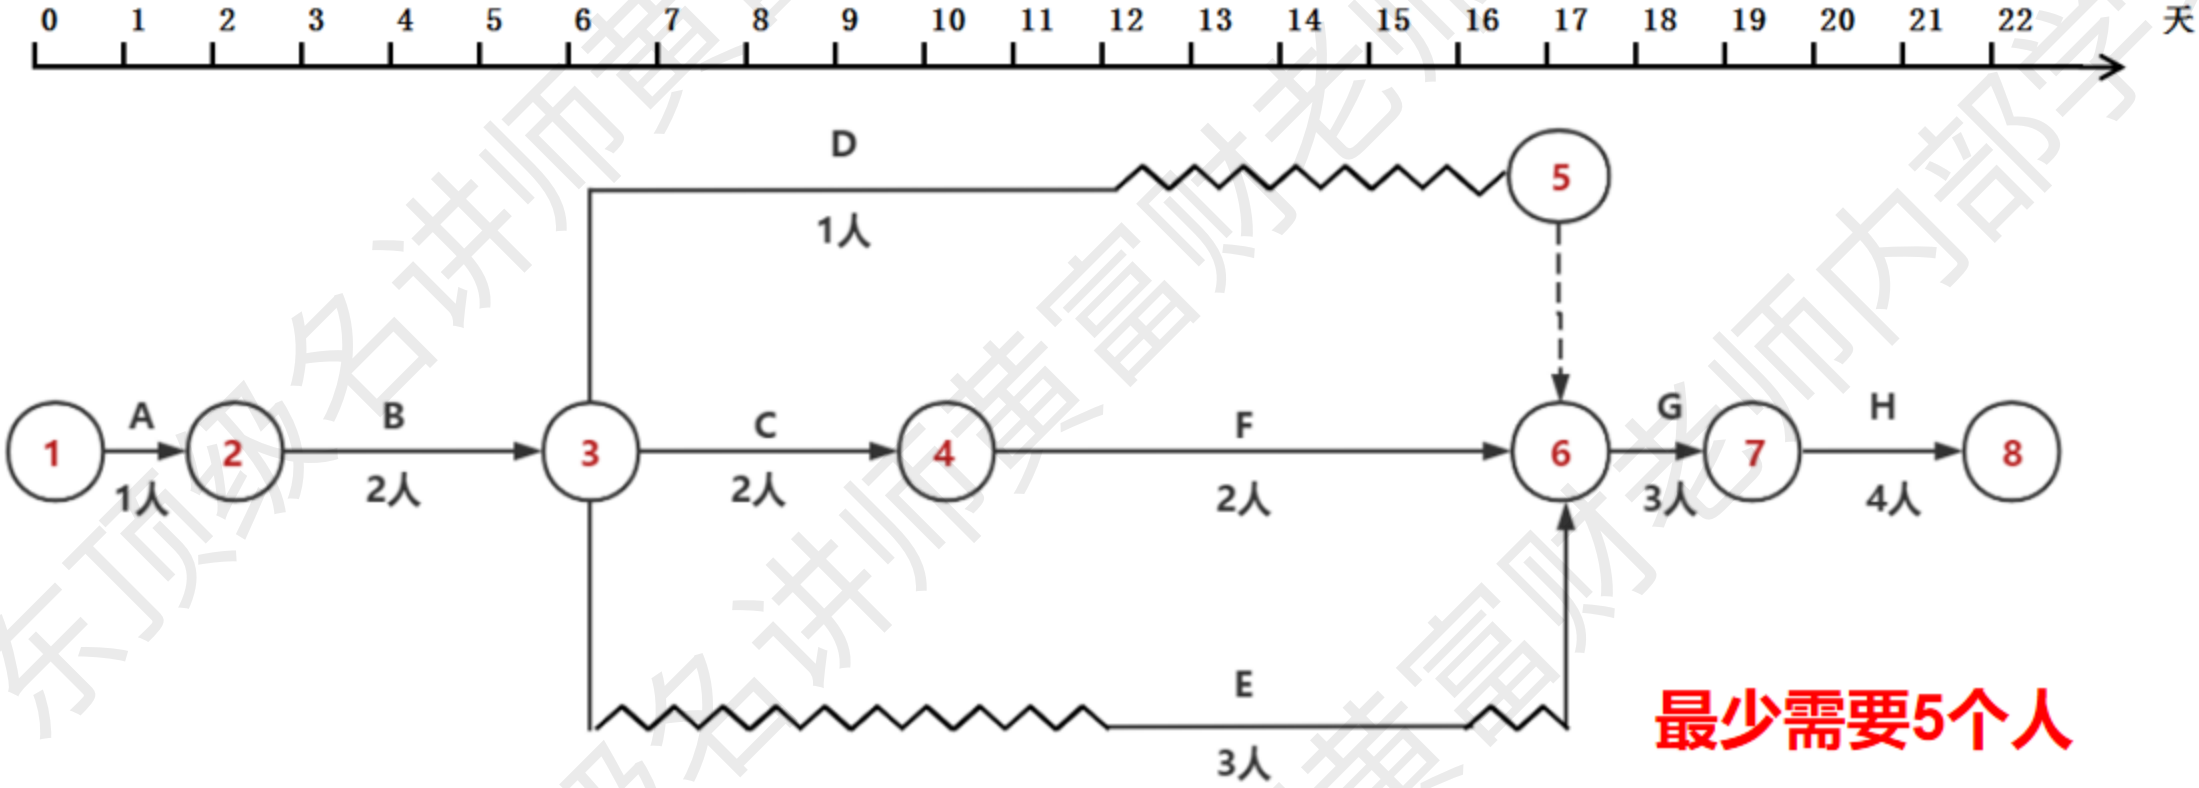

最少需要5个人

感谢您的聆听！

只要努力，一切皆有可能！

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料
