
1. 按照考试趋势分析，今年的计算量应该会比较大，但是计算还是会比较简单，也只是加减乘除不过万。



1）先画单代号，再画六标时，画六标时一定要快，不要犹犹豫豫的
2） 按进度平均分配到活动：也就是每个工作每天的成本是一样的，
这样就可以用总成本 除以 所有工作累加的总天数，得到一个工作一天要花多少钱，再通过每天的费用，和一个工作的工作天数据，可以计算出一个工作的计划值.
(一般说总成本是已经包含了人力成本,就不要再累加人力成本 ,不要看表格里面的人力成本费用)
3） 根据六时标图，就可以计算出总的 PV
4） 如果题目没有说完成的工作是占计划的多少，默认的就是用 BAC 来计算 EV
比如，项目总成本 50，目前已经完成 3/5 ，那 EV=50 乘以 3/5
成本绩效是 CV 进度绩效是 SV
成本绩效指数是 CPI 进度绩效指数是 SPI
如果题目求绩效，那么用 CV,SV，CPI，SPI 都可以，一般首选 CV,SV

假设 A，B，同时工作，如果 A 工作 10 天，B 工作 8 天，要注意，如果 A 压 4 天是会影响到 B 工作的，所以 A 只能压 2 天。
不需要用甘特图来压缩工期!
压缩工期：一定要在关键路径上，压缩工期和选费用最便宜的活动。非关键路径的不要看，也不要去计算。(一般中级的压缩，关键不变的，大家一定一定不要去考虑关键路径变的问题)

2. 立项一定要有建议书，可行性，评估，需求文件一定要有主要干系人评审，项目经理一定要有经验，一定要结合本项目来做需求分析，费用不能根据乙方提交的报价来做预算，要用独立评估，只到什么才发现，是监控不力。
3. 需求文件的内容： 业务需求；干系人需求；解决方案需求；解决方案需求；项目需求；
过渡需求；与需求相关的假设条件、制约因素。

4. 风险控制的定义和作用 要去背一下

5. 影响干系人风险态度的因素：(1) 风险偏好。(2) 风险承受力。(3) 风险临界值。

6. 风险有 成本风险 ，干系不同意风险，接口不一致 风险 ，
进度风险，文件分开放，查看时不一致风险，质量风险
社会风险，经济风险，政策风险等

7 配置管理的 6 个过程，配置分库，配置三种状态，版本有可能会相互覆盖
配置权限的内容要去看一下，产品库是 CMO 用的，发布只能由 CMO 去做，无论情况多急，变更流程一定要走。一定要定期的去生成配置状态报告


立项招标的流程，所有文件夹都要评审，不能一个人做，
要注意监控不力
要计划一定要做，而且不能一个人做，
不能按经验来做事，一定要根据项目实际情况
新人一定要培训

各角色在配置管理活动中的权限

工作 负责人	编制配置管理计划	创建配置管理环境	审核变更计划	变更申请	变更实施	变更发布
CCB			√			
CMO	√	√		√		√
项目经理				√		
开发人员				√	√	

开发库中的信息可能被频繁修改，因此可以由开发人员自行控制 对不对?

如果问题是客户发现的 1，2，3，4
如果问题是测试人员发现的 2，3，4

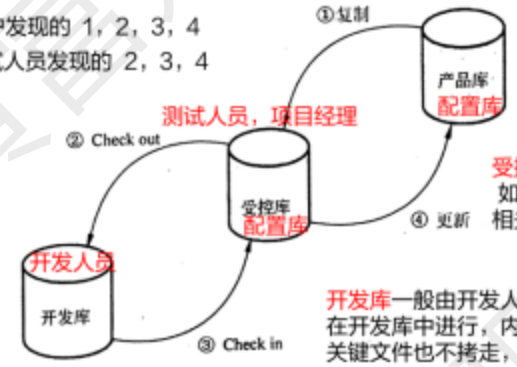

受控库用于管理当前基线和控制基线的变更
如：需求规格说明书、概要设计、详细设计等
相关文档的变更，产品集成测试阶段文件


开发库一般由开发人员使用，软件开发人员对源文件的修改
在开发库中进行，内容一般不放入配置库（修改的太频繁了，
关键文件也不拷走，只在一台机器上修改，没必要配置）

图 15-3 基于配置库的变更控制

第5章 项目可行性研究阶段

P43

甲方立项流程

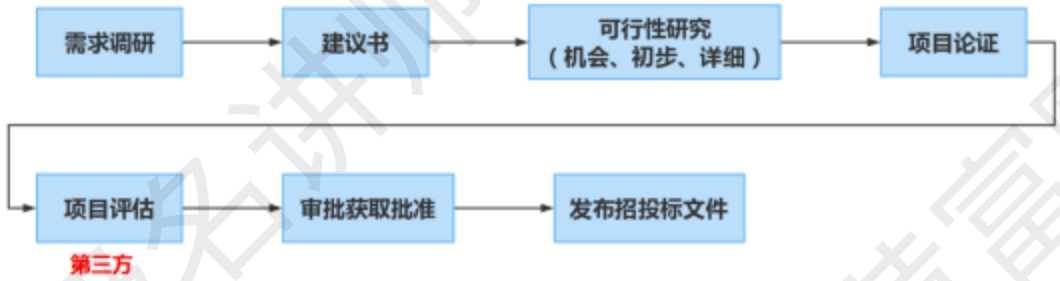

第三方
