2023年11月软考课程



系统集成项目管理工程师


辅导班课程　主讲老师：黄富财老师

每天前进一小步，会让你的人生上升不止一大步


广东顶级名讲师黄富财老师内部学习

第7章 项目范围管理

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习

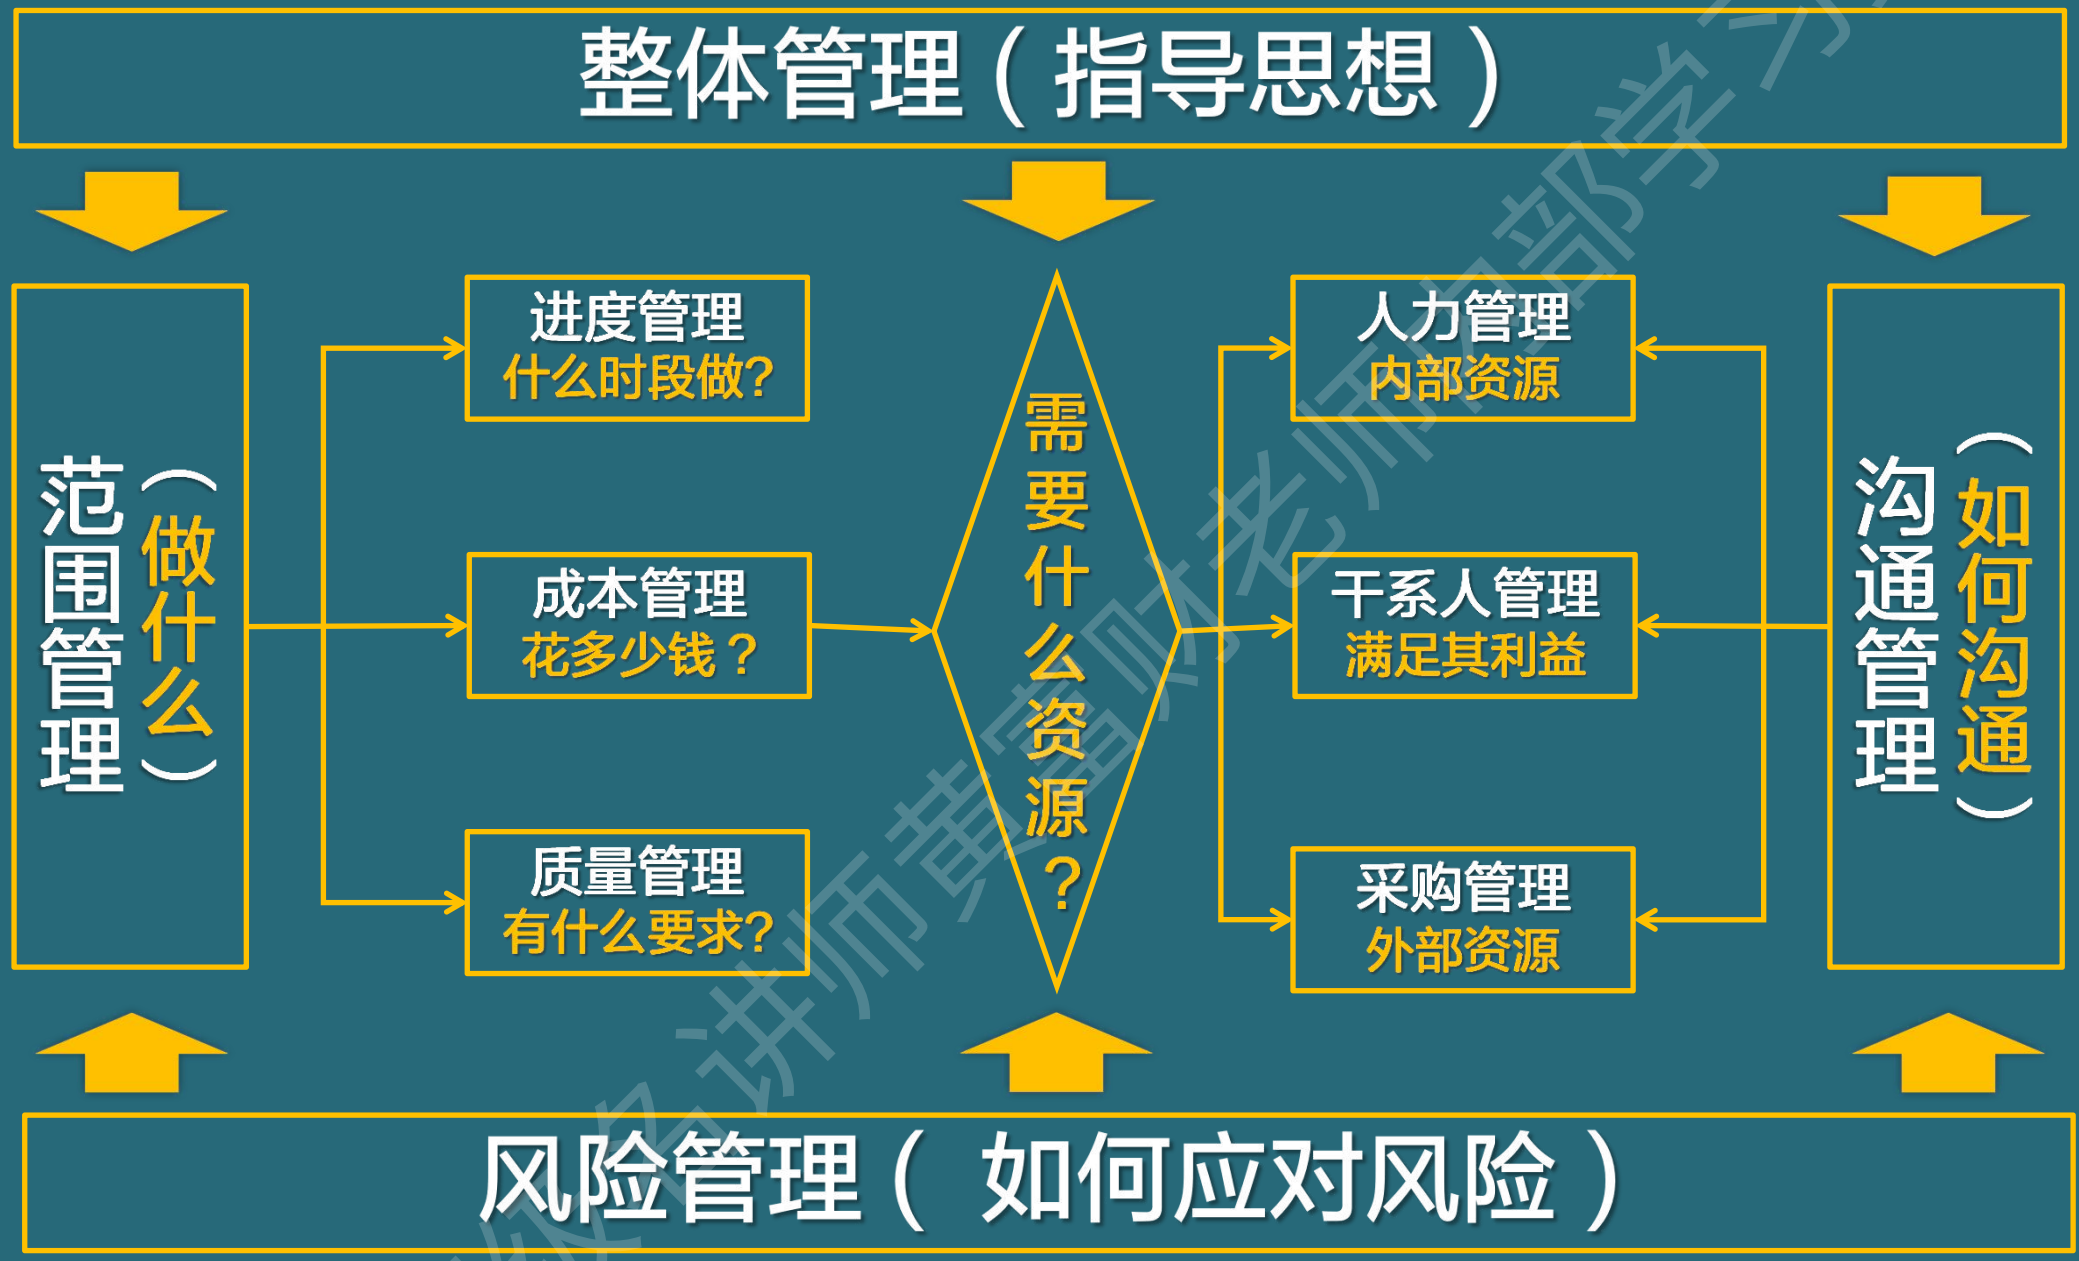

广东顶级中高级讲师黄富财老师内部学习

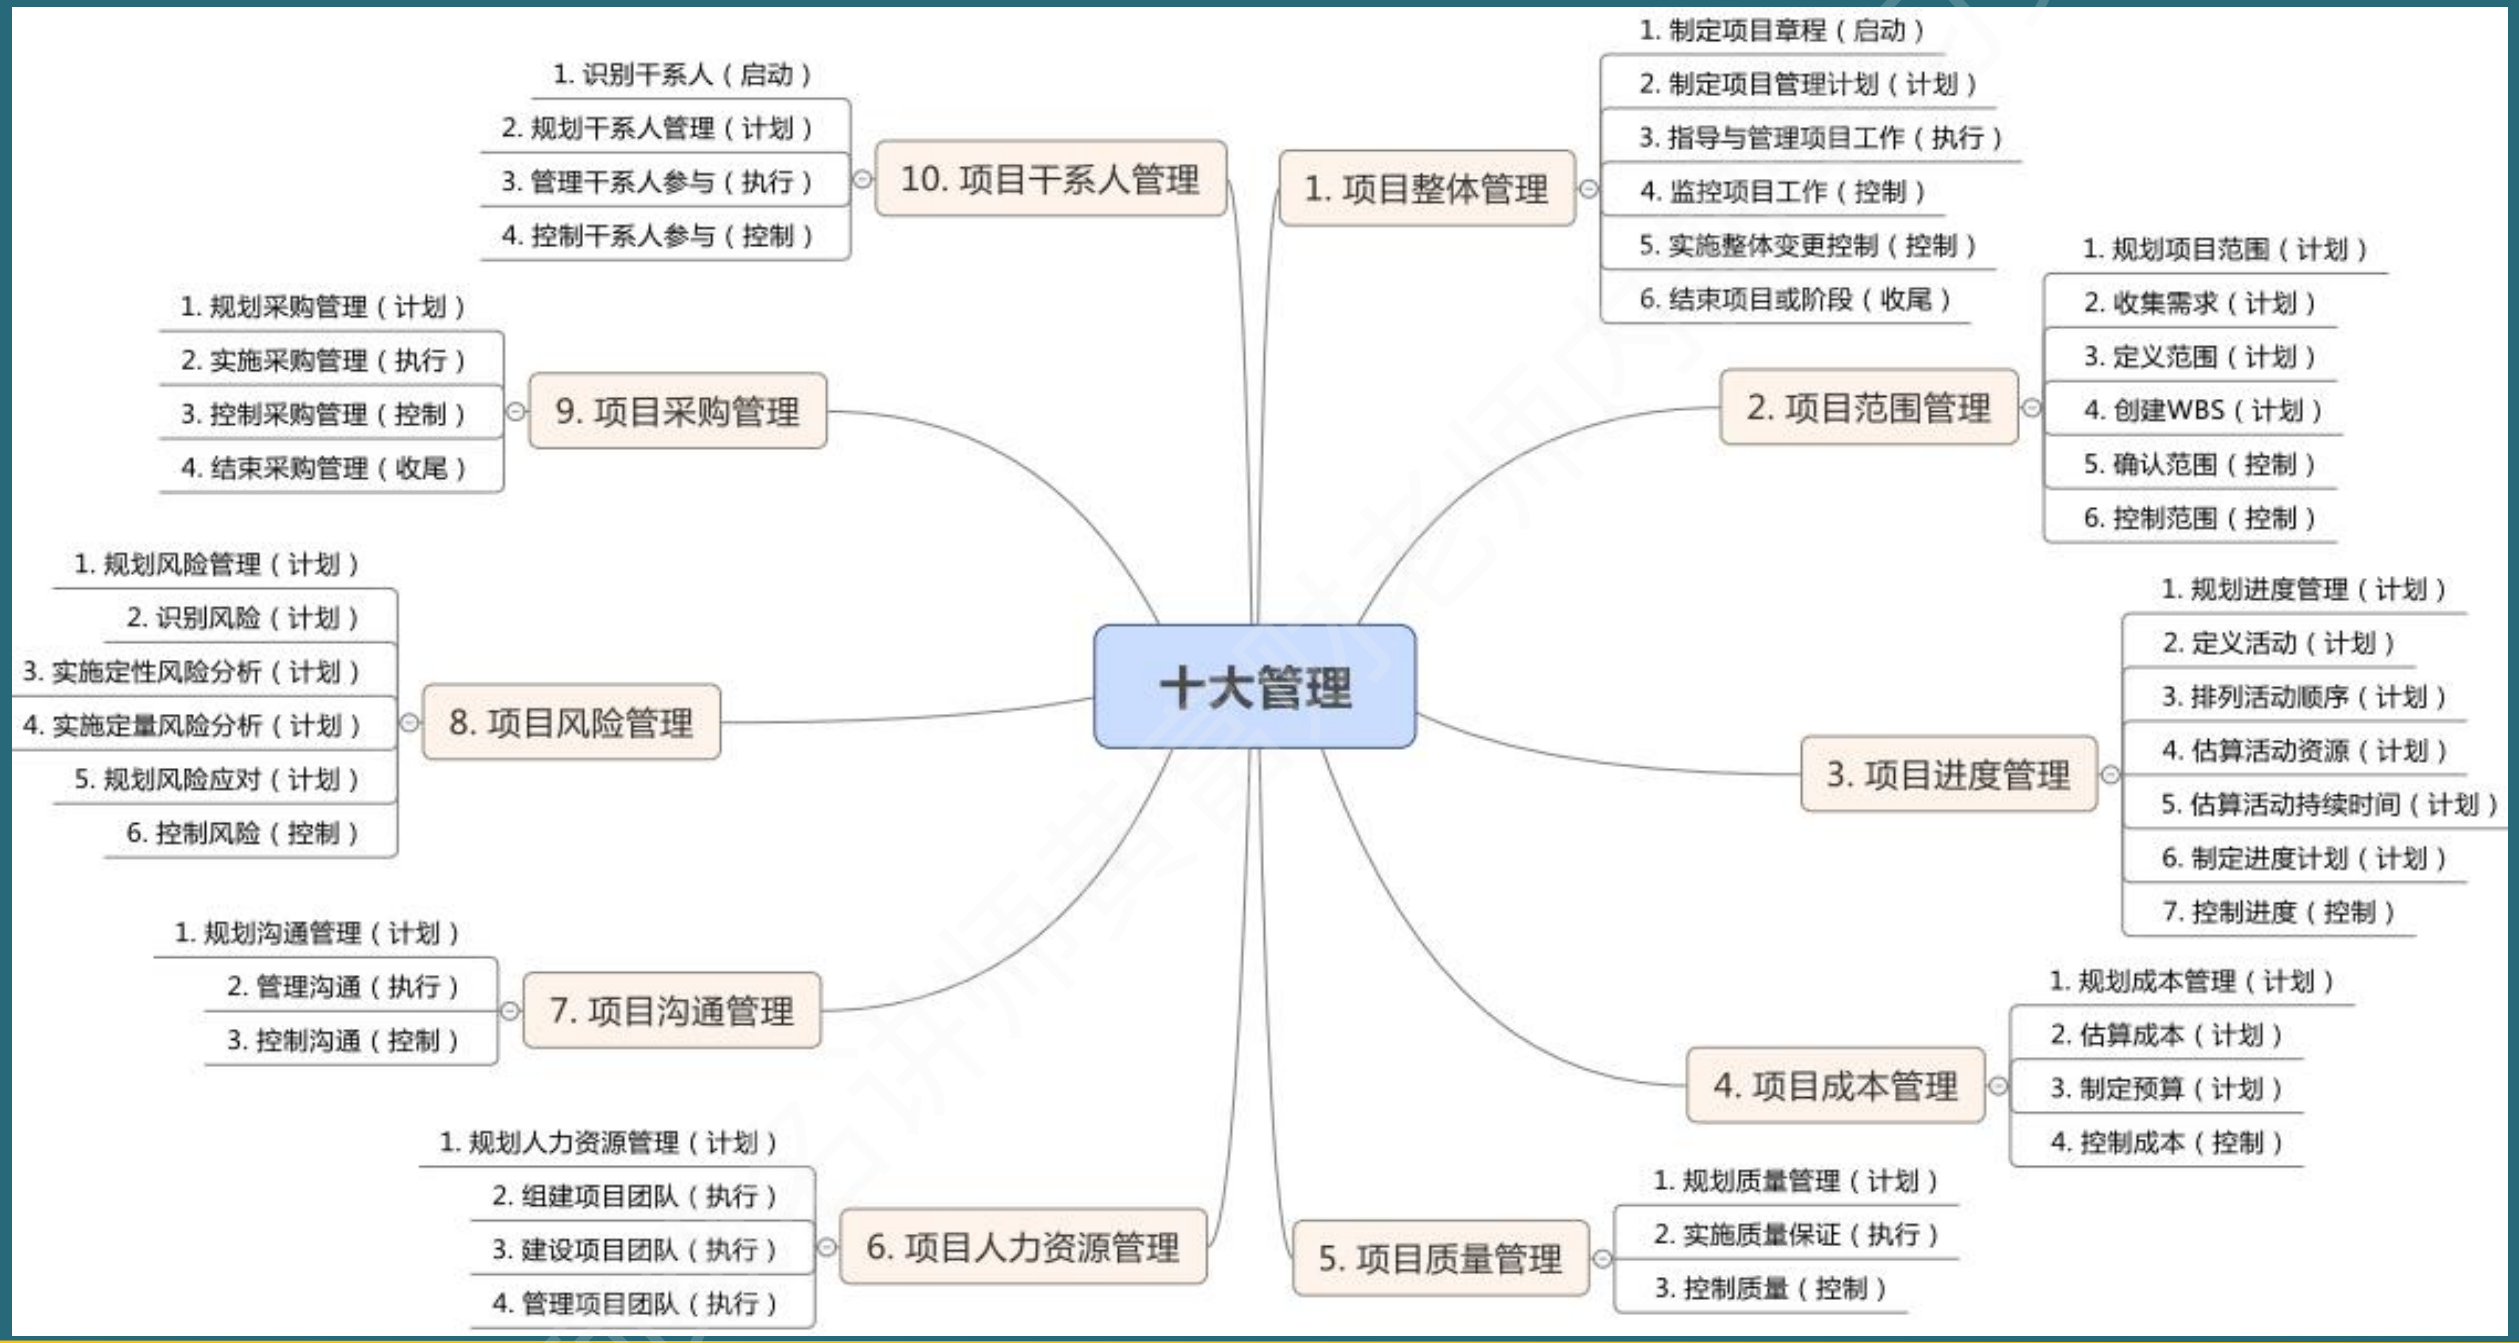
十大管理
1. 项目整体管理
1. 制定项目章程（启动）
2. 制定项目管理计划（计划）
3. 指导与管理项目工作（执行）
4. 监控项目工作（控制）
5. 实施整体变更控制（控制）
6. 结束项目或阶段（收尾）
2. 项目范围管理
1. 规划项目范围（计划）
2. 收集需求（计划）
3. 定义范围（计划）
4. 创建WBS（计划）
5. 确认范围（控制）
6. 控制范围（控制）
3. 项目进度管理
1. 规划进度管理（计划）
2. 定义活动（计划）
3. 排列活动顺序（计划）
4. 估算活动资源（计划）
5. 估算活动持续时间（计划）
6. 制定进度计划（计划）
7. 控制进度（控制）
4. 项目成本管理
1. 规划成本管理（计划）
2. 估算成本（计划）
3. 制定预算（计划）
4. 控制成本（控制）
5. 项目质量管理
1. 规划质量管理（计划）
2. 实施质量保证（执行）
3. 控制质量（控制）
6. 项目人力资源管理
1. 规划人力资源管理（计划）
2. 组建项目团队（执行）
3. 建设项目团队（执行）
4. 管理项目团队（执行）
7. 项目沟通管理
1. 规划沟通管理（计划）
2. 管理沟通（执行）
3. 控制沟通（控制）
8. 项目风险管理
1. 规划风险管理（计划）
2. 识别风险（计划）
3. 实施定性风险分析（计划）
4. 实施定量风险分析（计划）
5. 规划风险应对（计划）
6. 控制风险（控制）
9. 项目采购管理
1. 规划采购管理（计划）
2. 实施采购管理（执行）
3. 控制采购管理（控制）
4. 结束采购管理（收尾）
10. 项目干系人管理
1. 识别干系人（启动）
2. 规划干系人管理（计划）
3. 管理干系人参与（执行）
4. 控制干系人参与（控制）

第7章 项目范围管理概念

P61

含义

- 项目范围管理包括确保项目做且只做所需的全部工作，以成功完成项目的各个过程。
- 它关注的焦点是：什么是包括在项目之内的，什么是不包括在项目之内的，即为项 目工作明确划定边界。
- 通俗地讲，项目范围管理就是要做范围内的事，而且只做范围内的事，既不少做也不多做。
- 范围的定义可以是广义的，也可以是狭义的
- 范围管理和控制的有效性，是衡量项目是否达到成功的一个必要标准
- 项目范围管理是整体管理的一个主要部分

广东顶级名师黄富财老师内部学习

第7章 项目范围管理概念

P61

了解
读一遍，能懂就行

作用

1 .让项目管理人员和实施人员知道要做什么

2 .能确认项目相关各方的分工界面和责任

3 .为成本，时间，资源估算的准备性提供基础

4 .是进度测量和控制的基准

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习

第7章 项目范围管理概念




顶级名讲师黄富财老师内部学习

第7章 编制范围管理计划

P61

定计划就是定方案，定流程，定方法，定参数 r指导后续的工作

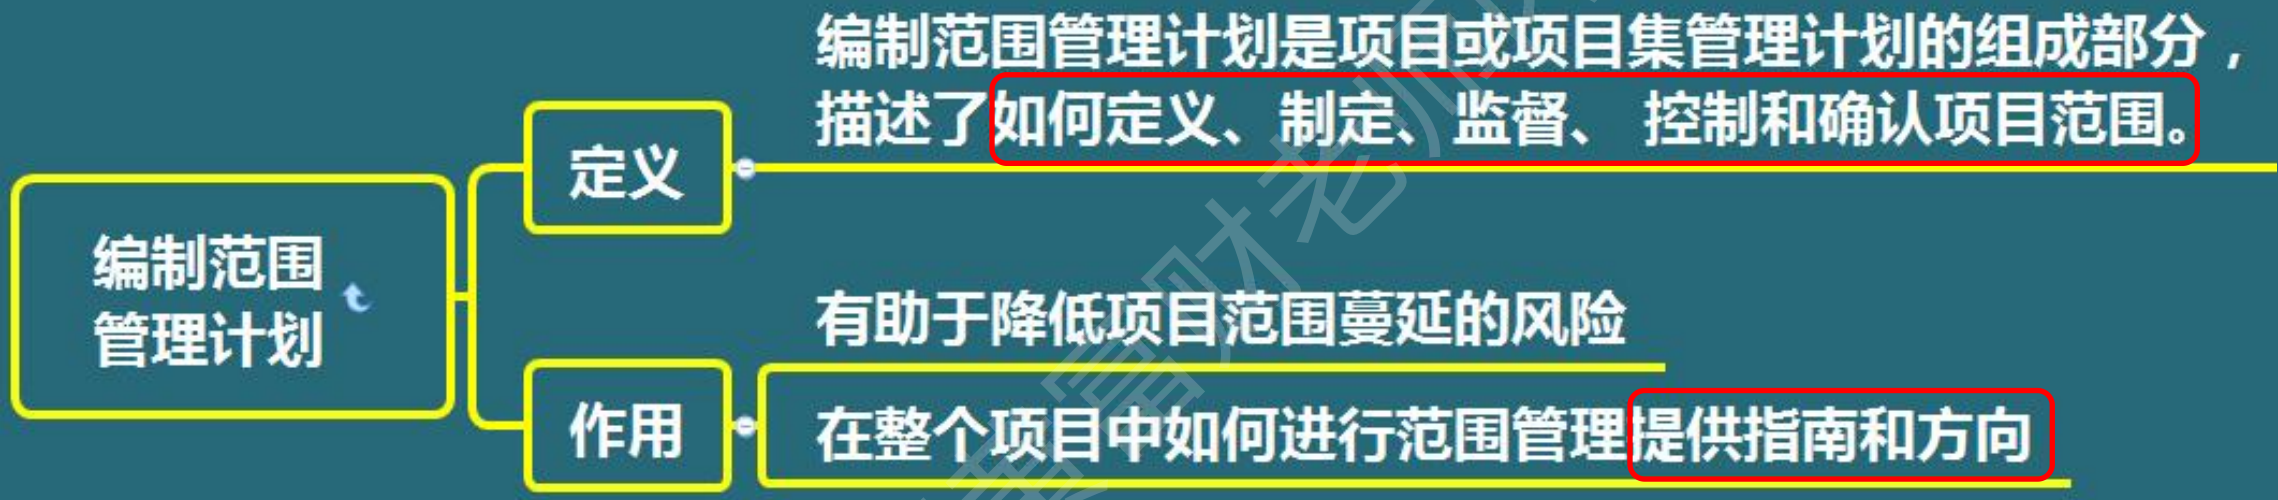

范围管理计划是制定项目管理计划过程和其他范围管理过程的主要依据

项目管理计划与其子计划互为输入

广东顶级专业讲师黄富财老师内部学习

第7章 编制范围管理计划　　P61

规划范围管理（计划过程组） 编制范围管理计划，书面描述将如何定义、确认和控制项目范围的过程		
输入	工具与技术	输出
1. 项目管理计划 2. 项目章程 3. 组织过程资产 4. 事业环境因素	1. 会议 2. 专家判断	1. 范围管理计划 2. 需求管理计划

规划管理=制定计划

除制定项目管理计划外，其他管理的输入都有项目管理计划

项目管理计划与其子计划互为输入

项目章程中的 总体要求、产品特征 是范围里面的输入

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习

第7章 编制范围管理计划的输出

P62 不重要，理解

★1.范围管理计划

- 范围管理计划可以是正式的，也可以是非正式的，非常详细，或者非常概括的
- 范围管理计划是制定项目管理计划和其他范围管理过程的主要依据
- 制定详细项目范围说明书。
- 根据详细项目范围说明书创建WBS
- 维护和批准工作分解结构（WBS）
- 正式验收已完成的项目可交付成果
- 处理对详细项目范围说明书或WBS的变更。

指导范围管理后续的工作

广东顶级专业技术资格证讲师内部学习

第7章 编制范围管理计划的输出

了解一下 不重要

★2.需求管理计划

需求管理计划是项目管理计划的组成部分，描述了如何分析，记录和管理需求

以及阶段与阶段间的关系对管理需求的影响

（1）如何规划、跟踪和报告各种需求活动。

（2）配置管理活动，例如，如何启动产品变更，如何分析其影响，如何进行追溯、跟踪和报告，以及变更审批权限。

（3）需求优先级排序过程。

（4）产品测量指标及使用这些指标的理由。

（5）用来反映哪些需求属性将被列入跟踪矩阵的跟踪结构。

（需求跟踪矩阵）

（6）收集需求过程。

（7）培训计划

（8）项目干系人参与需求管理的策略


（9）判断项目范围与需求不一致的准则和纠正的规程

高级内容补充需求管理计划

顶级名讲师黄富财老师学习

第7章 收集需求

P62

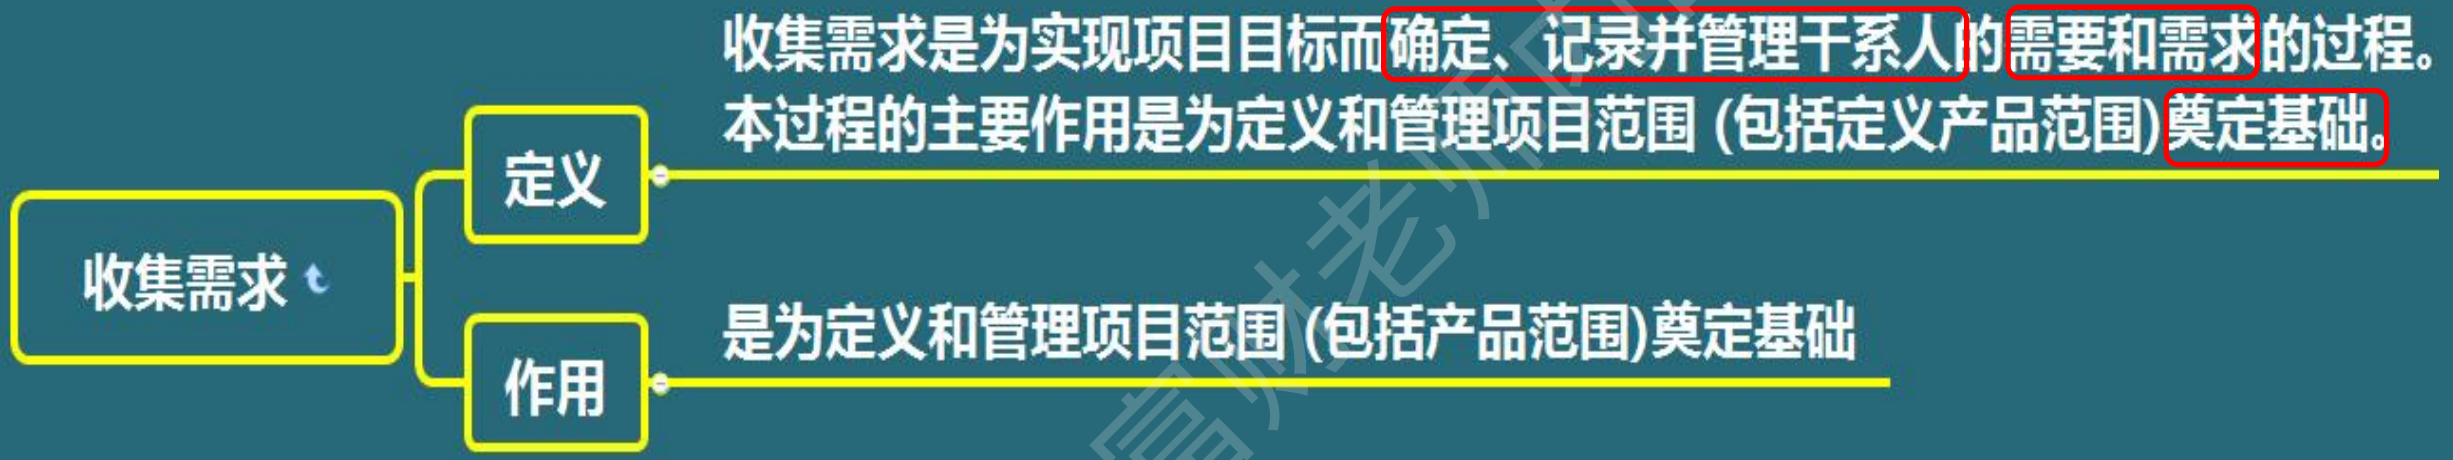

收集需求是确定项目要做什么

能准确地确定软件系统必须做什么和必须具备哪些阶段

设计是在需求的基础上设计怎么做

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习

第7章 收集需求　　P63-65

收集需求（计划过程组） 为实现项目目标而确定、记录并管理干系人的需要和需求的过程		
输入	工具与技术	输出
1. 范围管理计划 2. 需求管理计划 3. 项目章程 4. 干系人登记册 5. 干系人管理计划	1. 访谈（跟高层交谈可以识别成果特征和功能，可以获取机密信息） 2. 焦点小组（主题） 3. 引导式研讨会（跨部门，更早的发现问题） 4. 群体创新技术 * 5. 群体决策技术 * 6. 问卷调查 7. 观察（难以或不愿意说的需求） 8. 原型法 9. 标杆对照 10. 系统交互图 11. 文件分析	1. 需求文件 2. 需求跟踪矩阵

上一个过程的输出，是下一个过程的输入

顶级名讲师黄富财学习内部

第7章 收集需求的工具与技术

P64

掌握

工具与技术

1.访谈

一对一，可以多个，但一般在3到6个

是通过与干系人直接交谈来获取信息的正式或非正式的方法。
访谈的典型做法是向被访者提出预设和即兴的问题，并记录他们的回答

2.焦点小组

是召集预定的干系人和主题专家，了解他们对所讨论的产品、服务或成果的期望和态度。由一位受过训练的主持人引导大家进行互动式讨论。

不是一对一，可以多个，但一般在6到10个

焦点小组往往比“一对一”的访谈更热烈

单个部门开会，一般是焦点小组

(跨部门)

3.引导式研讨会

会把主要干系人召集在一起，通过集中讨论来定义产品需求。
研讨会是快速定义跨职能需求和协调干系人差异的重要技术

广东顶级中高级专业技术资格证讲师黄富财老师学习部

第7章 收集需求的工具与技术

群体创新技术口诀：
决义和念头

P64 掌握

4.群体创新技术

2，3，4 都是
头脑风暴基础
上做进一步处理

- ★1.头脑风暴法：一种用来产生和收集对项目需求与产品需求的多种创意的技术
- ★2.名义小组技术：用于促进头脑风暴的一种技术，通过投票排列最有用的创意，以便进一步开展头脑风暴和优先排序。
- 3.概念/思维导图：把从头脑风暴中获得的创意整合成一张图的技术，以反映创意之间的共性与差异，激发创意。
- 4.亲和图：用来对大量创意进行分组的技术，以便进一步审查和分析。
- 5.多标准决策分析：借助决策矩阵，用系统分析方法建立诸如风险水平、不确定性和价值收益等多种标准，从而对众多方案进行评估和排序的一种技术

从不同角度去考虑问题，考虑完后，再在众多标准中去选择方案

第7章 收集需求的工具与技术

P64

就是为达成某种期望结果，而对多个未来行动方案进行评估的过程。
本技术用于生成产品需求，并对产品需求进行归类和优先级排序

掌握 拍板的技术

- 5.群体决策技术
  - 群体决策的方法
    - ★一致同意：每个人都同意某个行动方案
    - ★大多数原则：获得群体中超过 50%人员的支持，就能做出决策。把参与决策的小组人数定为奇数，防止因平局而无法达成决策。
    - ★相对多数原则：根据群体中相对多数者的意见作出决策，以便未能获得大多数的支持
    - ★独裁：在这种方法中，由某一个人为群体做出决策。

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习

第7章 收集需求的工具与技术

P64

掌握

工具与技术

6.问卷调查

是指设计一系列书面问题，向众多受访者快速收集信息

问卷调查方法非常适用于以下情况，受众多样化，需要快速完成调查，受访者地理位置分散，并且适合开展统计分析

7.观察

是指直接察看个人在各自的环境中如何执行工作（或任务）和实施流程

当产品使用者难以或不愿清晰说明他们的需求时，就特别需要通过观察来了解他们的工作细节。以便挖掘隐藏的需求。

8.原型法

是指在实际制造预期产品之前，先造出该产品的实用模型，并据此征求对需求的早期反馈

广东顶级专业讲师黄富财老师内部学习

第7章 收集需求的工具与技术

P64

掌握

- 工具与技术
  - 9.标杆对照：将实际或计划的做法(如流程和操作过程)与其他可比组织的做法进行比较，以便识别最佳实践，形成改进意见，并为绩效考核提供依据
  - 10.系统交互图：是范围模型的一个例子，它是对产品范围的可视化描绘，显示业务系统及其与人和其他系统之间的交互方式
  - 11.文件分析：就是通过分析现有文档，识别与需求相关的信息，来挖掘需求

顶级名讲师黄富财老师内部学习

第7章 收集需求的输出

P64

逐步细化，只有明确的，可跟踪的，完整的，相互协调的，且主要干系人愿意认可的需求才能作为基准，需求文件格式 多种多样。

需求文件描述各种单一需求将如何满足与项目相关的业务需求。

- 1.需求文件
  - 需求文件的主要内容
    - 1、业务需求
    - 2、干系人需求
    - 3、解决方案需求
    - 4、项目需求
    - 5、过度需求
    - 6、与需求相关的假设条件、依赖关系和制约因素

抄到书本上

顶级名讲师黄富财老师内部学习

第7章 收集需求的输出

★需求跟踪矩阵是把产品需求从其来源连接到能满足需求的可交付成果的一种表格。

P64

掌握

需求跟踪矩阵的作用

- 使用需求跟踪矩阵，可以把每个需求与业务目标或者项目目标联系起来，有助于确保每个需求都具有商业价值。
- 需求跟踪矩阵提供了整个项目生命周期中跟踪需求的一种方法。
- 有助于确保需求文件中被批准的每项 需求在项目结束的时候都能交付。
- 需求跟踪矩阵还为管理产品范围变更提供了框架。

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习

第7章 收集需求的输出

P64

背一下，以防万一

需求跟踪矩阵
包括以下内容

- 业务需要、机会、目的和目标
- 项目目标
- 项目范围/WBS可交付的成果
- 产品设计
- 产品开发
- 测试策略和测试场景
- 高层集到详细需求

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习

第7章 收集需求的输出

P64

掌握

★应在需求跟踪矩阵中记录每个需求的相关属性。

需求跟踪矩阵记录的典型属性

背一下，以防万一


★需求跟踪矩阵中记录的典型属性包括唯一标识、需求的文章描述、收录该需求的理由、所有者、来源、优先级别、版本、当前状态和状态日期。

★为确保干系人满意，可以增加一些补充属性，如稳定性、复杂性和验收标准。

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习

第7章 定义范围

P65

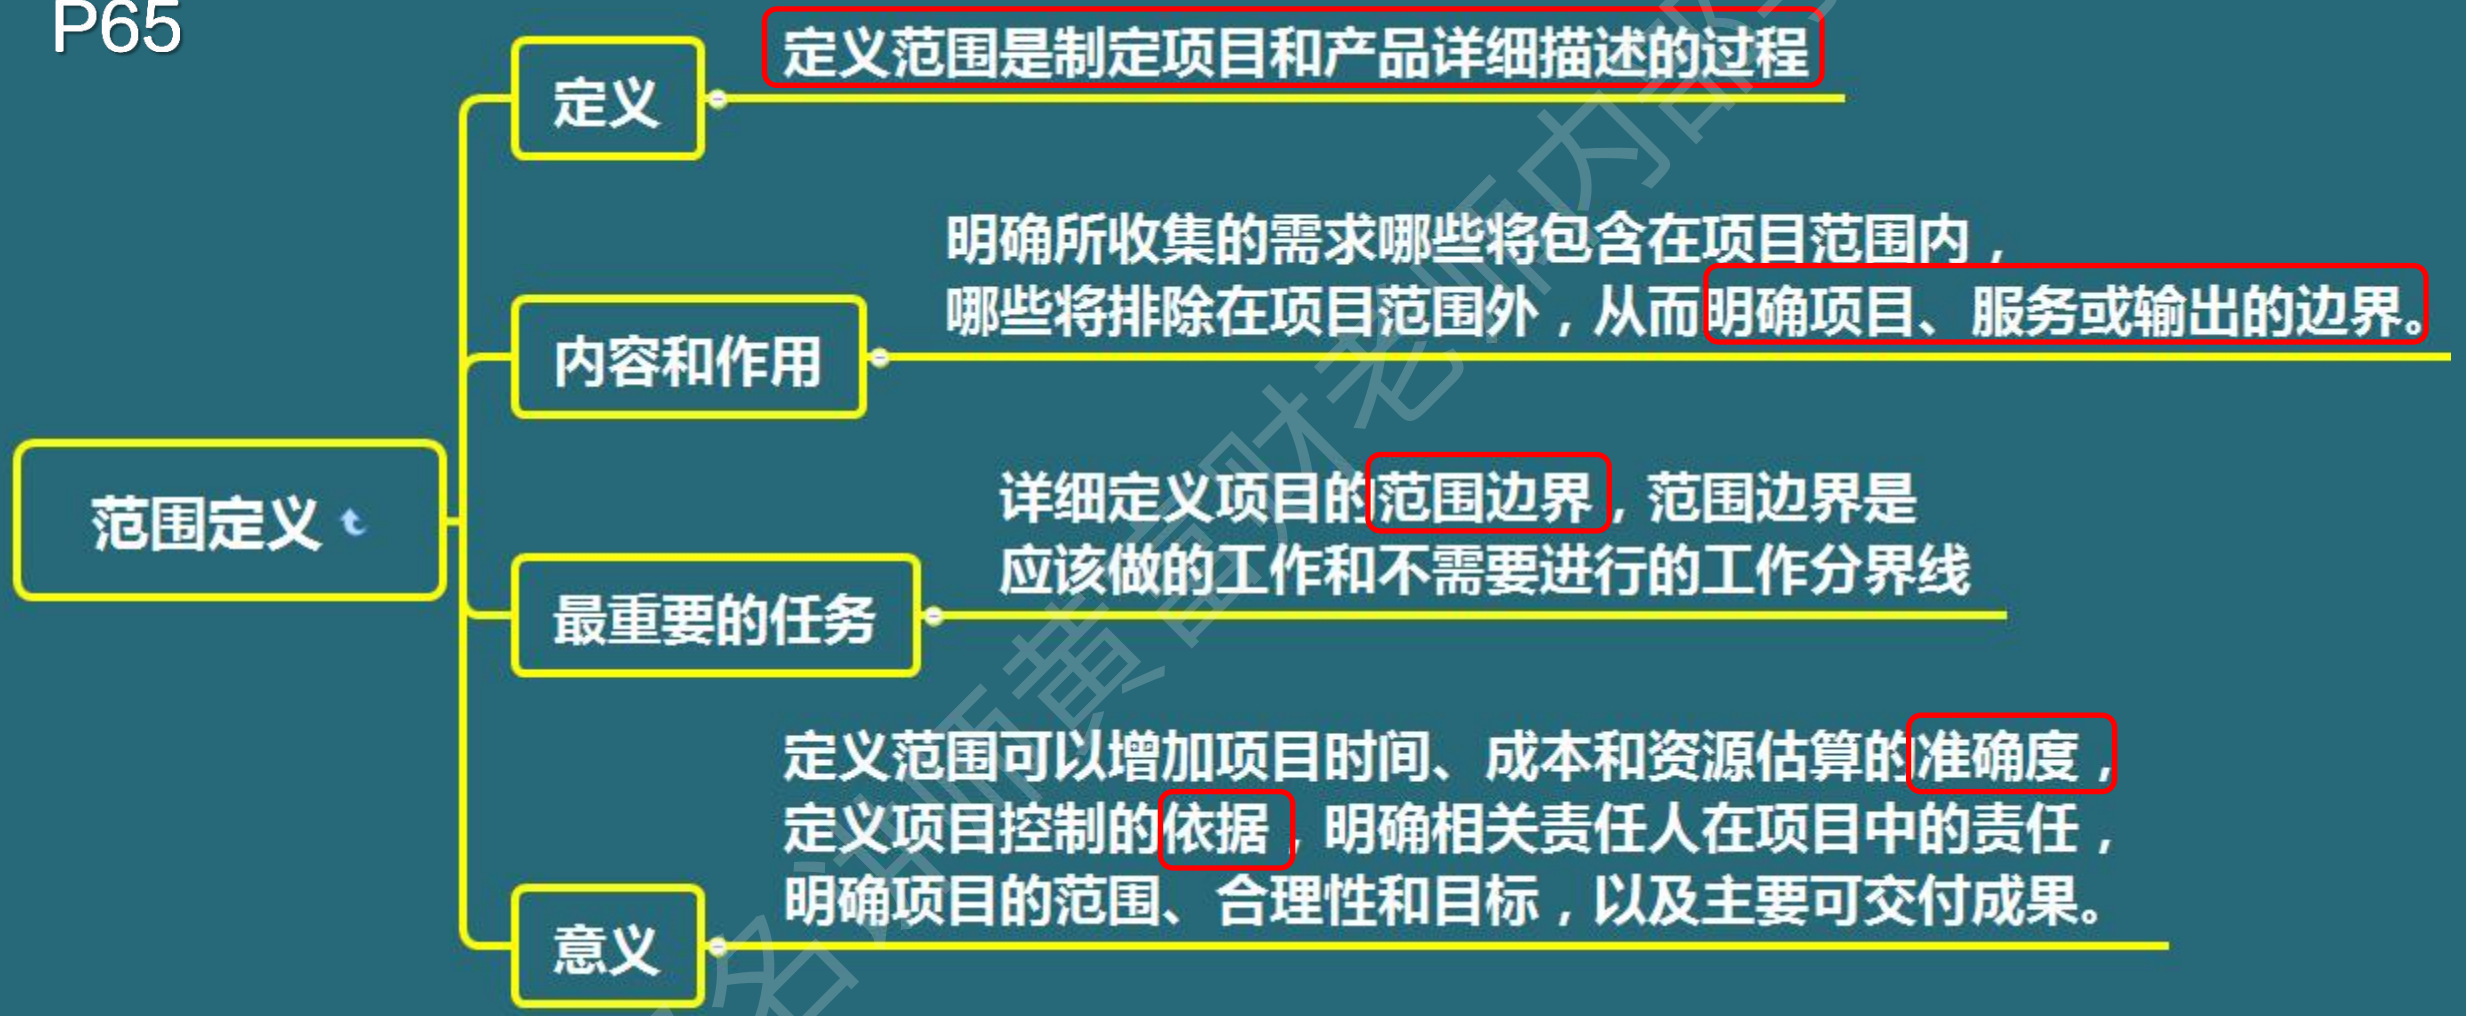

广东顶级名师顾黄富财老师内部学习

第7章 定义范围

P65-66


定义范围（计划过程组） 制定项目和产品详细描述的过程		
输入	工具与技术	输出
1. 范围管理计划 2. 项目章程 3. 需求文件 4. 组织过程资产	1. 产品分析 2. 专家判断 3. 备选方案生成 4. 引导式研讨会	1. 项目范围说明书 2. 项目文件更新

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习

第7章 定义范围

P66

产品分析是一种有效的工具。每个应用领域有一种或几种普遍公认的方法，用以把高层级的产描述转交为有形的可交付成果。产品分析技术包括品分解、系统分析、需求分析、系统工程、价重工程和价值分析等。

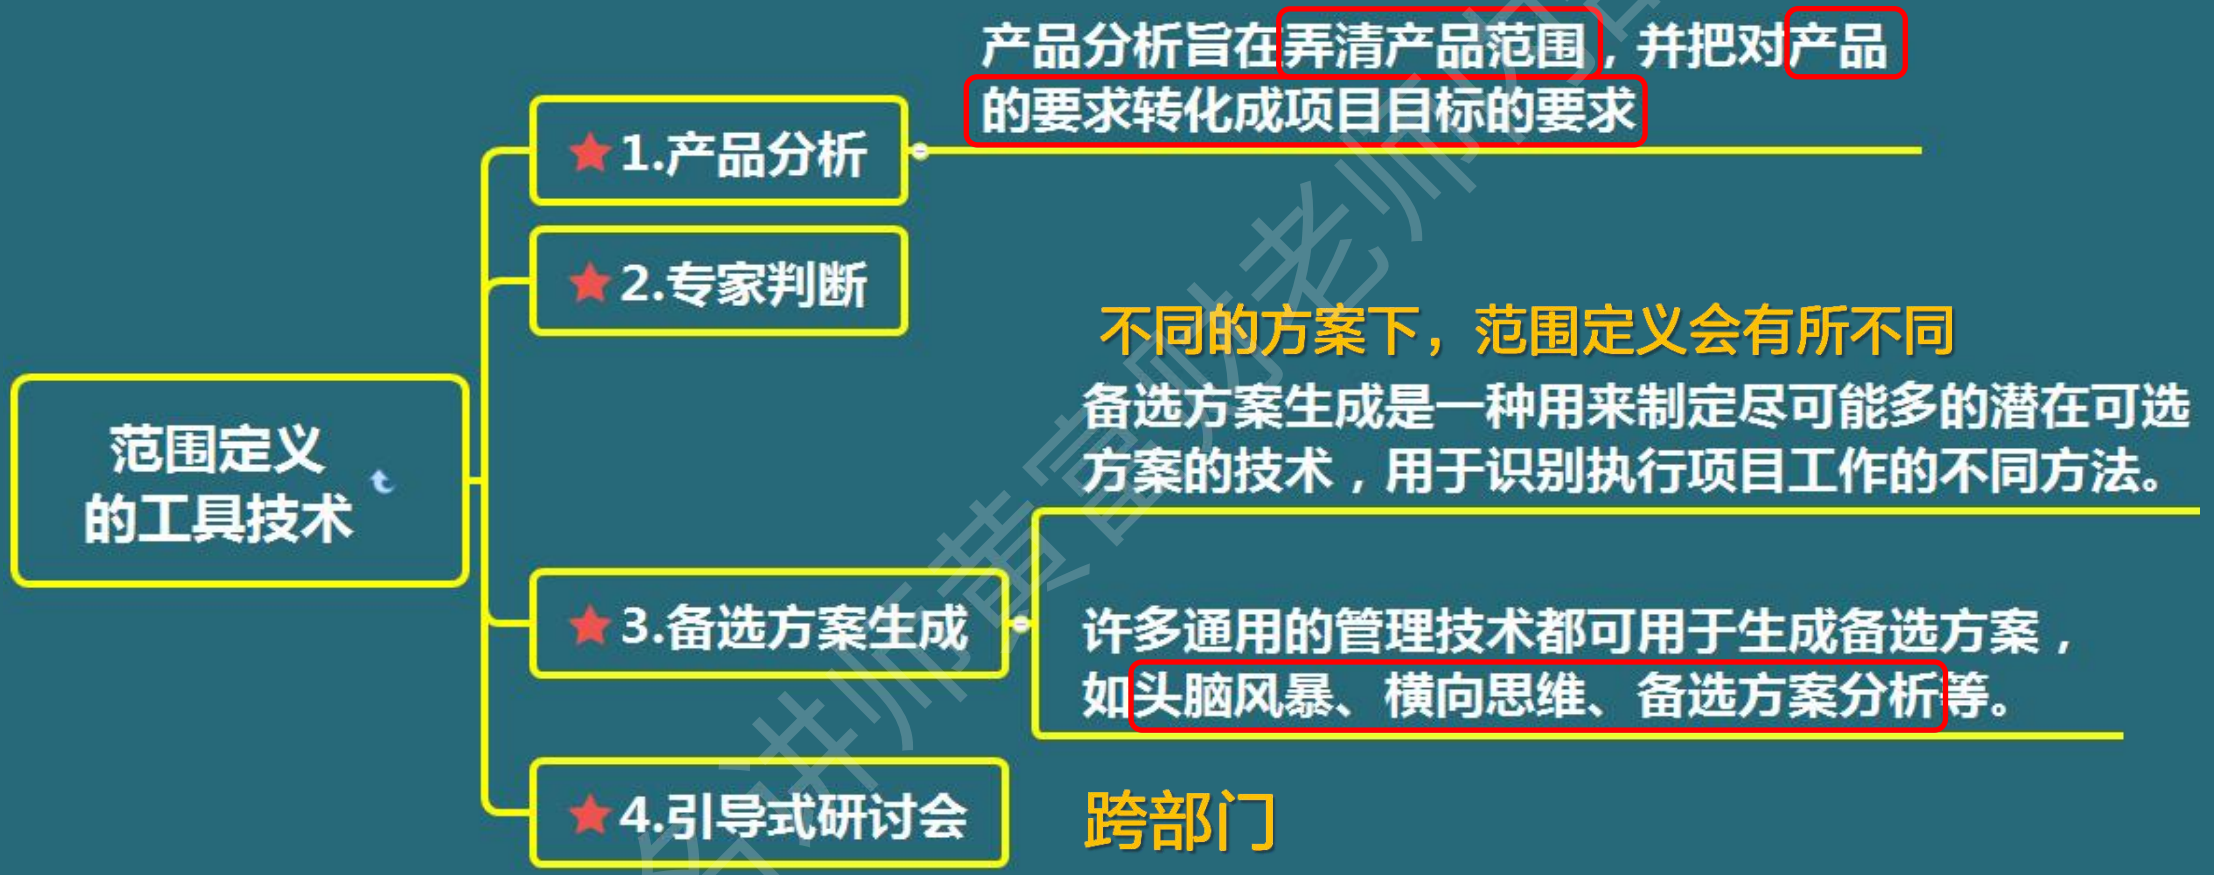

广东顶级名讲师黄富财老师知识分享

第7章 范围说明书

P66

重要

范围说明书

- 定义
  - 项目范围说明书是对项目范围、主要可交付成果、假设条件和制约因素的描述。
  - 项目范围说明书记录了整个范围，包括项目和产品范围
- 内容
  - ★1.项目目标
  - ★2.产品范围描述
  - ★3.项目需求
  - ★4.项目边界
  - ★5.项目的可交付成果
  - ★6.项目的制约因素
  - ★7.假设条件

口诀：标书求姐夫制假 重要，要背
没有资源需求

理解

- 与项目章程的区别
  - 虽然项目章程和项目范围说明书的内容存在一定程度的重叠，但它们的详细程序完全不同。
  - 项目章程包含高层级的信息，而项目范围说明书则是对项目范围的详细概述。
  - 项目范围需要在项目过程中渐进明细

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习

第7章 范围说明书

P66

表7-1 项目章程和项目范围说明书的内容

项目章程	项目范围说明书
项目目的或批准准项目的原因	项目范围描述(渐进明细)
可测量的项目目标和相关的成果标准	验收标准
高层级需求	项目可交付成果
高层级项目需求	项目的除外责任
高层级风险	项目制约因素
总体里程碑进度计划	项目假设条件
总体预算	
干系人清单	
项目审批要求 (如什么构成项目成功，由谁决定，由谁部署)	
委派的项目经理及其职责	
发起人或其他批准项目章程的人员姓名和职权	

第7章 创建工作分解结构

工作：作为活动结果的工作产品或可交付成果

创建工作分解结构是把项目可交付成果和项目工作分解成较小的、更易于管理的组件的过程。

定义

工作分解结构（WBS）是项目管理的基础，项目的所有规划和控制工作都必须基于工作分解结构。


P66 看2遍

WBS的作用和意义

- **便于把握项目控制项目过程**
  - 通过工作结构分解，把项目范围分解开来，使项目相关人员对项目一目了然，能够使项目的概况和组成明确、清晰、透明和具体。
  - 使项目管理者和项目干系人如投资人或客户，都能通过WBS把握项目、了解和控制项目过程。
- **保证项目结构的系统性和完整性**
  - 因为分解的过程要求包含项目的所有工作，这样才可能在规划和实施项目中保证不会存在遗漏，进而保证了项目的完整性。
- **便于执行和实现目标要求**
  - 通过工作结构分解，可以建立完整的项目保证体系
  - 因为这个分解过程将项目的总目标关注的重点，如进度、成本和质量等分解到可控制的各项目单元，便于执行和实现目标要求。

第7章 创建工作分解结构

P66 看2遍

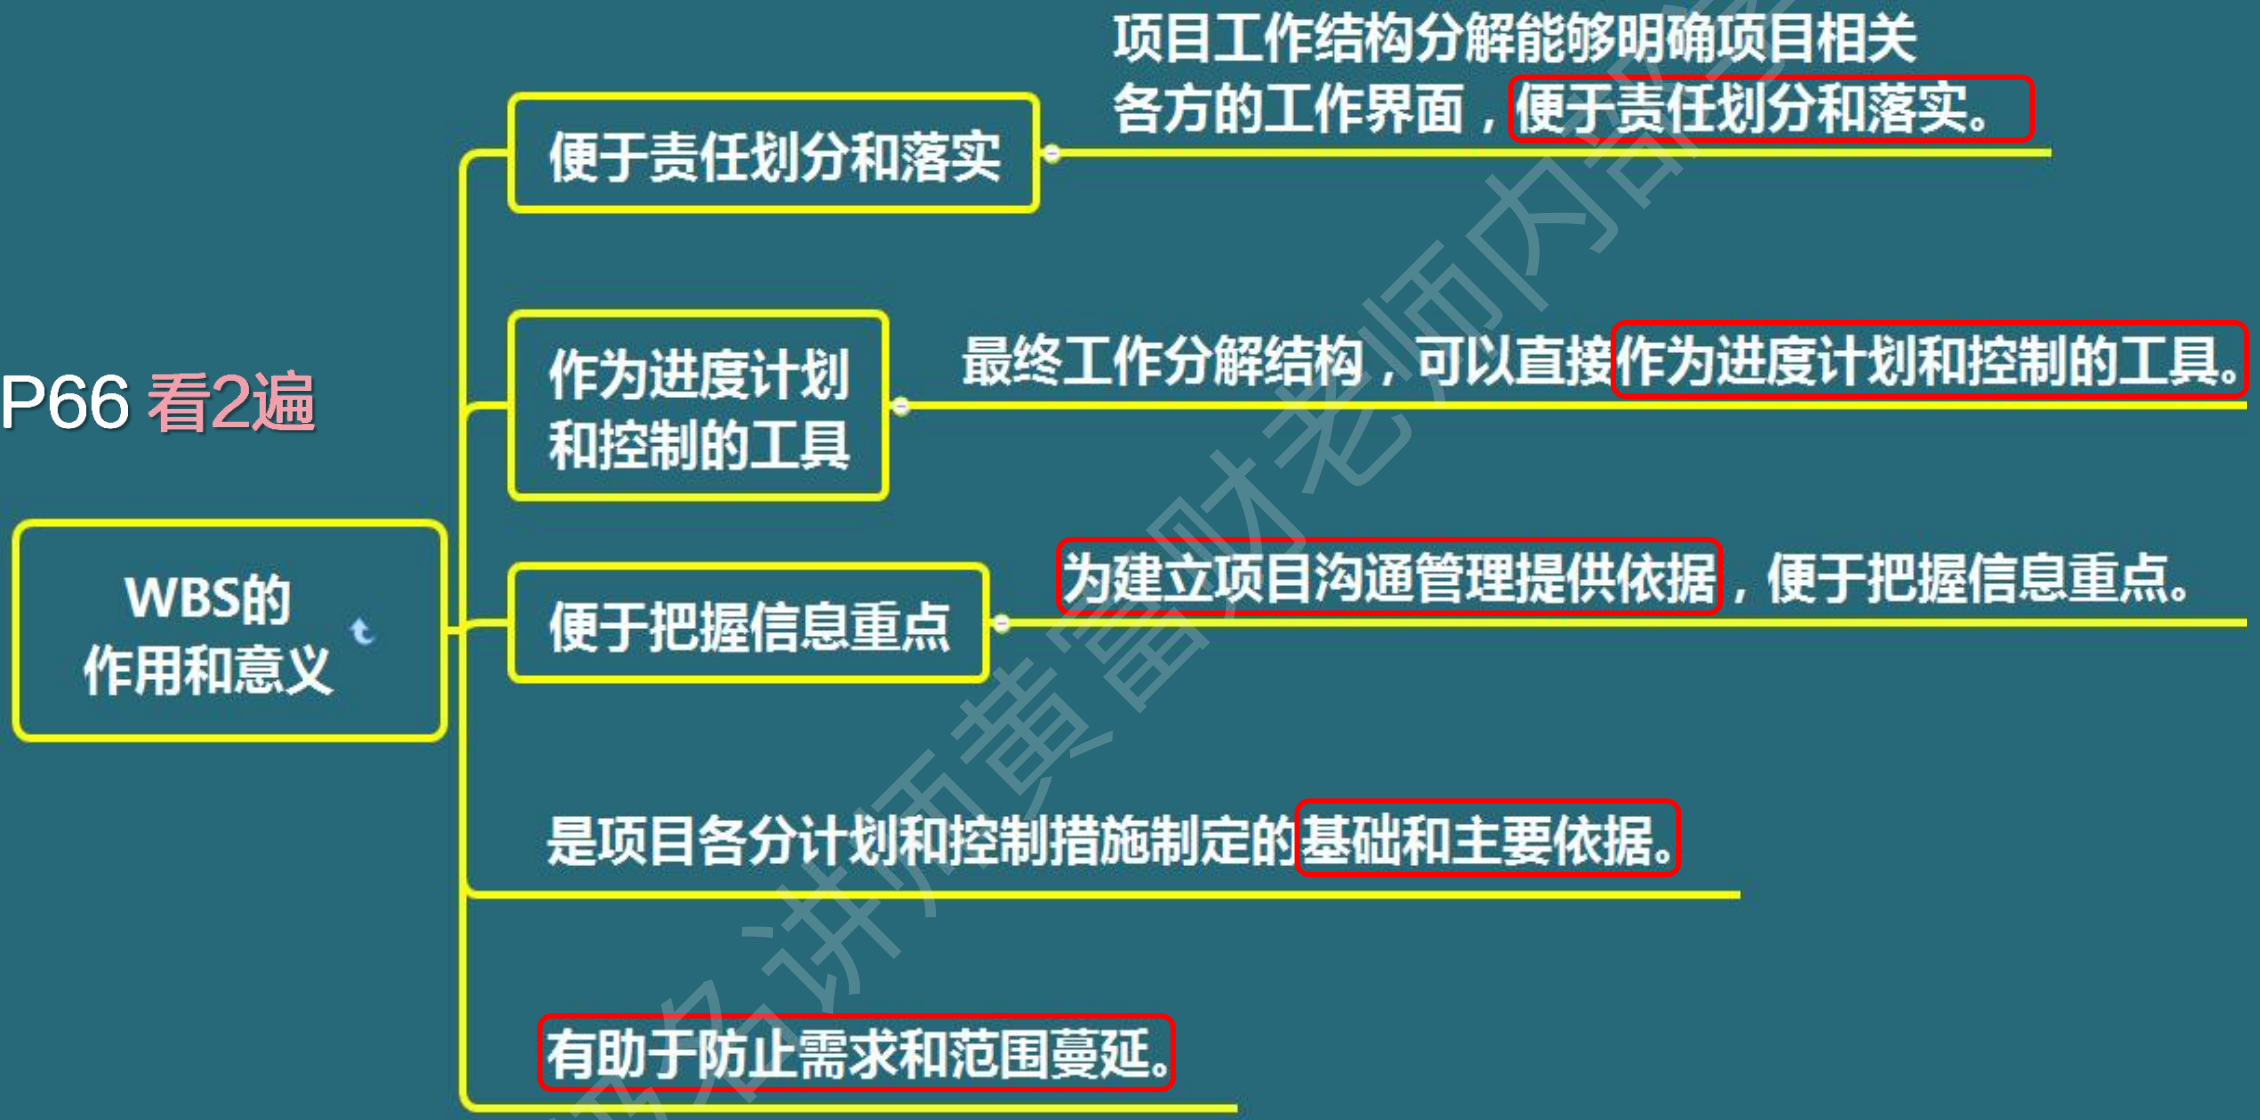

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习

第7章 创建工作分解结构

如果题目说是主要干系人参与就要注意了

工作包

WBS最低层的工作单元被称为工作包，
是我们进行进度安排、成本估算和监控的基础。

必须掌握

P66

WBS包含的内容

★1.工作分解结构是用来确定项目范围的，项目的全部工作都必须包含在工作分解结构当中，100%
而且不包含在工作分解结构中的任何工作都不是项目的组成部分，都不能做，否则就是“镀金”。

★2.工作分解结构的编制需要所有项目干系人的参与，需要项目团队成员的参与。
主要的干系人也对，不是完成，是参与

★3.工作分解结构是逐层向下分解的。
最高层的要素是整个项目或分项目的最终成果

★4.工作分解结构应控制在3-6层为宜。
如果项目比较大，超过6层，
我们可以把大项目分解成小项目，
然后针对子项目来做工作分解结构

★5.工作分解结构中的各要素应该是相对独立的，要尽量减少相互之间的交叉。

第7章 创建工作分解结构

WBS表现形式口诀：表叔

P68
掌握-重要

- WBS表现形式
  - 1.分级的树型结构
    - 优点：树型结构图的WBS层次清晰，非常直观，结构性强
    - 缺点：但是不容易修改，对于大型的、复杂的项目也很难表示出项目的全缺点现。
    - 适用：由于其直观性，一般在一些小的、适中的应用项目中用得较多
  - 2.表格形式
    - 优点：格能够反映出项目所有的工作要素
    - 缺点：直观性较差。
    - 适用：但在一些大型的、复杂的项目中使用还是较多的，因为有些项目分解后，内容分类较多、容量较大，用缩进表的形式表示比较方便也可装订为手册

有些项目用鱼骨图来表示工作分解结构

第7章 创建工作分解结构



广东顶级名讲师黄富财老师内部学习

第7章 创建工作分解结构

要会
计算总工期

表7-2 远程教育项目工作分解结构表格形式示意图

WBS编码	工作任务	工期	负责人
1	硬件采购	2月	何波
2	第三方软件采购	2月	邓方
3	系统功能确定	5月	张杰
3.1	设备管理	1月	阳波
3.2	维护管理	1月	刘顺东
3.3	工单管理	1月	谢後
3.3.1	模块设计	5天	段玉
3.3.2	代码编制	5天	习三平
3.3.3	单元测试	10天	刘春利
3.3.4	功能测试	5天	汪海洋
3.3.5	验证测试	5天	钱小小
3.4	采购管理	1月	赵云
3.5	库存管理	1月	曲东清
4	系统接口	1月	吴越
5	现场实施	1月	张良

第7章 创建工作分解结构 （补充）

掌握

WBS分层方式

1、将项目生命周期的各阶段作为分解的第二层

2、主要可交付成果作为分解的第二层

3、子项目作为分解的第二层

包含外包工作，外包工作是项目的一部分，卖方需要编制相应的合同WBS

产品和项目可交付成果放在第三层

P68 重要-掌握

工作分解结构中的一些概念

- 里程碑
- 工作包
- 控制账户
- WBS字典
- WBS编码设计

广东顶级专业技师黄富财老师内部学习

第7章 创建工作分解结构 P68 重要

一般里程碑完成的时间，都是要求客户或者高层参与的，不消耗时间，也不消耗成本，只是一个时间节点

里程碑标志着某个可交付成果或者阶段的正式完成。

★里程碑：重要检查点叫做里程碑，重要里程碑叫做基线。

掌握

工作包是位于工作分解结构每条分支最低层的可交付成果或项目工作组成部分。

★工作包：作为一种经验法则，8/80规则(80小时原则)建议工作包的大小应该至少需要8个小时来完成，而总完成时间也不应该大于80小时。

工作包：

应该非常具体，以便承担者能明确自己的任务、努力的目标和承担的责任。

但是工作包应该遵循8/80原则，不能太大，也不能太小。太大会难以管理，太小会消耗资源

规划包：

在控制账户之下，工作内容已知但尚缺详细进度活动的WBS组成部分，它是暂时用来做计划的，随着情况的逐渐清晰，规划包最终将被分解成工作包以及相应的具体活动。（补充）

第7章 创建工作分解结构

在制作分解结构的过程中，把每个工作包分配到一个控制账户，并根据“账户编码”为工作包建立唯一标识，这些标识为进行成本进度与资源信息的层级汇总提供了层级结构。

掌握

★控制账户

控制账户是一个管理控制点。
在该控制点上，把范围、预算、实际成本和进度加以整合，并与挣值相比较，以测量绩效。

控制账户设置在WBS中选定的管理节点上。
每个控制账户可能包括一个或多个工作包，但是一个工作包只能属于一个控制账户。

总结：
控制账户和工作包的关系：一对多的关系

广东顶级名师黄富财老师官方学习

第7章 创建工作分解结构

某个可交付成果，如果具有下列特征之一，就可能被当作为工作包：
①规模较小，可以在时同(80小时)完成，
②从逻辑上讲，不能再分。
③所需资源、时闻、成本等已经可以比较准确地估算，已经可以对其进行有效的时间、成本、质量、范围和风险控制。

顶级名讲师黄富财老师内部学习

第7章 创建工作分解结构的工具与技术

P69 非常重要

★分解步骤

（1）识别和分析可交付成果及相关工作。

（2）确定WBS的结构和编排方法。

（3）自上而下逐层细化分解。

（4）为WBS组件制定和分配标识编码。

（5）核实可交付成果分解的程度是否恰当。

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习

第7章 创建工作分解结构的工具与技术

P69 非常重要

★分解原则

(1)在层次上保持项目的完整性，避免遗漏必要的组成部分。 整体 100%

(2)一个工作单元只能从属于某个上层单元，避免交叉从属。 上下

(3)相同层次的工作单元应用相同性质。 左右

(4)工作单元应能分开不同的责任者和不同的工作内容。 能分

(5)便于项目管理计划和项目控制的需要。 便于

(6)最底层工作应该具有可比性，是可管理的，可定量检查的。 最底

(7)应包括项目管理工作，包括分包出去的工作。 包括

第7章 创建工作分解结构

范围基准： 经过批准的范围说明书、工作分解结构（WBS)和相应的WBS词典组成了范围基准，只有通过正式的控制变更程序才能进行变更这个基准，它被用作与绩效比较的基础。

需要生产一些配套的文件，这些文件需要和工作分解结构配合使用，称为工作分解结构词典

★WBS字典

- 包括供工作分解结构组成部分的详细内容、账户编码、工作说明、负责人、进度里程碑清单等等
- 还可能包括合同信息、质量要求、技术文献、计划活动、资源和成本估计等

WBS词典是针对每个WBS组件，详细描述可交付成果、活动和进度信息的文件。WBS词典对WBS提供支持。WBS词典中的内容可能至少包括：账户编码标识、工作描述、假设条件和制约因素、负责的组织、进度里程碑、相关的进度活动、所需资源、成本估算、质量要求、验收标准、技术参考文献、协议信息。

背

广东顶级名师黄富财老师学习

第7章 创建工作分解结构

不重要

★WBS编码设计

为了简化WBS的信息交流过程，通常利用编码技术对WBS进行信息交换。

编码设计与结构设计存在对应关系。

结构的每一层次代表编码的某一位数，有一个分配给它特定的代码数字

顶级名讲师黄富财老师内部学习

第7章 创建工作分解结构（补充）

看二遍

分解注意事项

1、WBS必须是面向可交付成果的
- 项目的目标是提供产品或服务，仅仅是一连串特别的活动。

2、WBS必须符合项目的范围
- WBS必须包括，也仅包括为了完成项目的可交付成果的活动

3、WBS的底层应该支持计划和控制
- WBS是项目管理计划和项目范围之间的桥梁
- WBS的底层不但要支持项目管理计划，而且要让管理层能够监视和控制项目的进度和预算

4、WBS中的元素必须有人负责，而且只由一个人负责，尽管实际上可能需要多个人参与

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习

第7章 创建工作分解结构（补充）

看二遍

分解注意事项

- ★5、WBS的指导
  - 作为指导而不是原则，WBS应控制在4~6层。
  - 当然，大项目可以超过6层
- ★6、WBS应包括项目管理工作，也要包括分包出去的工作。
- ★7、WBS的编制需要所有(主要)项目干系人的参与，需要项目团队成员的参与
- ★8、WBS并非是一成不变的，在完成了WBS之后的工作中，仍然有可能需要对WBS进行修改。

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习


第7章 创建工作分解结构

创建WBS（计划过程组） 将项目可交付成果和项目工作分解为较小的、更易于管理的组件的过程		
输入	工具与技术	输出
1. 范围管理计划 2. 项目范围说明书 3. 需求文件 4. 组织过程资产 5. 事业环境因素	1. 分解 2. 专家判断	1. 范围基准 • 经批准的范围说明书 • WBS • WBS词典 2. 项目文件更新

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习

第7章 创建工作分解结构的输出

P70 非常重要

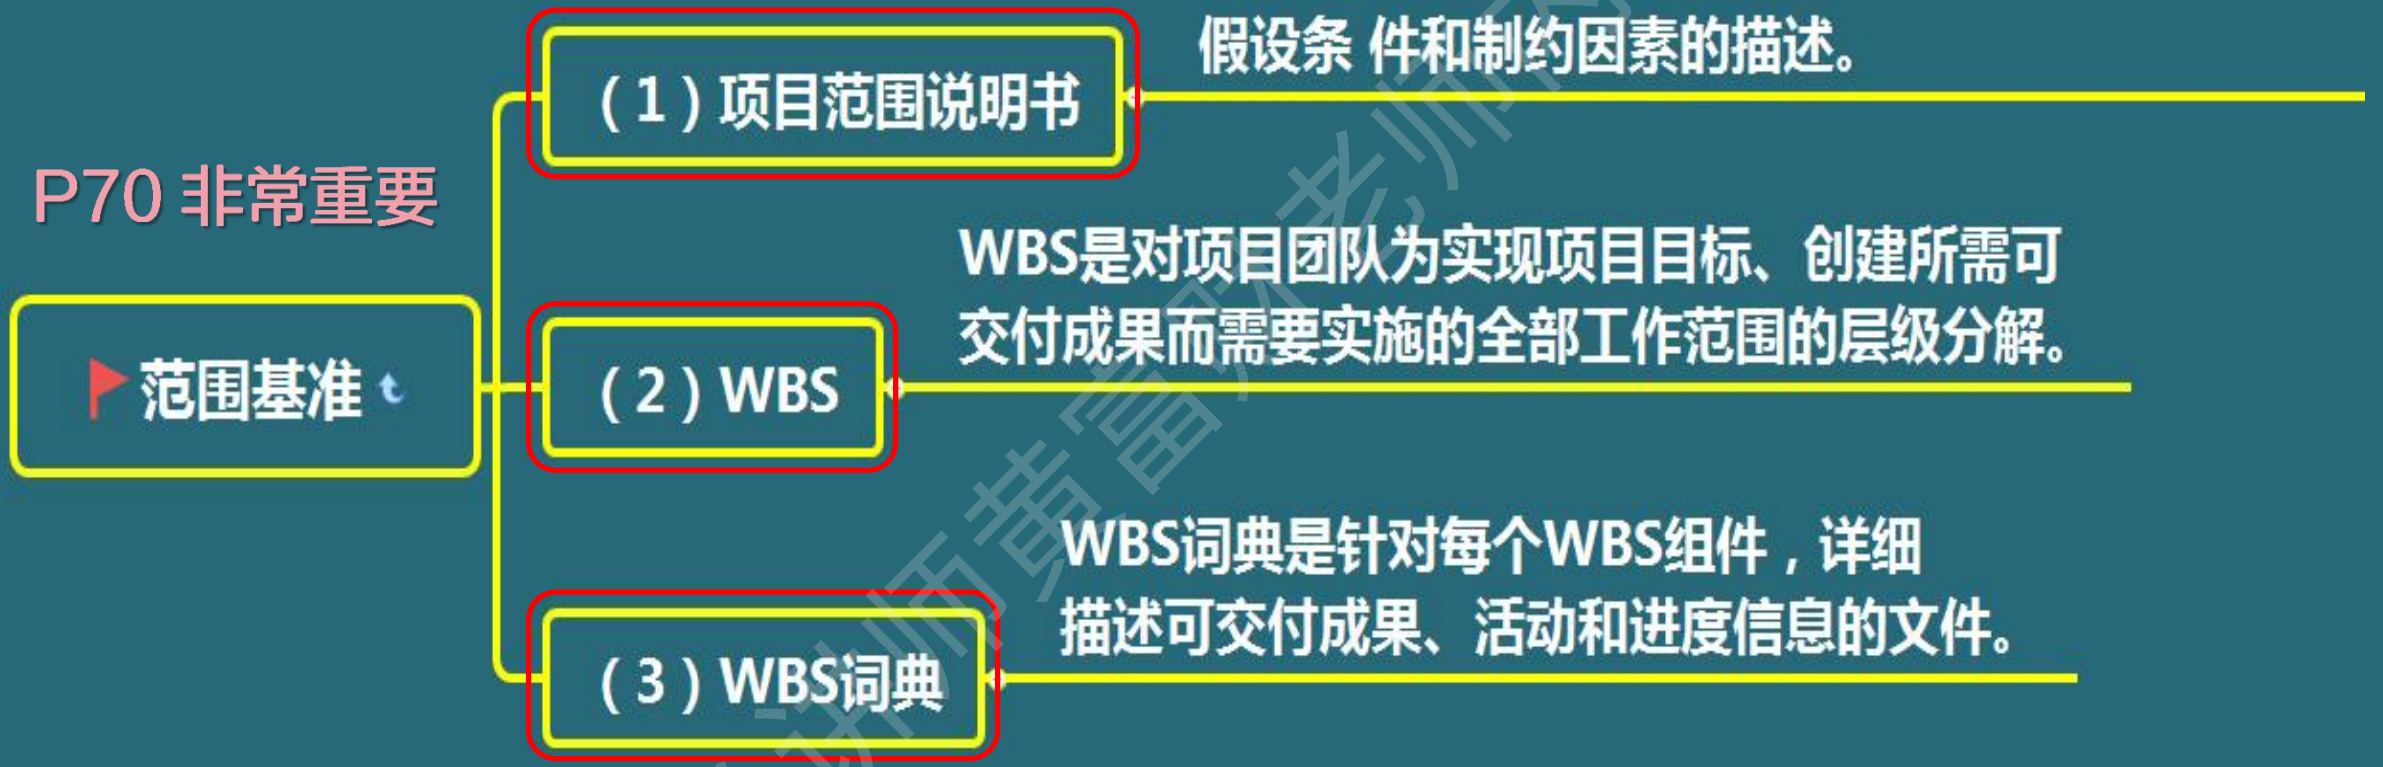

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习

第7章 项目范围确认

定义

- 确认范围是正式验收已完成的项目可交付成果的过程。
- 本过程的主要作用是，使验收过程具有客观性
- 同时通过验收每个可交付成果，提高最终产品、服务或成果获得验收的可能性。

项目范围确认的工作要点

1. 制定并执行确认程序
   - 确认范围过程与控制质量过程的不同之处在于，前者关注可交付成果的验收，而后者关注可交付成果的正确性及是否满足质量要求。
   - 控制质量过程通常先于确认范围过程，但二者也可同时进行。
   - 确认范围的一般步骤
2. 项目干系人对项目范围的正式承认
   - 无重要考点

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习

第7章 项目范围确认

掌握
考试考顺序排序选择题

★确认范围的一般步骤

(1)确定需要进行确认范围的时间。

(2)识别确认范围需要哪些投入。

(3)确定范围正式被接受的标准和要素。

(4)确定确认范围会议的组织步骤。

(5)组织确认范围会议。

时投标不会

顶级名讲师黄富财老师内部学习

第7章 项目范围确认


确认范围（监控过程组） 正式验收已完成的项目可交付成果的过程，注重结果的可接受性		
输入	工具与技术	输出
1. 项目管理计划 2. 需求跟踪矩阵 3. 需求文件 4. 核实的可交付成果 5. 工作绩效数据	1. 检查（审查、产品评审、审计、走查、巡检） 2. 群体决策技术	1. 验收的可交付成果 2. 变更请求 3. 工作绩效信息 4. 项目文件更新



广东顶级名讲师黄富财老师内部学习

第7章 项目范围确认

P71
是拍板的过程不包含观察

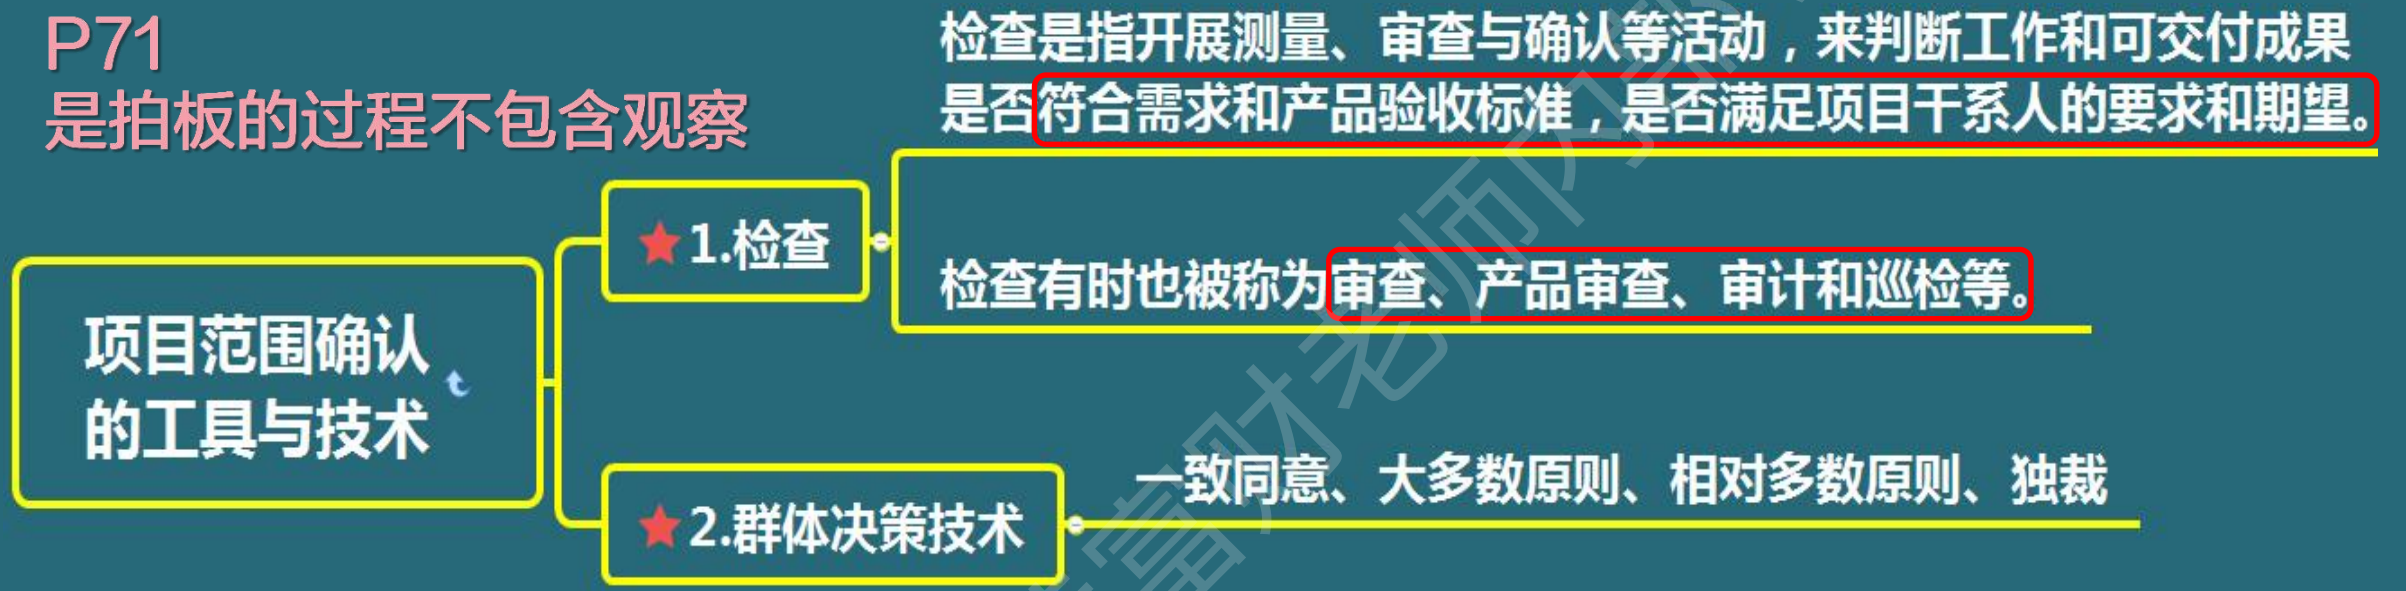


群体决策技术：
一致同意、大多数原则、相对多数原则、独裁

从管理角度来看，独裁好不好？

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习

第7章 项目范围确认

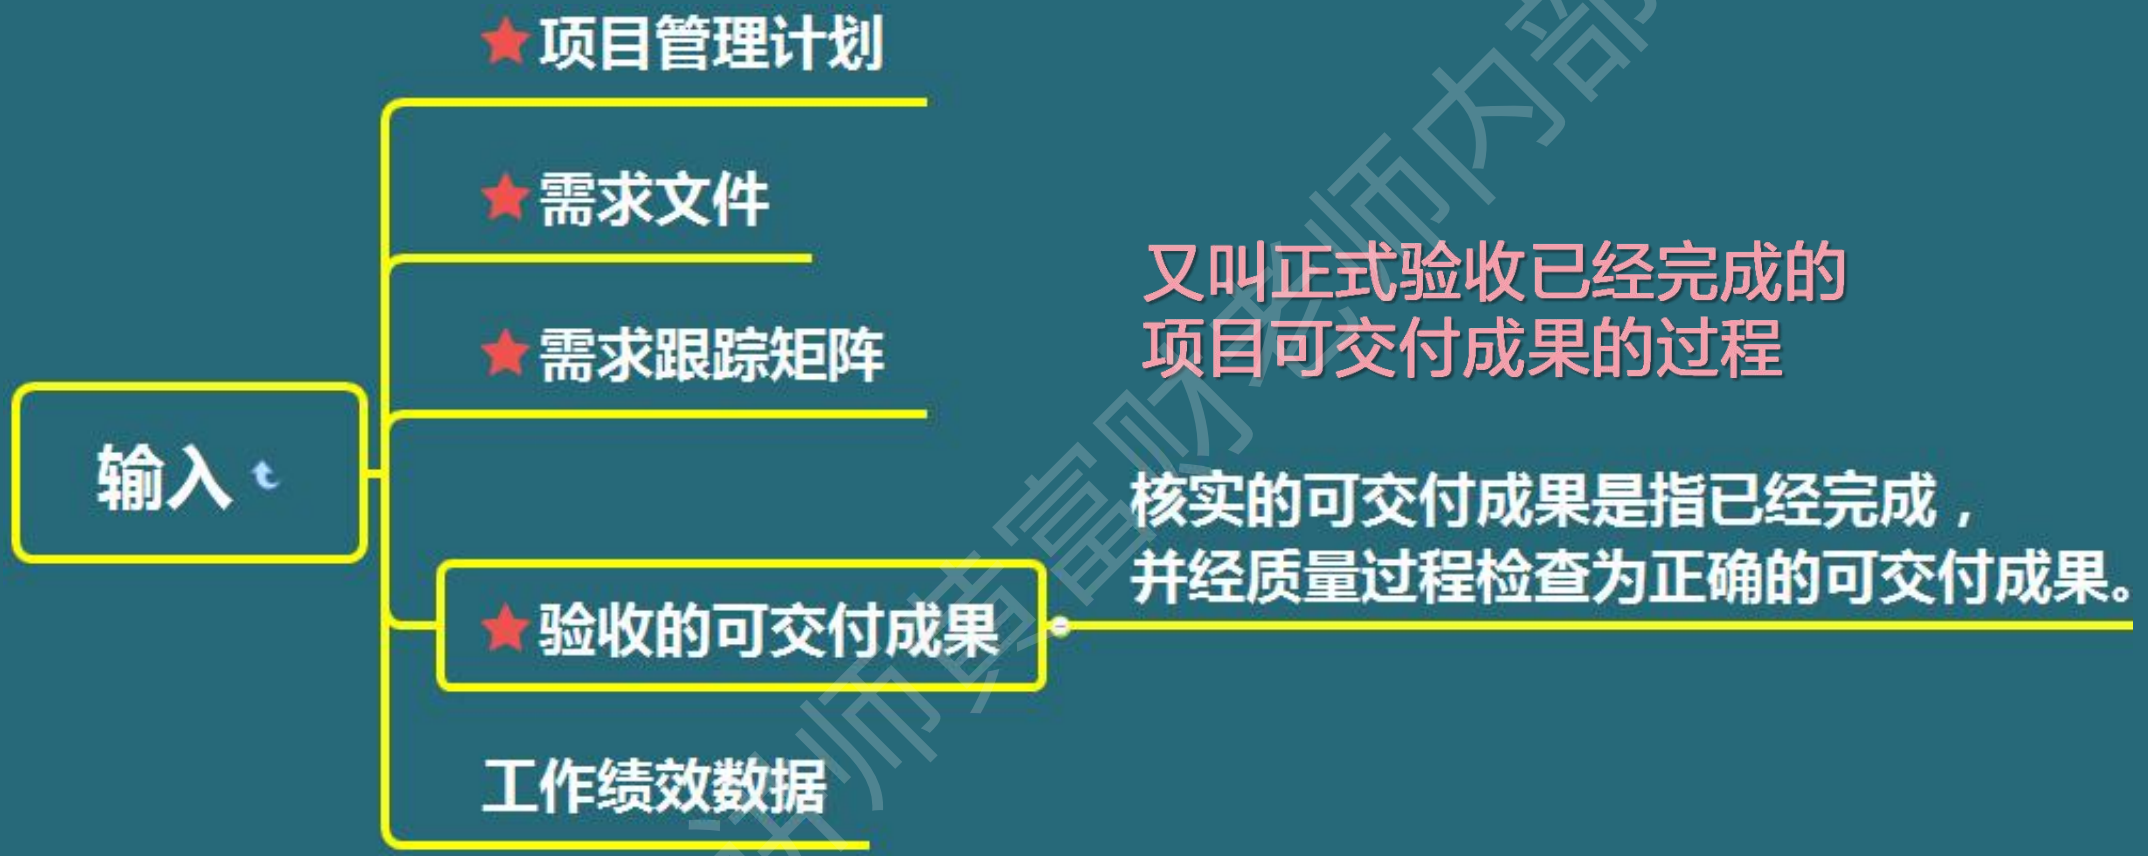

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习

第7章 项目范围控制

涉及的主要内容

1. 范围控制是监督项目和产品的范围状态，管理范围基准变更的过程。
2. 范围控制涉及到影响引起范围变更的因素，确保所有被请求的变更、推荐的纠正措施或预防措施按照项目整体变更控制处理，并在范围变更实际发生时进行管理。
3. 未经控制的产品或项目范围的扩大（未对时间、成本和资源做相应调整）被称为范围蔓延
4. 变更不可避免，因此在每个项目上，都必须以书面的形式记录并实施某种形式的变更控制管理。

顶级名师黄富财老师内部学习

第7章 项目范围控制

范围变更管理过程中常见的问题（了解）

口诀：慢步走

1.项目范围蔓延

2.得不到投资人的批准

（真正拥有权力的是投资人，不是客户，也不是项目经理）

3.项目小组未尽责任

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习

第7章 项目范围控制

控制范围（监控过程组） 监督项目和产品的范围状态，管理范围基准变更的过程		
输入	工具与技术	输出（控制输出五大件）
1. 项目管理计划 2. 需求跟踪矩阵 3. 需求文件 4. 工作绩效数据 5. 组织过程资产	1. 偏差分析	1. 工作绩效信息 2. 变更请求 3. 项目管理计划更新 4. 项目文件更新 5. 组织过程资产更新

1) 凡是监控输入　一定有计划、绩效
　凡是监控输出　一定有变更申请，绩效，有更新
2) 在整体监控项目输入是绩效信息，输出是绩效报告
　其他管理监控输入是绩效数据，输出是绩效信息

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习

第7章 范围管理补充内容

产品范围与项目范围

1. 产品范围是指产品或者服务所应该包含的功能
   项目范围是指为了能够交付产品，项目所必须做的工作。
2. 产品范围是项目范围的基础，产品范围的定义是产品要求的描述
   项目范围的定义是产生项目管理计划的基础
3. ★项目的范围基准是经过批准的项目范围说明书、WBS和WBS词典
4. 判断项目范围是否完成，要以范围基准来衡量。
   产品范围是否完成，根据产品是否满足了产品描述来判断。
5. 产品范围描述是项目范围说明书的重要组成部分，
   因此，产品范围变更后，首先受到影响的是项目的范围。

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习

第7章 练习题

1. 确认项目范围是验收项目可交付成果的过程，其中使用的方法是（　）。

A、检查和群体决策技术

B、验证和决策

C、检查和群体创新技术

D、验证和审查

答案：A

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习

第7章 练习题

2. 在范围定义的工具和技术中，（　）通过产品分解、系统分析、价值工程等技术理清产品范围，并把对产品的要求转化成项目的要求。

A、焦点小组
B、备选方案
C、产品分析
D、引导式研讨会

答案：C

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习

第7章 练习题

3. 项目的工作分解结构是管理项目范围的基础，描述了项目需要完成的工作，（　）是实施工作分解结构的依据。

A、项目活动估算

B、组织过程资产

C、详细的项目范围说明书

D、更新的项目管理计划

答案：C

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习

第7章 练习题

4. 以下关于项目范围和产品范围的叙述中，不正确的是（ ）。
A、项目范围是为了获得具有规定特性和功能的产品、服务和结果，而必须完成的项目工作
B、产品范围是表示产品、服务和结果的特性和功能
C、项目范围是否完成以产品要求作为衡量标准
D、项目的目标是项目范围管理计划编制的一个基本依据

答案：C

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习

第7章 练习题

5. 制定准确，详细的项目范围说明书是保证项目成功实施的关键，（　）一般不属于项目范围说明书的主要内容。

A、项目资源需求

B、项目目标

C、项目目的

D、项目交付成果清单

答案：A

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习

第7章 练习题

6.（　）不属于项目范围定义的输入。
A、项目范围管理计划
B、组织过程资产
C、项目工作分解结构WBS
D、项目章程和初步的范围说明书

答案：C

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习

第7章 练习题

7. 某项目经理在生成WBS时，按照（　）方法将项目分解为“需求分析、方案设计、实施准备、测试和验收”等几个过程。

A、子项目
B、工作任务
C、生命周期
D、可交付物

答案：C

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习

第7章 练习题

8. 王工是公司一个物联网网关开发项目的项目经理。他根据项目计划将其中的某个软件模块转包给了一个分包商。小李是分包商的新项目经理。王工应建议小李首先（　）。

A、遵照王工为项目制定的WBS

B、针对这个软件模块的开发工作编制一个分项目WBS

C、建立类似的编码结构，以便于应用公共项目管理信息系统

D、建立一个WBS词典来显示详细的人员分工

答案：B

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习

第7章 练习题

9. 项目范围的定义和管理过程将影响到整个项目是否成功。每个项目都必须慎重地权衡工具，数据来源，方法论，过程和程序以及其他一些因素，以确保在管理项目范围时所做的努力与项目的规模，复杂性和重要性相符。因此，项目经理应该重点关注（　）这个过程。

A、范围控制

B、范围变更

C、编制范围管理计划

D、范围确认

答案：C

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习

第7章 练习题

10、以下关于工作分解结构（WBS）的叙述中，不正确的是（　）。
A、WBS是制定进度计划，成本计划的基础
B、项目的全部工作都必须包含在WBS中
C、WBS的编制需要主要项目干系人的参与
D、WBS应采用自下而上的方式，逐层确定

答案：D

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习

第7章 练习题

11. 在项目范围确认时，经常会使用群体决策技术，在以下群体决策技术中（　）是根据群体中超过50%人员的意见作出决策。

A、一致同意原则

B、大多数原则

C、相对数原则

D、独裁原则

答案：B

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习

第7章 练习题

12. 关于工作分解结构（WBS）的描述，不正确的是（ ）。
A、一般来说WBS的应控制在3-6层为宜
B、WBS是项目时间、成本、人力等管理工作的基础
C、WBS必须且只能包括整个项目100%的工作内容
D、WBS的制定由项目主要干系人完成

答案：D

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习

第7章 练习题

13. 项目经理组织所有团队成员对三个技术方案进行投票：团队成员中的45%方案甲；35%选择方案乙20%选择方案丙，因此，方案甲被采纳。该项目采用的群体决策方法是（　）。

A、一致同意
B、大多数原则
C、相对多数原则
D、独裁

答案：C

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习

感谢您的聆听!

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习
