2023年11月软考课程



系统集成项目管理工程师

辅导班课程　主讲老师：黄富财老师

顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

2023年11月软考课程



第五批-计算题
2023年 下半年 系统集成项目管理工程师


顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

11月4号上午卷—计算题

序号	活动名称	紧前活动	工期(月）	预算（万元）
1	A	-	1	20
2	B	A	2	40
3	C	A	5	30
4	D	B	1	40
5	E	CD	1	80
6	F	E	2	30
7	G	D	4	20
8	H	FG	3	40
9	I	F	1	30
10	J	HI	2	40

顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

11月4号上午卷—计算题

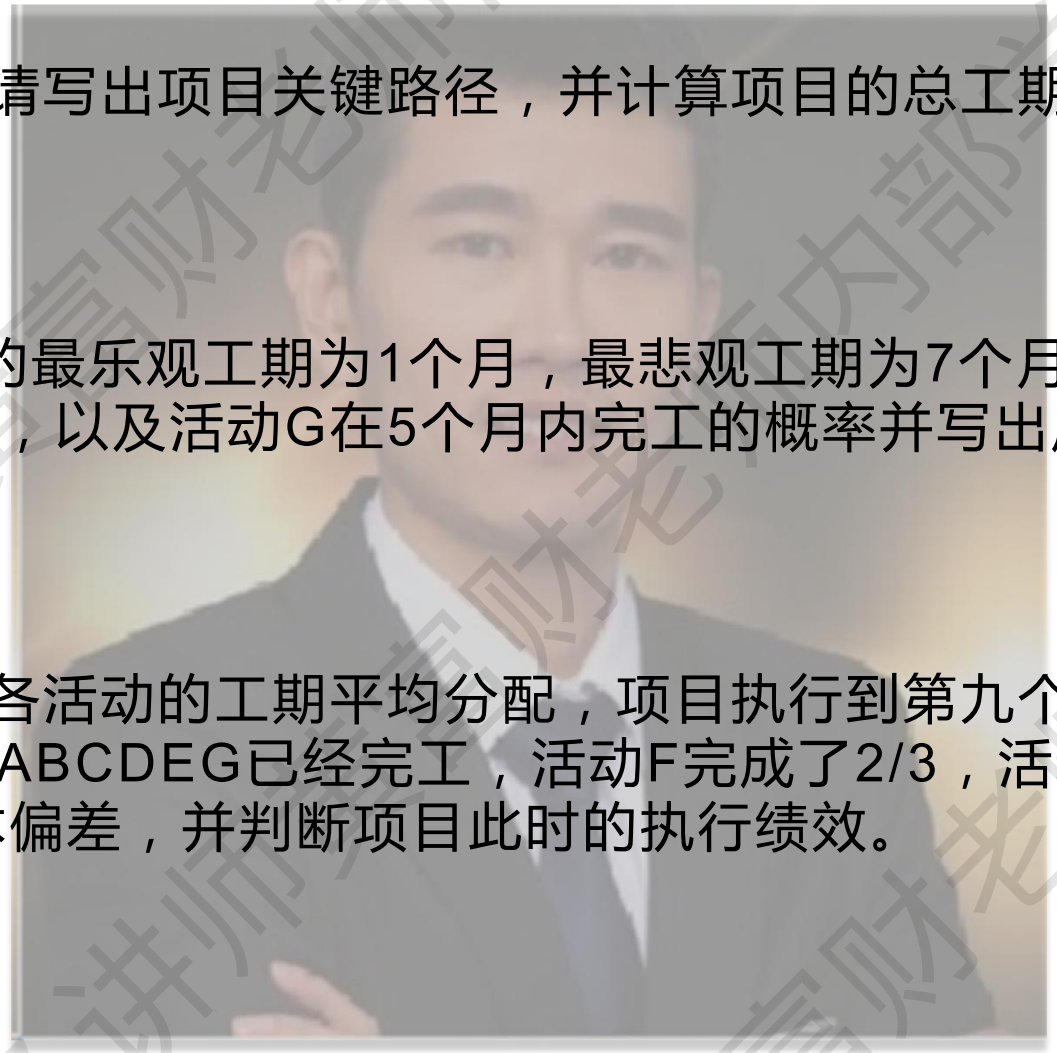

【问题1】结合案例，请写出项目关键路径，并计算项目的总工期。


【问题2】假设活动G的最乐观工期为1个月，最悲观工期为7个月，最可能工期为4个月。请计算活动G的标准差，以及活动G在5个月内完工的概率并写出原因。

【问题3】假设预算按各活动的工期平均分配，项目执行到第九个月结束时项目的实际已发生金额为280万，活动ABCDEG已经完工，活动F完成了2/3，活动HIJ尚未开工。请计算项目的进度偏差和成本偏差，并判断项目此时的执行绩效。

顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

11月4号上午卷—计算题


【问题1】

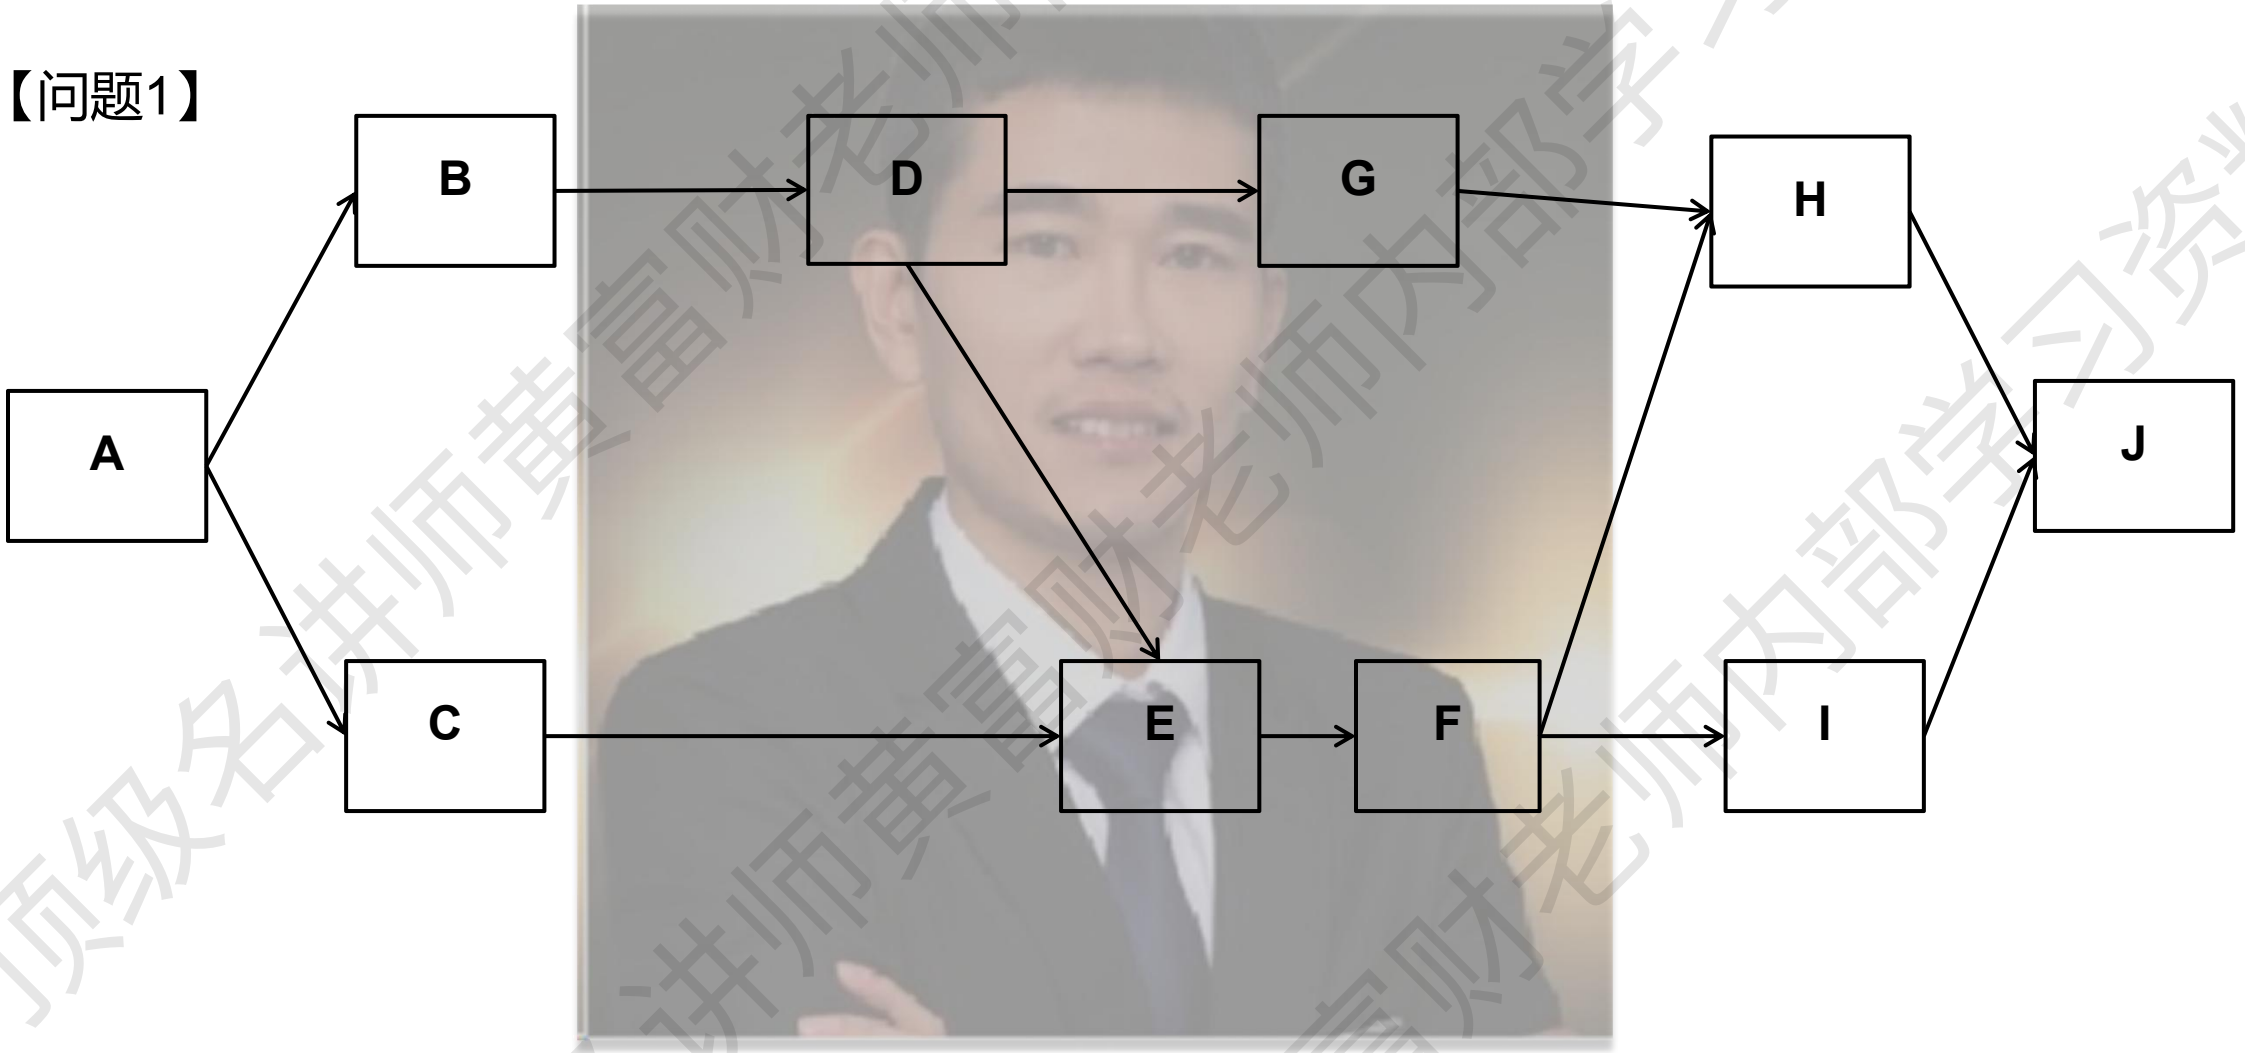

顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

11月4号上午卷—计算题

【问题1】

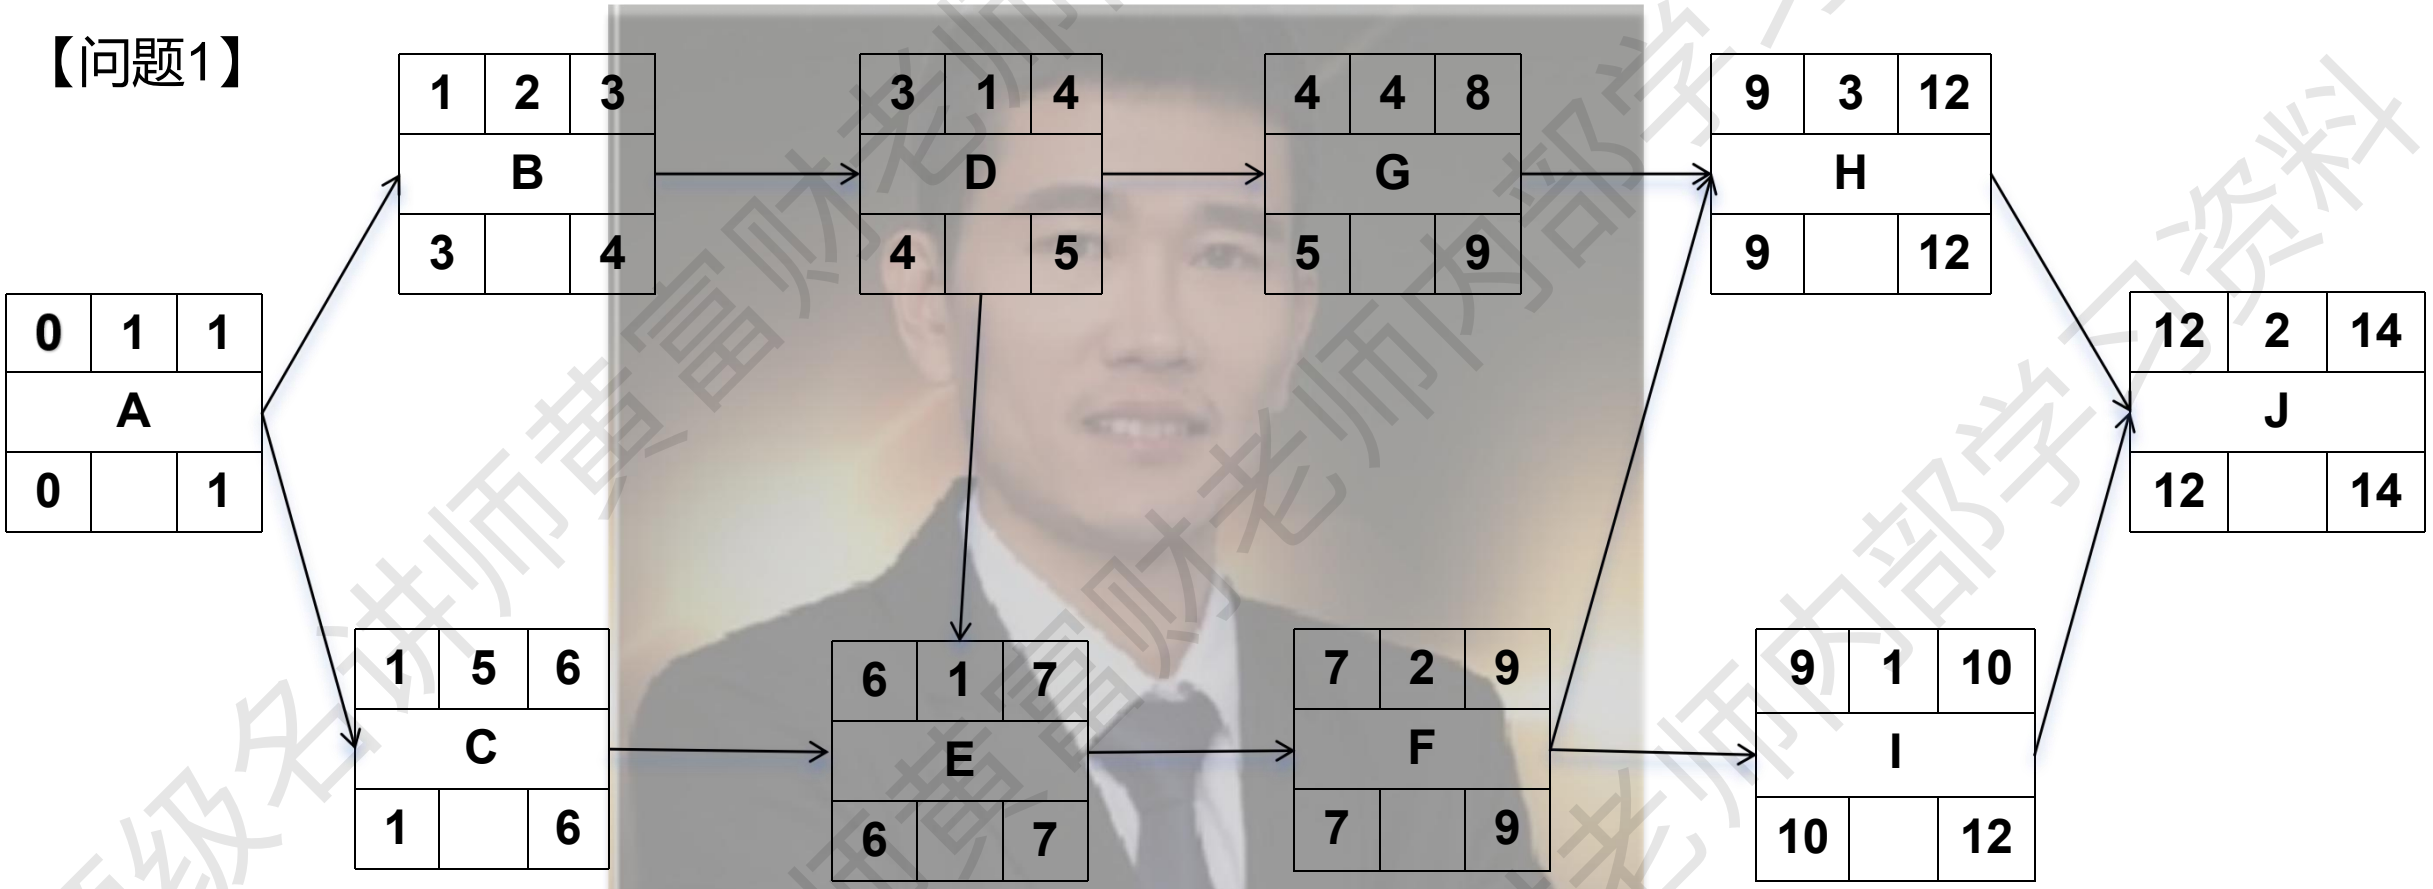

顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

11月4号上午卷—计算题

【问题1】关键路径为：ACEFHJ　　总工期：14月


【问题2】G的标准差=（7-1）/6=1

根据G活动的工期是4个月，标准差是1个月。

结合正态分布图可知，正负一个标准差是68.3%

所以在5个月内完成的概率是：

50%+（68.3%）/2= 84.15%

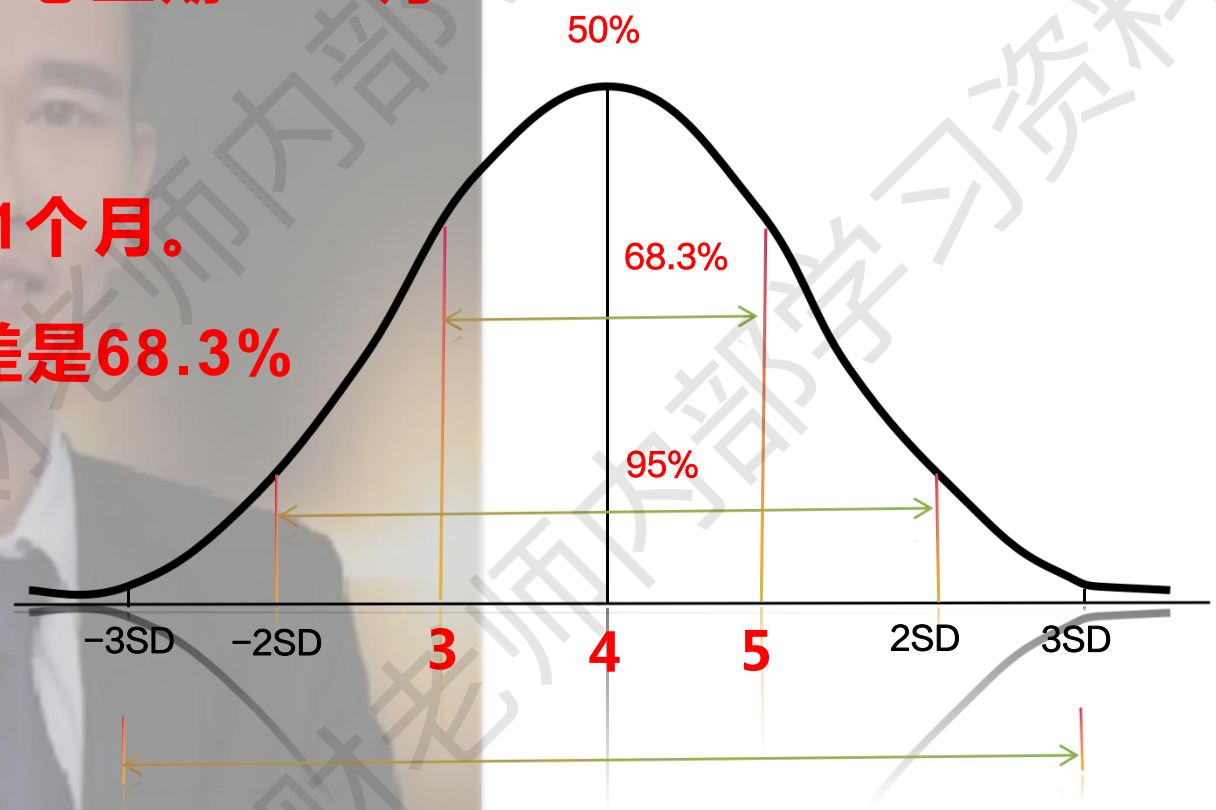

顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

11月4号上午卷—计算题



【问题3】

第九个月时：

AC=280（万元）

PV=A+B+C+D+E+F+G=20+40+30+40+80+30+20=260（万元）

EV=A+B+C+D+E+2/3F+G=20+40+30+40+80+2/3*30+20=250（万元）

SV=EV-PV=250-260=-10，SV<0进度落后

CV=EV-AC=250-280=-30，CV<0成本超支

顶级名讲师黄富财老师内部学习资料
