2023年11月软考课程



系统集成项目管理工程师

辅导班课程　主讲老师：黄富财老师

每天前进一小步，会让你的人生上升不止一大步

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

项目整体管理—1.

- 整体变更控制的工具与技术不包括（　）。（19年5月第42题）
- A、专家判断　　B、实验设计　　C、会议　　D、配置管理工具

【答案】B
【解析】实验设计是质量管理的工具，整体变更控制的工具与技术包括：1.专家判断2.会议3.变更控制工具

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

项目整体管理—2.

- （　）不是制定项目章程的输入。（19年11月第34题）
- A、项目工作说明书　　B、商业论证
- C、合同或谅解备忘录等协议　　D、项目成功标准

【答案】D
【解析】项目成功标准这个是项目章程的内容，项目章程的输入：1.项目工作说明书2.商业论证3.协议4.事业环境因素5.组织过程资产

广东顶级名师黄富财老师内部学习资料

项目整体管理—3.

- 指导与管理项目工作过程的输出不包括（　）。（19年5月第40题）
- A、工作绩效数据　　B、批准的变更请求
- C、项目管理计划更新　　D、项目文件更新

【答案】B
【解析】批准的变更请求，它是实施整体变更控制的输出，作为指导与管理项目执行的输入。
指导与管理项目工作的输出：
1.工作绩效数据2.可交付成果
3.变更请求4.项目管理计划的更新5.项目文件更新

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

项目整体管理—4.

- （　）不属于指导与管理项目工作的输出。（19年11月第36题）
- A、批准的变更请求　　B、工作绩效数据
- C、可交付成果　　D、项目管理计划更新

【答案】A
【解析】批准的变更请求，它是实施整体变更控制的输出，作为指导与管理项目执行的输入。
指导与管理项目工作的输出：
1.工作绩效数据　　2.可交付成果
3.变更请求　　4.项目管理计划的更新　　5.项目文件更新

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

项目整体管理—5.

- 项目管理计划的输入不包括（　）。（22年5月第35题）
- A、项目章程　　B、其它规划过程的输出
- C、工作绩效　　D、组织过程资产

【答案】C
【解析】计划都还没有做，哪来的绩效，项目管理计划的输入有：
1.项目章程2.其他规划过程的输出3.组织过程资产4.事业环境因素

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

项目整体管理—6.

- 指导与管理项目工作过程的输出包括（　）。（22年5月第36题）
- ①可交付成果　②工作绩效数据　③批准的变更请求 ④项目文件更新
- A、①③④　B、①②④　C、②③④　D、①②③

【答案】B
【解析】批准的变更请求是其输入（它是实施整体变更控制的输出，作为指导与管理项目执行的输入。指导与管理项目工作输出有：1.工作绩效数据2.可交付成果3.变更请求4.项目管理计划的更新5.项目文件更新

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

项目整体管理—7.

- 不属于“整体变更控制”过程输出的是：（　）。（22年05月36题全国）
- ①工作绩效报告　②项目质量管理计划　　③变更请求
- ④变更日志　　⑤项目进度网络图更新
- A、①②③　　B、②③④　C、③④⑤　D、①③⑤

【答案】A
【解析】工作绩效报告，项目质量管理计划和变更请求均是整体变更控制的输入。整体变更控制过程输出有：1.批准的变更请求2.变更日志3.项目管理计划更新4.项目文件更新

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

项目整体管理—8.

- （　）不属于制定项目管理计划的输入。(22年11月35题）
- A、人事管理制度　　B、成本管理计划
- C、经验教训知识库　　D、风险应对计划

【答案】D
【解析】风险应对计划，是风险管理中规划风险应对的输出。项目管理计划的输入有：1.项目章程2.其他过程的输出结果(子计划)（包括九大管理计划+进度基准+成本基准+范围基准）3.事业环境因素（人事管理制度属于事业环境因素）4.组织过程资产（经验教训知识库属于组织过程资产）

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

项目整体管理—9.

- 制定项目章程不需要参照（　）（22年11月34题全国）
- A、项目说明书　B、项目里程碑　C、商业论证　D、战略计划

【答案】B
【解析】项目里程碑是在进度管理中定义活动的输出。制定项目章程的输入有：1.项目工作说明书（业务需求、产品范围说明书、战略计划）2.商业论证3.协议4.事业环境因素5.组织过程资产

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

项目整体管理—10.

- 项目行政收尾产生的结果不包括（　）。（21年5月）
- A、完整的项目档案　　B、项目管理计划
- C、资源释放　　D、经验教训总结

【答案】B
【解析】项目管理计划是结束项目或阶段的输入。项目行政收尾产生的输出（结果）包括：1.对项目产品的正式接受2.完整的项目档案3.组织过程资产更新（经验教训总结）4.资源释放（包括人力和非人力资源）

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

项目整体管理—11.

- 项目收尾管理的过程中的输入项不包括（　）。（15年11月）
- A、项目管理计划　　B、合同文件
- C、组织过程资产　　D、验收标准

【答案】D
【解析】验收标准是在定义范围中的输出了范围说明书中明确的验收标准。项目收尾时，是用验收的可交付成果来进行收尾的。结束项目或阶段的输入有：1.项目管理计划2.组织过程资产3.验收的可交付成果4.合同文件也是项目收尾管理过程的输入。因为项目验收是项目收尾管理中的首要环节，在系统集成项目进行验收时，需要根据项目前期所签署的合同内容以及技术工作的内容，以及在执行过程中发生了合同变更的，作为验收测试的主要依据。

项目整体管理—12

- 不属于制订项目管理计划的输入（　）。（23年05月）
- A、测试与评估文件　　B、成本管理计划
- C、组织过程资产　　D、范围基准

【答案】A
【解析】讲得不包含具体的工作内容，测试文件是计划完成之后，按计划制作的一个文件
项目管理计划与其子计划互为输入
事业环境因素和组织过程资产是老妖精，哪里的输入都有它

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

项目整体管理—13

- 不属于监控项目工作的输入（　）。（23年05月）
- A、项目管理计划　　B、确认的变更
- C、成本预测　　D、工作绩效报告

【答案】D
【解析】工作绩效报告 是监控工作的输出

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

项目整体管理—14

- 不属于整体变更控制的工具和技术（　）。（23年05月）
- A、会议　　B、专家判断
- C、资源日历　　D、数据分析

【答案】C
【解析】整体变更控制 做的是拍板工作

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

项目整体管理—15

- 不属于整体变更控制的工具和技术（　）。（23年05月）
- A、会议　　B、专家判断
- C、资源日历　　D、数据分析

【答案】C
【解析】整体变更控制 做的是拍板工作

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

项目整体管理—16

- （ ）是确定两种或两种以上变数间相互依赖的定量关系的一种统计分析方法。（23年05月）
- A、文件分析　　B、回归分析
- C、趋势分析　　D、偏差分析

【答案】B
【解析】事情发生之后，回过头来，看看被哪些因素影响，这些因素有什么关系，这是一种定量分析的方法，也使用到了统计。

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

范围管理—1.

- （　）是在确认范围过程中使用的工具与技术。（19年5月第44题）
- A、群体决策　　B、网络图　C、控制图表　　D、关键路径法

【答案】A
【解析】确认范围的工具有检查和群体决策技术。另外群体决策技术有：一致同意、大多数原则、相对多数原则、独裁。如果题目只给出这4种具体的技术也可以选上。

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

范围管理—2.

- （　）可用来确定可交付成果是否符合需求和验收标准(20年11月第41题）
- 　　A、投票　　B、观察　　C、检查　　D、访谈

【答案】C
【解析】确认范围的工具有检查和群体决策技术。另外群体决策技术有：一致同意，大多数原则，相对多数原则，独裁。如果题目只给出这4种具体的技术也可以选上。

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

范围管理—3.

- 详细的项目范围说明书是指导项目成功实施的关键文件。

(　)不应该属于范围定义的输入。（15年5月第40题）

- A.项目章程　　B.项目范围管理计划
- C.批准的变更申请　　D.项目合同文本

【答案】D

【解析】项目合同文本包含合同、协议，属于制定项目章程的输入。范围定义的输入有：1.项目章程2.范围管理计划3.需求文件4.组织过程资产。批准的变更申请，新增的内容会扩大范围，所以也是定义范围的输入。

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

范围管理—4.

- 在项目验收过程中，不宜采用（　）方法确定可交付成果是否符合需求和验收标准。（22年5月第41题）
- 群体决策技术　B、检查　C、观察　D、独裁

【答案】C
【解析】确定可交付成果是否符合需求和验收标准。这个是属于确认范围过程。确认范围的工具有：检查和群体决策技术。群体决策技术有：一致同意，大多数原则，相对多数原则，独裁。所以群体决策技术中的检查也属于确认范围的工具。

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

范围管理—5.

- （　）属于项目范围控制使用的工具与技术。（22年5月第42题）
- A、偏差分析　　B、实验设计　　C、敏感性分析　　D、回归分析

【答案】A
【解析】项目范围控制的工具是偏差分析。实验设计是质量管理中规划质量的工具。敏感性分析是风险管理中定量风险分析的工具。回归分析是项目整体管理中的监控项目工作和结束项目或阶段的工具。

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

范围管理—6.

- 编写范围管理计划和细化项目范围会分析一些信息，这些信息不包括（　）。（22年05月38题全国）
- A、项目章程　　B、项目管理计划中已批准的子计划
- C、项目范围说明书　　D、采购管理制度

【答案】C
【解析】项目范围说明书，是定义范围的输出。细化项目范围，这个是属于定义范围过程。所以题目中问的是规划范围管理和定义范围的输入不包括的，规划范围管理的输入有：1.项目章程2.项目管理计划3.事业环境因素（采购管理制度属于事业环境因素）4.组织过程资产。定义范围的输入有：1.项目章程2.范围管理计划3.需求文件4.组织过程资产

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

范围管理—7.

- 项目范围确认后应（　）。（22年05月41题全国）
- A、确定项目基准　　B、明确项目验收标准
- C、记录项目绩效信息　　D、更新项目目标

【答案】C

【解析】这题就是考项目范围确认的输出的理解。选项A：确定项目基准是创建WBS的输出范围基准。选项B：明确项目验收标准是定义范围的输出项目范围说明书。选项D：项目目标是属于项目范围说明书里的内容，更新项目目标，是指有变更了，走了变更控制流程后，更新了范围说明书。所以D这个是属于控制范围的输出（范围基准更新）。项目范围确认输出有：1.变更请求2.验收的可交付成果3.工作绩效信息（工作绩效信息包括项目进展信息，例如，哪些可交付成果已经开始实施，它们的进展如何，哪些可交付成果已经完成，或者哪些已经被验收。这些信息应该被记录下来并传递给干系人）4.项目文件更新

范围管理—8.

- 在控制项目范围时，不需要用到（　）。（22年05月42题全国）
- A、工作绩效报告　　B、需求管理计划
- C、WBS词典　　D、配置管理计划

【答案】A
【解析】有控制，输入输出必定有工作绩效，除了整体管理的监控项目工作是输入工作绩效信息（从其它各控制过程中收集整理得到的数据转化），输出是工作绩效报告。其余子过程的控制过程输入都是工作绩效数据，输出工作绩效信息。所以这题输入不需要用到工作绩效报告。控制项目范围的输入有：1.工作绩效数据2.需求跟踪矩阵3.需求文件4.项目管理计划（这里项目管理计划以下信息用于控制范围：需求管理计划、配置管理计划和范围管理计划、变更管理计划、范围基准，其中范围基准包含WBS词典）5.组织过程资产

范围管理—9.

- 项目范围确认的依据不包括（　）。（22年11月40题）
- A、需求文件　　B、需求跟踪矩阵
- C、工作绩效数据　　D、验收的可交付成果

【答案】D
【解析】范围确认是正式验收已完成可交付成果的过程，所以验收的可交付成果是范围确认的输出。项目范围确认的输入有：1.需求文件2.项目管理计划3.需求跟踪矩阵4.工作绩效数据5.核实的可交付成果

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

范围管理—10.

- 不属于范围确认的工作内容（　）。（23年05月）
- A、组织客户进行项目交付签字　　B、由第三方监理机构出具检验报告
  C、确定范围正式被接受的标准　　D、审查变更请求，以进行缺陷补救

【答案】D 这是范围控制的工作

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

进度管理—1.

- （　）属于规划项目进度过程的输出。(18年5月第46题)
- A、项目管理计划　　B、项目章程
- C、事业环境因素　　D、控制临界值

【答案】D
【解析】项目管理计划和项目章程，事业环境因素是规划进度管理的输入。规划进度管理的输出项目进度管理计划。控制临界值属于项目进度管理计划的内容，所以是规划进度管理的输出成果。项目进度管理计划的内容有：1.控制临界值2.过程描述说明3.组织程序链接4.报告格式5.准确度（精确度，精确等级）6.计量单位（测量单位）7.绩效测量规则（挣值规则）8.项目进度模型制定9.项目进度模型维护10.其他细节

进度管理—2.

- “定义活动”过程的输出不包括（　）。（21年11月第43题）
- A、活动清单　　B、范围基准　　C、里程碑清单　　D、活动属性

【答案】B
【解析】范围基准是在范围管理的创建WBS的输出。“定义活动”过程的输出有：1.活动清单2.活动属性3.里程碑清单

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

进度管理—3.

- 规划项目进度管理是为实施项目进度管理制定政策、程序。并形成文档化的项目进度管理计划的过程，（　）不属于规划项目进度管理的输入。

（18年11月第46题）

- A、项目章程　　B、范围基准
- C、里程碑清单　D、组织文化

【答案】C

【解析】做了计划后定义活动才有里程碑清单（计划都没有做哪来的）。规划项目进度管理的输入有：1.项目章程（项目章程中规定的总体里程碑进度计划和项目审批要求，都会影响项目的进度管理）2.项目管理计划（（项目管理计划中的范围基准、进度基准、成本基准等其他信息）3.事业环境因素4.组织过程资产

进度管理—4.

- 活动排序是指识别与记载计划活动之间的逻辑关系，项目经理对所管理的项目进行活动排序。（　）是在活动排序过程中所需要的信息和资料。（15年11月第55题）
- A、项目进度网络图　　B、请求的变更
- C、项目范围说明书　　D、更新的活动清单

【答案】C

【解析】所需要的信息和资料，这个的意思是用到什么依据。考点是输入。A、项目进度网络图是制定进度计划的输出。B、变更请求是实施整体变更控制的输入。C、项目范围说明书中包含有范围描述、假设条件和制约因素，可交付成果等都有可能影响活动的排序。需要审查以确保准确性。D、更新的活动清单是属于项目文件的更新内容

进度管理—5.

- （　）不是规划项目进度管理的输入。（17年11月第46题）
- A、项目范围说明书　　B、WBS和WBS字典
- C、活动清单　　D、项目章程

【答案】C
【解析】做了计划后定义活动才有活动清单（计划都没有做哪来的）。规划项目进度管理的输入有：1.项目章程（项目章程中规定的总体里程碑进度计划和项目审批要求，都会影响项目的进度管理）2.项目管理计划（（项目管理计划中的范围基准、进度基准、成本基准等其他信息）3.事业环境因素4.组织过程资产

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

进度管理—6.

- （　）不属于编制进度计划所采用的工具和技术。（16年5月第52题）
- A、进度网络分析　　B、确定依赖关系
- C、进度压缩　　D、资源平衡

【答案】B

【解析】确定依赖关系是排列活动顺序中的（排列活动才有依赖关系）。进度计划的工具有：三进两关资建提（进度压缩，进度计划编制工具，进度网络分析，关键链法，关键路径法，资源优化技术，建模技术，提前量与滞后量）

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

进度管理—7.

- （　）不属于规划项目进度管理的输入。（22年5月第43题）
- A、里程碑清单　　B、范围基准
- C、事业环境因素　　D、组织过程资产

【答案】A
【解析】做了计划后定义活动才有里程碑清单（计划都没有做哪来的）。规划项目进度管理的输入有：1.项目章程（项目章程中规定的总体里程碑进度计划和项目审批要求，都会影响项目的进度管理）2.项目管理计划（项目管理计划中的范围基准、进度基准、成本基准等其他信息）3.事业环境因素4.组织过程资产

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

进度管理—8.

- 控制项目进度时常用的技术不包括（　）。（22年05月46题全国）
- A、趋势分析　　B、关键链法　　C、统计抽样　　D、绩效测量

【答案】C
【解析】统计抽样是指从目标总体中选取部分样本用于检查，抽样的频率和规模应在规划质量管理过程中确定。以便在质量成本中考虑测试数量和预期废料等。（统计抽样是质量管理中规划质量管理和质量控制的工具）。控制项目进度的工具有：1.资源优化技术2.建模技术3.绩效审查（趋势分析，关键路径法，关键链法，挣值管理）4.提前量与滞后量5.进度压缩6.进度计划编制工具7.项目管理软件

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

进度管理—9.

- 不能作为控制进度过程的输入（　）。（23年05月）
- A、开发工作日报　　B、项目预算分析表
- C、人力资源需求表　　D、项目进度预测

【答案】D
【解析】属于输出

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

成本管理—1.

- 制定成本管理计划的依据不包括（　）。（21年11月第48题）
- A、范围基准　　B、进度基准　　C、项目章程　　D、挣值规则

【答案】D
【解析】挣值规则是挣值管理EVM，是用于绩效测量的方法，是属于进度管理计划和成本管理计划的内容，也属于进度和成本控制的工具。制定成本管理计划的依据输入有：1.项目章程（项目章程中规定了项目的总体预算和项目审批要求，都会影响项目的成本管理2.项目管理计划（项目管理计划中的范围基准、进度基准、成本基准等其他信息）3.事业环境因素4.组织过程资产

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

质量管理—1.

- 在质量控制过程中，经常会使用一些工具和方法。（1）是一种基于80/20原理，用于找出影响项目产品或服务质量的主要因素的方法。（2）不属于质量控制活动。（16年5月第68-69题）
- A、流程图　　B、帕累托图　　C、控制图　D、鱼骨图

【答案】B
【解析】帕累托图又叫排列图，是一种特殊的垂直条形图，用于识别造成大多数问题的少数重要原因。也是一种基于80/20原则，用于找出影响项目产品或服务质量的主要因素的方法。

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

质量管理—1.

- 在质量控制过程中，经常会使用一些工具和方法。（1）是一种基于80/20原理，用于找出影响项目产品或服务质量的主要因素的方法。（2）不属于质量控制活动。（16年5月第68-69题）
- A、产品测试　　B、抽样
- C、对不合格进行原因分析　　D、过程分析(过程是保证）

【答案】D
【解析】过程分析是质量保证过程的工具。质量控制活动的工具有：（审查样机）1.老七工具（因果图、流程图、核查表、排列图（帕累托图）、直方图、控制图、散点图）2.新七工具（亲和图、过程决策程序图PDPC、关联图、树状图、优先矩阵图、活动网络图、矩阵图）3.统计抽样4.检查5.审查已批准的变更请求

质量管理—2.

- （　）属于质量管理中规划质量过程的工具和技术。（17年11月第64题）
- A、成本效益分析法　　B、质量审计（质量保证）
- C、控制图　　D、甘特图（进度）

【答案】A
【解析】此题答案是A、C均可，但是建议选A更好，因为高级教材中，成本效益分析法是规划质量管理的工具。老七是属于质量保证的工具。规划质量管理过程的工具有：1.成本效益分析法2.标杆对照3.质量成本法4.其他质量管理工具（头脑风暴、名义小组、力场分析）5.实验设计6.会议7.老七种基本质量工具（流程图、因果图、直方图、散点图、帕累托图（排列图）、控制图、核查表）8.统计抽样

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

质量管理—3.


- （　）属于规划质量管理的输出。（18年11月第65题）
- A、项目管理计划　　B、需求文件
- C、风险登记册　　D、质量核对单

【答案】D
【解析】ABC均是规划质量管理的输入。规划质量管理的输出有：1.质量管理计划2.过程改进计划(发现增值活动）3.质量测量指标4.质量核对单5.项目文件更新

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

质量管理—4.

- 下图对应的质量控制工具和技术是（ ）。（22年5月第64题）
- A、直方图　　B、控制图　　C、散点图　　D、亲和图

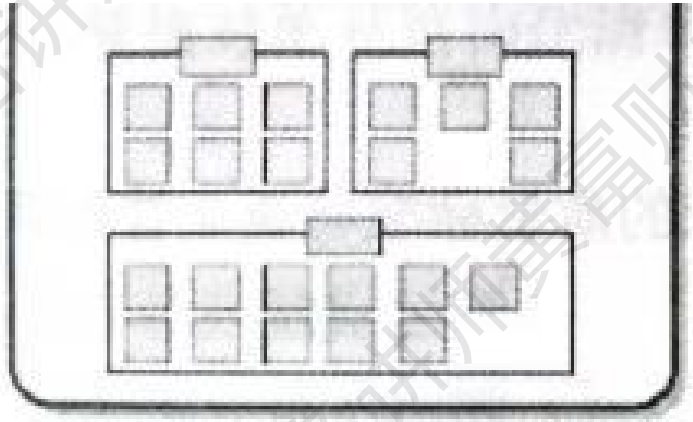

【答案】D
【解析】多看几次老七新七质量工具示意图。

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

质量管理—5.

- （ ）是规划质量管理的工具。（22年11月62题）
- A、质量审计　　B、优先矩阵　　C、过程分析　　D、标杆对照

【答案】D
【解析】质量审计和过程分析是质量保证的工具。而优先矩阵可同时用于质量保证和质量控制的工具。规划质量管理的工具有：小鸡成标杆，它会识统计。小——成本效益分析，鸡——老七种基本质量工具（流程图，因果图，直方图，散点图，帕累托图，控制图，核查表），成——质量成本，标杆——标杆对照，它——其他质量规划工具（头脑风暴、名义小组技术、力场分析），会——会议，识——实验设计，统计——统计抽样

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

质量管理—6.

- 不是质量控制的输出（ ）（22年11月63题全国）
- A.质量控制测量结果　　B.核实的可交付成果
- C.批准的变更请求　　D.工作绩效信息

【答案】C
【解析】批准的变更请求，是项目整体管理中实施整体变更控制的输出。质量控制的输出有：（确认两果+控制输出5大件）1.确认的变更2.质量控制测量结果3.核实的可交付成果4.工作绩效信息5.变更请求6.项目管理计划更新7.项目文件更新8.组织过程资产更新

广东顶级名师讲师黄富财老师内部学习资料

质量管理—7.

- 质量管理过程用到的工具技术中，（)用于规划质量管理过程（23年5月）
- A、质量审计　B、统计抽样　C、核查表　D、质量成本

【答案】D
有点超纲，高级里面，只有质量成本是规划 质量管理的过程的工具

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

质量管理—8.

- 不属于项目质量测量指标的是( )。（23年5月）
- A、市场占有率B、准时性C、可用性D、缺陷率

【答案】A

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

质量管理—8.

- （ ）不属于质量控制的输出。（23年5月）
- A、确认的变更　B、变更请求　C、风险登记册　D、质量标准。

【答案】C

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

人力资源管理—1.

- 编制人力资源管理计划的工具与技术不包括（ ）。（21年11月第51题）
- A、人际交往　　B、组织理论
- C、自制分配矩阵　　D、认可与奖励

【答案】D
【解析】认可与奖励这个是建设团队才用得着的工具。人力资源管理计划的工具有：1.专家判断2.组织理论3.会议4.组织图和职位描述5.人际交往

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

人力资源管理—2.

- 项目团队建设的内容一般不包括（　）。（15年11月第50题）
- A、培训　　B、认可和奖励　　C、职责分配　　D、同地办公

【答案】C
【解析】职责分配这个是规划时就要分配好的了谁做什么，项目团队建设的内容工具有：公认人人赔活鸡，公——集中办公、认——认可与奖励、人——人际关系技能、人——人事测评工具、赔——培训、活——团队建设活动、鸡——基本规则

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

人力资源管理—3.

- （　）不属于编制人力资源计划的工具与技术。（15年5月第48题）
- A、OBS　B、RAM　C、RBS　D、SWOT

【答案】D
【解析】SWOT是风险管理中识别风险的工具，人力资源计划的工具有：1.专家判断2.组织理论3.会议4.组织图和职位描述（包含层次结构图的WBS、OBS、RBS和矩阵图的RAM）5.人际交往（OBS：组织分解结构，RAM：责任分配矩阵，RBS：资源分解结构，SWOT：优势劣势分析）

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

人力资源管理—4.

- （　）不是获取项目人力资源的依据。（21年5月第50题）
- A、项目人力资源管理计划　　B、组织结构
- C、人员配备管理计划　　D、资源日历

【答案】D
【解析】获取项目人力资源这个是组建项目团队，所以题目问的是组建项目团队的输入。资源日历、项目人员分派和项目管理计划更新是组建项目团队的输出。组建项目团队的输入有：1.人力资源管理计划(包括项目组织结构图、角色和职责和人员配备管理计划）2.事业环境因素3.组织过程资产

广东顶级名师讲师黄富财老师内部学习资料

人力资源管理—5.

- （　）不属于组建项目团队的成果。（22年05月52题全国）
- A、项目人员分配表　　B、资源日历
- C、项目管理计划更新　D、人员配备管理计划

【答案】D
【解析】人员配备管理计划是规划人力资源的输出（成果），人力资源管理计划中的内容有：项目的组织结构图、角色和职责的分配和人员配备管理计划。组建项目团队输出有：1.资源日历2.项目人员分派3.项目管理计划更新

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

沟通管理—1.

- 以下（　）不是控制沟通的技术和方法。（17年11月第55题）
- A、业务数据分析　　B、项目例会
- C、信息管理系统　　D、专家判断

【答案】A
【解析】绩效报告。分析现状，进展以及预测结果的汇报绩效工作。业务数据分析只相当于绩效报告工作的一个组成部分。管理沟通用的，控制沟通的工具有：专家判断、信息管理系统、会议（项目的例会、项目启动会议、项目总结会）

广东顶级名师讲师黄富财老师内部学习资料

沟通管理—2.

- “管理沟通”过程的输入不包括（　）。（21年5月第54题）
- A、项目沟通管理计划　B、更新的成本状态
- C、组织文化　　D、工作绩效报告

【答案】B
【解析】更新的成本状态（这个属于管理沟通的输出中项目文件的更新内容，注意一般“更新的....”是作为过程的输出存在。）管理沟通的输入有：1.沟通管理计划2.工作绩效报告3.事业环境因素4.组织过程资产

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

干系人管理—1.

- （　）不属于识别项目干系人的输入。（21年5月第55题）
- A、项目章程　　B、采购文件
- C、干系人记录模板　　D、沟通管理模型

【答案】D
【解析】沟通管理模型是管理沟通过程的工具。识别项目干系人的输入有：1.事业环境因素2.组织过程资产（干系人记录模板属于组织过程资产）3.采购文件4.项目章程

广东顶级名师黄富财老师内部学习资料

风险管理—1.

- 规划风险应针对项目目标，制定提高机会，降低危险的方案和措施的过程。（ ）不是规划风险应对的工具与技术。（16年11月第63题）
- A、应急应对策略　　B、概率和影响矩阵
- C、专家判断　　D、消极风险或威胁的应对策略

【答案】B
【解析】概率和影响矩阵（定性风险分析排序用的工具）。规划风险应对的工具有：1.专家判断2.消极风险或威胁的应对策略（回避、转移、减轻）3.积极风险或机会的应对策略（开拓、分享、提高）4.应急应对策略

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

风险管理—2.

- 控制风险是在整个项目中实施风险应对计划，跟踪已识别风险，监督残余风险，识别新风险，以及评估风险过程有效性的过程。（ ）不属于控制风险时使用的工具与技术。（16年11月第65题）
- A、变差和趋势分析　　B、SWOT分析
- C、技术绩效测量　　D、风险审计

【答案】B
【解析】SWOT分析是识别风险的工具。控制风险的工具有：1.技术绩效测量2.风险再评估3.风险审计4.会议5.储备分析6.偏差和趋势分析

风险管理—3.

- 在进行项目风险定性分析时，可能会涉及到（　）。（18年5月第67题）
- A、建立概率及影响矩阵　　B、决策树分析
- C、敏感性分析　　D、建模和模拟

【答案】A
【解析】题目问的可能会涉及到，意思是风险定性分析时，用到哪些工具（B、C、D均属于定量风险的工具）。定性风险分析的工具有：1.风险数据质量评估2.风险紧迫性评估3.风险分类4.专家判断5.风险概率与影响评估6.概率和影响矩阵

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

风险管理—4.

- （　）不属于定量风险分析的技术方法。（15年11月第69题）
- A、决策树分析　　B、概率和影响矩阵
- C、计划评审技术　　D、蒙特卡洛分析

【答案】B
【解析】概率和影响矩阵是定性风险排序用的工具。定量风险分析工具有：1.专家判断2.定量风险分析和模型（建模）技术（敏感性分析、预期货币价值分析、决策树分析、建模和模拟）3.数据收集和展示技术（访谈、概率分布）计划评审技术是PERT，三点估算可用于定量风险分析的工具

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

风险管理—5.

- （　）属于定量风险分析的工具和技术。（18年11月第67题）
- A、概率和影响矩阵　　B、风险数据质量评估
- C、风险概率和影响评估　　D、敏感性分析

【答案】D
【解析】（A、B、C均属于定性风险的工具）。定量风险分析工具有：1.专家判断2.定量风险分析和模型（建模）技术（敏感性分析、预期货币价值分析、决策树分析、建模和模拟）3.数据收集和展示技术（访谈、概率分布）

广东顶级名师讲师黄富财老师内部学习资料

风险管理—6.

- （ ）不属于“识别风险”过程的输入。（22年5月第65题）
- A、潜在风险应对措施清单　　B、范围基准
- C、风险管理计划　　D、质量管理计划

【答案】A

【解析】潜在风险应对措施清单和已识别风险应对措施清单是识别风险的输出。识别风险的输入有：1.事业环境因素2.组织过程资产3.干系人登记册4.活动成本估算5.活动持续时间估算6.项目文件7.采购文件8.风险管理计划9.范围基准10.进度管理计划11.成本管理计划12.人力资源管理计划13.质量管理计划

广东顶级名师黄富财老师内部学习资料

风险管理—7.

- 风险审计属于（　）过程的工具与技术。（22年5月第67题）
- A、定性风险分析　　B、风险控制
- C、定量风险分析　　D、风险规划

【答案】B
【解析】风险审计是检查并记录风险应对措施在处理已识别风险及其根源方面的有效性，以及风险管理过程的有效性。1.技术绩效测量2.风险再评估3.风险审计4.会议5.储备分析6.偏差和趋势分析

广东顶级名师黄富财老师内部学习资料

风险管理—8.

- （　）不属于控制风险的输入。（22年05月67题全国）
- A、风险管理计划　　B、风险登记册
- C、变更请求　　D、范围管理计划

【答案】C
【解析】风险控制的输出5大件，变更请求、工作绩效信息、项目管理计划更新、项目文件更新、组织过程资产更新。控制风险的输入有：1.风险登记册2.项目管理计划3.工作绩效数据4.工作绩效报告

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

风险管理—9.

- （　）不属于识别风险的输入。（22年11月65题）
- A、风险管理计划　　B、风险登记册
- C、范围基准　　D、组织过程资产

【答案】B
【解析】风险登记册是识别风险的输出。风险登记册的内容包括已识别的风险清单和潜在应对措施清单。识别风险的输入有：1.事业环境因素2.组织过程资产3.干系人登记册4.活动成本估算5.活动持续时间估算6.项目文件7.采购文件8.风险管理计划9.范围基准10.进度管理计划11.成本管理计划12.人力资源管理计划13.质量管理计划

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

风险管理—10.

- 识别风险过程的主要输出就是风险登记册，风险登记册始于识别风险过程，在项目实施过程中供其他风险管理过程和项目管理过程使用，风险登记册中的（　）内容是识别风险过程中产生的。（17年11月第66题）
- 风险紧迫性或风险分类　　B、已识别的风险清单
- C、商定的应对策略　　D、风险责任人及其职责

【答案】B

【解析】A、风险紧迫性或风险分类属于定性风险分析的工具。B、风险识别的输出风险登记册，内容包括已识别的风险清单、潜在应对措施清单。C、商定的应对策略属于规划风险应对的工具D、风险责任人及其职责（角色与职责）属于风险管理计划的的内容，即属于规划风险管理输出成果。

风险管理—11.

- 风险识别的输出是（　）。（18年5月第66题）
- A、风险因素　　B、已识别风险清单
- C、风险概率　　D、风险损失

【答案】B
【解析】风险识别的输出风险登记册，内容包括已识别的风险清单、潜在应对措施清单。

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

风险管理—12.

- （　）不属于定性风险分析的输出。（20年11月第66题）
- A、项目按时完成的概率　　B、风险评级和分值
- C、风险紧迫性　　D、风险分类

【答案】A
【解析】项目按时完成的概率即实现成本和时间目标的概率。这个属于定量风险分析的输出。定性风险分析的输出有：1.假设条件日志2.项目文件更新3.风险登记册更新（对每个风险的概率和影响评估；风险评级和分值；风险紧迫性；风险分类；低概率风险的观察清单；需要进一步分析的风险）

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

风险管理—13.

- （　）不属于风险定性分析的输出。（19年11月第66题）
- A、风险评级和分值　　B、实现项目目标的概率
- C、风险紧迫性　　D、风险分类

【答案】B
【解析】实现项目目标的概率定量风险分析的输出。风险定性分析的输出有：1.假设条件日志2.项目文件更新3.风险登记册更新（对每个风险的概率和影响评估；风险评级和分值；风险紧迫性；风险分类；低概率风险的观察清单；需要进一步分析的风险）

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

风险管理—14.

- 风险相关的项目文件随着定量风险分析产生的信息而更新，（　）不是在定量风险分析过程中产生的。（17年11月68）
- 风险评级和分值　　B、量化风险优先级清单
- C、项目的概率分析　　D、实现成本和时间目标的概率

【答案】A
【解析】风险定量分析的输出有：风险登记册的更新。1.项目的概率分析2.实现成本和时间目标的概率3.量分风险优先级的清单4.定量风险分析结果的趋势

风险管理—15.

- 对于那些未知但又无法主动管理的风险，需要进行（)23年5月
- A、应急储备 B、管理储备 C、定性分析 D、精准定量分析

【答案】A

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

风险管理—16

- （ ）不属于风险控制的工具或技术。 23年5月
- A、风险再评估
- B、偏差和趋势分析
- C、SWOT 分析
- D、技术绩效测量

【答案】C 识别风险的工具

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

采购管理—1.

- “实施采购”过程的依据包括（　）。（21年11月第59题）
- A、采购工作说明书　　B、资源日历
- C、变更请求　　D、工作绩效报告

【答案】A
【解析】资源日历和变更请求是实施采购的输出。工作绩效报告是控制采购的输入。实施采购的依据输入有：1.采购管理计划2.采购工作说明书3.采购文件4.供方选择标准5.“自制/外购”决策6.项目文件7.组织过程资产8.卖方建议书

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

采购管理—2.

- 控制采购的输入不包括（ ）。（18年11月第60题）
- A、合同管理计划　　B、采购档案　　C、合同　　D、采购文件

【答案】B
【解析】此题是争议题，答案选B更加合理，采购档案是在结束采购后形成的，组织过程资产更新的内容。A合同管理计划输入进来能更好地细化采购帮助控制。控制采购的输入有：1.批准的变更请求2.采购文件3.合同4.项目管理计划5.工作绩效数据6.工作绩效报告

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

采购管理—3.

- 采购人员按照（　）的安排实施采购活动。（18年5月第59题）
- A、采购工作说明书　　B、需求文档
- C、活动资源需求　　D、采购计划

【答案】D
【解析】采购管理计划为整个采购过程的安排（从如何形成采购文件到合同收尾）提供了指南。所以采购人员按照采购管理计划的安排实施采购活动。实施采购的输入有：1.采购管理计划2.采购工作说明书3.采购文件4.供方选择标准5.“自制/外购”决策6.项目文件7.组织过程资产8.卖方建议书

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

采购管理—4.

- 实施采购过程中往往需要综合采用多种办法，来保证采购能够顺利进行。（　）不属于实施采购过程中需要用到的方法和技术。（16年11月第57题）
- A、投标人会议　B、自制/外购分析
- C、独立估算　　D、采购谈判

【答案】B
【解析】这个是采购规划的工具。实施采购的工具有：1.专家判断2.评价技术3.分析技术4.会议5.谈判6.独立估算7.刊登广告

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

采购管理—5.

- （　）不属于控制采购过程的工具与技术。（19年5月第59题）
- A、工作绩效信息　　B、合同变更控制系统
- C、采购绩效审计　　D、检查与审计

【答案】A
【解析】工作绩效信息是其他管理领域监控中得到的信息。即输出工作绩效信息。也是项目整体管理中监控项目工作的输入。控制采购过程的工具有：1.采购绩效审查2.报告绩效3.检查和审计4.索赔管理5.支付系统6.合同变更控制系统7.记录管理系统

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

采购管理—6.

- （　）不属于编制采购计划的输入。（22年5月第58题）
- A、项目管理计划　　B、需求文档
- C、项目组织过程资产　D、项目工作说明书

【答案】D
【解析】项目工作说明书，是制定项目章程的输入。还要注意一个采购工作说明书，是规划采购管理的输出哦。采购管理计划的输入有：1.活动成本估算2.活动资源要求3.项目管理计划4.事业环境因素5.组织过程资产6.风险登记册7.干系人登记册8.项目进度9.需求文档

广东顶级名师黄富财老师内部学习资料

采购管理—7.

- 结束采购的成果不包括（ ）。（22年05月59题全国）
- A、经验总结　　B、采购文件
- C、可交付物验收　D、采购档案

【答案】B
【解析】采购文件是结束采购的输入，为结束合同，需要收集全部采购文档，并建立索引和加以归档。结束采购的输出有：1.组织过程资产更新，内容包括（采购档案，可交付物验收，经验教训文件）2.结束的采购、合同

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

采购管理—8.

- 不是编制采购管理计划的输入（　）（22年11月57题全国）
- A、WBS　　B、需求文档
- C、项目进度　D、采购文件

【答案】D
【解析】采购文件是用来得到潜在卖方的报价建议书。所以这个是规划采购的输出成果。编制采购管理计划的输入有：1.活动成本估算2.活动资源要求3.项目管理计划4.事业环境因素5.组织过程资产6.风险登记册7.干系人登记册8.项目进度9.需求文档

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

采购管理—9.

- （　）不属于结束采购时使用的工具和技术。（22年11月58题）
- A、采购估算　　B、采购审计　　C、采购谈判　　D、记录管理系统

【答案】A
【解析】采购估算，是独立估算常被称为“合理费用”估算，是采购组织能在够对其成本进行独立的估算以检查卖方建议书中的报价。是实施采购的工具。结束采购的工具有：1.采购谈判2.采购审计3.记录管理系统

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料

感谢您的聆听!

只要努力，一切皆有可能!

广东顶级名讲师黄富财老师内部学习资料
