默写内容归纳（多看，多理解，不要死背）



37、质量工具、新七、老七等

- **规划质量管理**工具与技术

成本效益分析、质量成本、七种基本质量工具、标杆对照、实验设计、统计抽样、其他质量管理工具（头脑风暴、立场分析、名义小组）、会议

实施质量保证的工具和技术：质量管理和控制工具、质量审计、过程分析

质量控制：七种基本质量工具、统计抽样、检查、审计已批变更请求

- **新七：**关联图、活动网络图、过程决策程序图、亲和图、优先矩阵、矩阵图、树形图

【口诀：联网过河先锯树】

- **老七：**因果图、流程图、核查表、帕累托图（即排列图）、直方图、控制图、散点图

【口诀：因流核帕直控散】

38、**批准的变更请求可能包括：**如缺陷补救、修订的工作方法和修订的进度计划。

39、质量测量指标的例子包括：准时性，成本控制，缺陷频率，故障率，可用性，可靠性和测试覆盖度等

39、质量审计的目标是

（1）识别全部正在实施的良好及最佳实践；

（2）识别全部违规做法、差距及不足；

（3）分享所在组织或行业中类似项目的良好实践；

（4）积极、主动地提供协助，以改进过程的执行，从而帮助团队提高生产效率；

（5）强调每次审计都应对组织经验教训的积累做出贡献。

40、质量成本的内容

质量成本指在产品生命周期中发生的所有成本，包括为预防不符合要求、为评价产品或服务是否符合要求，以及因未达到要求而发生的所有成本。**质量成本类型**如图所示：



41、范围确认跟质量控制的区别

范围确认是关注可交付成果的验收

质量控制是关注可交付成果的正确性及是否满足质量要求。

先质量控制然后范围确认，二者也可以同时进行。

42、组织结构图和职位描述：

- 可使用多种形式描述项目的角色和职责，最常用的有三种：
  层次结构图、责任分配矩阵和文本格式
- 层次结构图包含：
  工作分解结构 WBS、组织分解结构 OBS、资源分解结构 RBS

43、项目人力资源管理计划包括：

- 角色和职责的分配：
  （1）角色　（2）职权　（3）职责　（4）能力
- 项目的组织结构图
- 人员配备管理计划（背）：
  （1）人员招募
  （2）资源日历
  （3）人员遣散计划
  （4）培训需求
  （5）表彰和奖励
  （6）遵守的规定
  （7）安全性

44、组建项目团队的工具和技术（背）

（1）事先分派　（2）谈判　(3)招募　(4)虚拟团队　(5)多维决策分析

45、人力资源五个阶段（团队建设 5 阶段，背）

(1)形成阶段：一个个独立的个体成员转变为团队成员，开始形成共同目标，对未来团队往往有美好的期待。

(2)震荡阶段：团队成员开始执行分配的任务，一般会遇到超出预想的困难，希望被现实打破。个体之间开始争执，互相指责，并且开始怀疑项目经理的能力。

(3)规范阶段：经过一定时间的磨合，团队成员之间相互熟悉和了解，矛盾基本解决，项目经理能够得到团队的认可。

(4)发挥阶段：随着相互之间的配合默契和对项目经理的信任，成员积极工作，努力实现目标。

(5)结束阶段：随着项目的结束，团队也被遣散了。

新增一个人或者减少一个人，团队建设又会回到形成阶段。

46-1、团队效率的评估可以包含以下几个指标。

（1）技能的改进　（2）能力和情感方面的改进
（3）团队成员流动率降低　（4）增加团队的凝聚力

46-2、建设团队和管理团队的定义。

建设团队：提高工作能力，促进团队成员互动，改善团队整体氛围，以提高项目绩效。
管理团队：跟踪团队成员工作表现，提供反馈，解决问题并管理团队变更，以优化项目绩效

47、冲突的特点、冲突解决办法，马斯洛

- **冲突的特点：**

当在一个团队的环境下处理冲突时，项目经理应该认识到冲突的下列特点。

（1）冲突是自然的，而且要找出一个解决办法。
（2）冲突是一个团队问题，而不是某人的个人问题。



（3）应公开地处理冲突。
（4）冲突的解决应聚焦在问题，而不是人身攻击。
（5）冲突的解决应聚焦在现在，而不是过去

- **冲突的解决办法：**

(1)问题解决。

问题解决就是冲突各方一起积极地定义问题、收集问题的信息、制定解决方案，最后直到选择一个最合适的方案来解决冲突，此时为双赢或多赢。但在这个过程中，需要公开地协商，这是冲突管理中最理想的一种方法。

(2)合作。集合多方的观点和意见，得出一个多数人接受和承诺的冲突解决方案。

(3)强制。

强制就是以牺牲其他各方的观点为代价，强制采纳一方的观点。一般只适用于赢-输这样的零-和游戏情景里。

(4)妥协。

妥协就是冲突的各方协商并且寻找一种能够使冲突各方都有一定程度满意、但冲突各方没有任何一方完全满意、是一种都做一些让步的冲突解决方法。

(5)求同存异。

求同存异的方法就是冲突各方都关注他们一致的一面，而淡化不一致的一面。一般求同存异要求保持一种友好的气氛，但是回避了解决冲突的根源。也就是让大家都冷静下来，先把工作做完。

(6)撤退。撤退就是把眼前的或潜在的冲突搁置起来，从冲突中撤退。

- **马斯洛**

(1)生理需要：对衣食住行等需要都是生理需要，这类需要的级别最低，人们在转向较高层次的需要之前，总是尽力满足这类需要。

(2)安全需要：安全需要包括对人身安全、生活稳定、不致失业以及免遭痛苦、威胁或疾病等的需要。和生理需要一样，在安全需要没有得到满足之前，人们一般不追求更高层的需要。

(3)社会交往的需要：社会交往(社交)需要包括对友谊、爱情以及隶属关系的需要。当生理需要和安全需要得到满足后，社交需要就会突出出来，进而产生激励作用。这些需要如果得不到满足，就会影响员工的精神，导致高缺勤率、低生产率、对工作不满及情绪低落。

(4)自尊的需要：指自尊心和荣誉感。

(5)自我实现的需要：指想获得更大的空间以实现自我发展的需要。

- **X,Y 理论：**

◆ **X 理论**

主要体现了独裁型管理者对人性的基本判断，这种假设认为：

(1)一般人天性好逸恶劳，只要有可能就会逃避工作。

(2)人生来就以自我为中心，漠视组织的要求。

(3)人缺乏进取心，逃避责任，甘愿听从指挥，安于现状，没有创造性。

(4)人们通常容易受骗，易受人煽动。

(5)人们天生反对改革。

崇尚 X 理论的领导者认为，在领导工作中必须对员工采取强制、惩罚和解雇等手段，强迫员工努力工作，对员工应当严格监督、控制和管理。在领导行为上应当实行高度控制和集中管理，在领导风格上采用独裁式的领导方式。


◆ **Y 理论**

Y 理论对人性的假设与 X 理论完全相反，其主要观点为：

(1)一般人天生并不是好逸恶劳，他们热爱工作，从工作得到满足感和成就感。

(2)外来的控制和处罚对人们实现组织的目标不是一个有效的办法，下属能够自我确定目标，自我指挥和自我控制。

(3)在适当的条件下，人们愿意主动承担责任。



(4)大多数人具有一定的想象力和创造力。
(5)在现代社会中，人们的智慧和潜能只是部分地得到了发挥。
基于Y理论对人的认识，信奉Y理论的管理者对员工采取民主型和放任自由型的领导方式，在领导行为上遵循以人为中心的、宽容的及放权的领导原则，使下属目标和组织目标很好地结合起来，为员工的智慧和能力的发挥创造有利的条件。

48、优秀的团队特点

(1)团队的目标明确，成员清楚自己的工作对目标的贡献。
(2)团队的组织结构清晰，岗位明确。
(3)有成文或习惯的工作流程和方法，而且流程简明有效。
(4)项目经理对团队成员有明确的考核和评价标准，工作结果公正公开、赏罚分明。
(5)共同制订并遵守的组织纪律。
(6)协同工作，也就是一个成员工作需要依赖于另一个成员的结果，善于总结和学习。

49、虚拟团队优缺点，项目经理五个权力

- **优点：**
  ①在公司内部建立一个由不同地区员工组成的团队。
  ②为项目团队增加特殊技能的专家，即使这个专家不在本地。
  ③把在家办公的员工纳入虚拟团队，以协同工作。
  ④由不同班组(早班、中班和夜班)员工组成一个虚拟团队。
  ⑤把行动不便或残疾的员工纳入团队。
  ⑥可以实施那些原本因为差旅费用过高而被忽略的项目。
- **缺点：**能产生误解、有孤立感、团队成员之间难以分享知识和经验、采用通信技术也要花费成本等。

- **项目经理五个权力**

①合法的权力，是指在高级管理层对项目经理正式授权的基础上，项目经理让员工进行工作的权力。
②强制力，是指用惩罚、威胁或者其他消极手段强迫员工做他们不想做的事。
③专家权力，用个人知识和技能让员工改变他们的行为。
④奖励权力，就是使用一些激励措施来引导员工去工作。奖励包括薪金、职位、认可度、特殊的任务以及其他的奖励员工满意行为的手段。
⑤感召权力。权力是建立在个人感召权力的基础上。人们非常尊重某些具有感召权力的人，会按照他们所说的去做。

50-1、干系人管理计划

(1)关键干系人的所需参与程度和当前参与程度；干系人变更的范围和影响；
(2)干系人之间的相互关系和潜在交叉；
(3)项目现阶段的干系人沟通需求；
(4)需要分发给干系人的信息，包括语言、格式、内容、详细程度和发送频率；
(5)分发相关信息的理由，以及可能对干系人参与所产生的影响；
(6)随着项目的进展，更新和优化干系人管理计划的方法。

50-2、干系人管理和沟通管理的区别

- 沟通管理强调对项目信息的计划、收集、存储、组织、发布，以及监控沟通以保证沟通的高效性。



- 项目干系人管理强调的不仅是要管理干系人的期望，更要保证他们的适度参与，而后者是项目成功非常关键的因素之一。

51、沟通管理计划

(1)干系人的沟通需求。
(2)针对沟通信息的描述，包括格式、内容、详尽程度等。
(3)发布信息的原因。
(4)负责信息沟通工作的具体人员。
(5)负责信息保密工作的具体人员的授权。
(6)信息接收的个人或组织。
(7)沟通渠道的选择。
(8)信息传递过程中所需的技术或方法。
(9)进行有效沟通所必须分配的各种资源，包括时间和预算。
(10)沟通频率，例如，每周沟通等。

52-1、沟通的方法（3 个）沟通的方式（4 个）

- **沟通的方法（3 个）：**

①交互式沟通。

在两方或多方之间进行多向信息交换。包括会议、电话、即时通信、视频会议等。

②推式沟通。把信息发送给需要接收这些信息的特定接收方。这种方法可以确保信息的发送，但不能确保信息送达受众或被目标受众理解。推式沟通包括信仲、备忘录、报告、电子邮件、传真、语音邮件、日志、新闻稿等。

③拉式沟通。用于信息量很大或受众很多的情况。要求接收者自主、自行地访问信息内容。这种方法包括企业内网、电子在线课程、经验教训数据库、知识库等。

- **沟通的方式（4 个）：**参与讨论方式、征询方式、推销方式（说明）、叙述方式（穿针说细）


52-2、管理沟通，控制沟通的定义。

- **管理沟通：**根据沟通管理计划，生成、收集、分发、储存、检索及最终处置项目信息的过程。就是保障干系人之间有效地沟通。有效地沟通包括效果和效率两方面的内容。
- **控制沟通：**在项目执行的过程中，需要对沟通过程进行适当的监督和控制，确保沟通过程的目的能够实现。

53、干系人登记册为项目的沟通计划提供了干系人的信息，从干系人登记册中，可以知道项目中干系人的信息：主要沟通对象(主要干系人)、关键影响人、次要沟通对象(次要干系人)。

54、权利利益方格，干系人参与评估矩阵

权利利益方格：

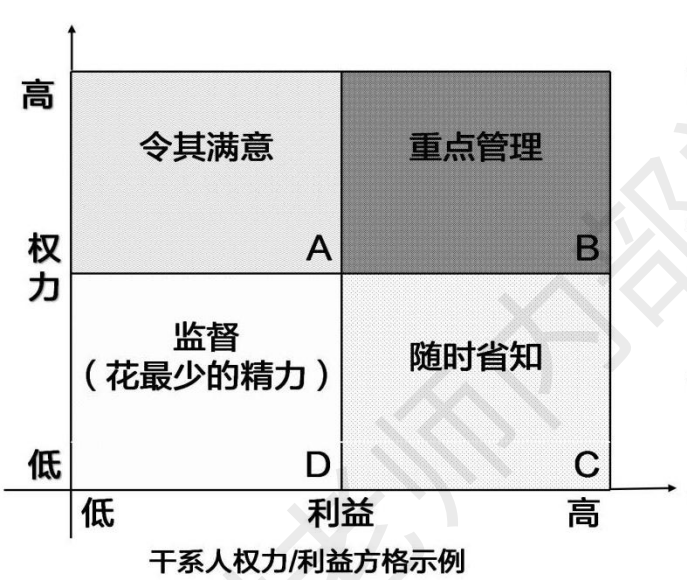

干系人权力/利益方格示例

A区令其满意

例如：不是直接管理的部门领导、政府、部门内领导

B区重点管理

例如：项目的客户，项目经理的主管领导、甲乙项目团队成员，直接管理的政府部门

C区随时告知

例如：粉丝、用户、供应商

D区监督

例如：不同行业的企业、竞争者

55、编制干系人管理计划的工具与技术中的分析技术：项目经理已通过干系人分析技术把干系人分为如下各类：

（1）不了解 （2）抵制 （3）中立 （4）支持 （5)领导

56、干系人参与评估矩阵

“干系人参与评估矩阵”记录干系人的当前参与程度，如图所示。其中，C 表示干系人当前参与程度，D 表示所需干系人参与程度。

干系人	不知晓	抵制	中立	支持	领导
干系人 1	C			D	
干系人 2			C	D	
干系人 3				DC	

57-1、识别干系人的 3 步骤

(1)识别全部潜在项目干系人及其相关信息。

(2)识别每个干系人可能产生的影响或提供的支持，并把他们分类，以便制定管理策略。

(3)评估关键干系人对不同情况可能做出的反应或应对，以便策划如何对他们施加影响，提高他们的支持和减轻他们的潜在负面影响。

57-2、管理干系人参与和控制干系人参与的作用和定义。

- **管理干系人参与：**管理干系人参与，就是依据干系人管理计划， 在整个项目生命周期中，与干系人进行日常的沟通和协作，以满足其需要与期望，解决实际出现的问题，并促进干系人合理参与项目活动的过程。
- **控制干系人参与：**这个过程实时观察计划与实际之间的偏差，全面监督项目干系人之间的关系。发现问题时，及时调整策略和计划，以调动干系人参与的过程。

58、风险的各工具和技术，风险应对策略

- **识别风险的工具与技术**

（1）文档审查

（2）信息收集技术（头脑风暴、德尔菲技术、访谈、根本原因分析）

（3）核对单分析

（4）假设分析

（5）图解技术：因果图、系统或过程流程图、影响图
（6）SWOT 分析

- **规划风险应对的工具与技术**
  （1）消极风险或威胁的应对策略：**规避、转移、减轻、接受**
  （2）积极风险或机会的应对策略：**开拓、提高、分享、接受**
  （3）应对应急策略
- **控制风险的工具与技术**
  （1）风险再评估　　（2）风险审计　　（3）偏差和趋势分析
  （4）技术绩效测量　　（5）储备分析

59、风险的类别

- 按照性质划分
  (1)纯粹风险：是指只有损失可能性而无获利可能性的风险。
  (2)投机风险：是相对于纯粹风险而言的，是指既有损失的可能又有获利机会的风险。
- 按照产生原因划分
  (1)自然风险　(2)社会风险　(3)政治风险　(4)经济风险　(5)技术风险

60、风险管理过程输出的内容

- **识别风险的输出**
  (1)风险登记册　　(2)已识别的风险清单　　(3)潜在应对措施清单
- **定性风险的输出**
  (1)对每个风险的概率和影响评估　(2)风险评级和分值
  (3)风险紧迫性或风险分类　　(4)定性风险的输出
  (5)低概率风险的观察清单;或需要进一步分析的风险

- **定量风险的输出**
  (1)项目文件(风险登记册)更新
  (2)项目的概率分析
  (3)实现成本和时间目标的概率
  (4)量分风险优先级的清单
  (5)定量风险的输出
  (6)定量风险分析结果的趋势
