# 默写内容归纳-3

## （多看，多理解，不要死背）



**61、风险管理计划包括以下内容。**

①方法论　②角色与职责　③预算　④时间安排
⑤风险类别　⑥风险概率和影响的定义
⑦概率和影响矩阵　⑧修订的干系人承受力

**62、风险识别的原则包括：**

(1)由粗及细，由细及粗。
(2)严格界定风险内涵并考虑风险因素之间的相关性。
(3)先怀疑，后排除。
(4)排除与确认并重。对于肯定不能排除但又不能肯定予以确认的风险按确认考虑。
(5)必要时，可作实验论证。

**63、变更请求的四种措施**

纠正措施、适应性措施、预防性措施、完善性措施（更新）

**64、配置管理的 6 个活动，配置库，配置审计的内容**

- **配置管理的 6 个活动：**制定配置管理计划、配置标识、配置控制、配置状态报告、配置审计、发布管理和交付
- **配置库：**可以分为**开发库、受控库、产品库** 3 种类型。

**（1）开发库：**也称为动态库、程序员库或工作库，用于保存开发人员当前正在开发的配置实体。动态中的配置项被置于版本管理之下。动态库是开发人员的个人工作区，由开发人员自行控制。库中的信息可能有较为频繁的修改，只要开发库的使用者认为有必要，无需对其进行配置控制，因为这通常不会影响到项目的其他部分。

**（2）受控库：**也称为主库，包含当前的基线加上对基线的变更。受控库中的配置项被置于完全的配置管理之下。在信息系统开发的某个阶段工作结束时，将当前的工作产品存入受控库。

**（3）产品库：**也称为静态库、发行库、软件仓库，包含已发布使用的各种基线的存档，被置于完全的配置管理之下。在开发的信息系统产品完成系统测试之后，作为最终产品存入产品库内，等待交付用户或现场安装。


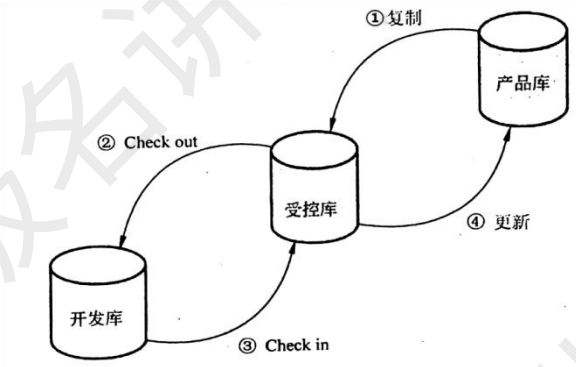



图 15-3　基于配置库的变更控制



- **配置审计的内容**

**配置审计：**也称配置审核或配置评价，包括功能配置审计和物理配置审计，分别用以验证当前配置项的一致性和完整性。

**1.功能配置审计：**是审计配置项的一致性(配置项的实际功效是否与其需求一致)，具体验证以下几个方面：

(1)配置项的开发已圆满完成。

(2)配置项已达到配置标识中规定的性能和功能特征。

(3)配置项的操作和支持文档已完成并且是符合要求的。

**2.物理配置审计：**是审计配置项的完整性(配置项的物理存在是否与预期一致)，具体验证如下几个方面：

(1)要交付的配置项是否存在。

(2)配置项中是否包含了所有必需的项目。

## 65、变更管理的角色和职责,CCB 作用

- **变更管理的角色和职责**

**（1）变更申请人:**提出变更申请的相关人员。

**（2）项目经理:**对变更管理负责。负责变更申请的影响分析、召开变更控制委员会会议、监控变更及已批准变更的正确实施等。

**（3）变更控制委员会:**是变更管理的决策机构。

**（4）变更实施人:**实施已批准的变更的相关人员。

- **CCB 作用**

（1）批准配置项的标识，以及信息系统的基线建立

（2）制定访问控制策略

（3）建立更改基线的设置，审核变更申请

（4）根据配置管理员的报告决定相应的对策

## 66、SOW 工作说明书,工作说明书与项目范围说明书的区别，合同

- **工作说明书:**

工作说明书（SOW）是对项目所要提供的产品、成果或服务的描述。对内部项目而言，项目发起者或投资人基于业务需要、产品或服务的需求提出工作说明书。内部的工作说明书有时也叫任务书。

(1)前言。对项目背景等信息作简单描述。

(2)项目工作范围。

(3)项目工作方法。

(4)假定。项目进行的假定条件，具体内容需双方达成。

(5)工作期限和工作量估计。

(6)双方角色和责任。

(7)交付件。

(8)完成以及验收标准。

(9)服务人员。

(10)聘用条款。

(11)收费和付款方式。

(12)变更管理。

(13)承诺。

(14)保密。遵守保密协议（保密条款另行签署）。

- **工作说明书与项目范围说明书的区别：**

工作说明书是对项目所要提供的产品或服务的叙述性的描述；
项目范围说明书则通过明确项目应该完成的工作来确定项目的范围。

- **合同的内容：**

（1）当事人各自权利、义务
（2）项目费用及及工程款的支付方式
（3）项目变更的约定
（4）违约责任，验收标准，质量要求，签约时间，合同截止日期
（5）甲乙双方姓名，联系方式，联系地址
（6）支付方式等

## 67、分包的特点，合同的类型及特点

- **分包的特点**

签订分包合同应当同时具备两个条件：第一，承包人只能将自己承包的非关键、非主体部分工程分包给具有相应资质条件的分包人，而且不可以进行二次分包；第二，分包工程必须经过发包人同意。

- **合同的类型**

(1)按信息系统范围划分的合同分类
1. 总承包合同
2. 单项工程承包合同
3. 分包合同

(2)按项目付款方式划分的合同分类
1. 总价合同**用于需求明确风险在乙方**
2. 成本补偿合同**用于需求很不明确风险在甲方，开口合同**
3. 工料合同**用于增加人员，需求不很明确风险平摊开口合同**

## 68、招投标流程，立项流程

- **招投标流程：**

（1）发布招标公告　　（2）投标人购买标书并编写投标文件
（3）在截止日期前提交投标文件　（4）评审标书
（5）确定中标候选人　　（6）确定中标人
（7）发布中标公告并发送中标通知　（8）签订书面合同

- **立项流程**


**甲立项流程：**需求调研--编写项目申请书--可行性研究--项目论证--项目评估--评审获取批准--发布招标文件

**乙方立项流程：**看到招标文件--进行项目识别--可行性研究--项目论证--项目评估--参加投标--中标--签订合同

## 69、采购单一来源、竞争性谈判，询价，邀请招标流程

- **采购单一来源**

（1）只能从唯一供应商处采购的；
（2）发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的；
（3）必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。



- **询价**

（1）成立询价小组。询价小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

（2）确定被询价的供应商名单。询价小组根据采购需求，从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商，并向其发出询价通知书让其报价。

（3）询价。询价小组要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格。

（4）确定成交供应商。采购人根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有被询价的未成交的供应商。

- **竞争性谈判**

（1）成立谈判小组。谈判小组由采购人的代表和有关专家共三人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的三分之二。

（2）制定谈判文件。

（3）确定邀请参加谈判的供应商名单。谈判小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于三家的供应商参加谈判，并向其提供谈判文件。

（4）谈判。谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

（5）确定成交供应商。谈判结束后，谈判小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商，并将结果通知所有参加谈判的未成交的供应商。

- **邀请招标流程：**

邀请招标流程如下：

（一）发布投标邀请；

（二）发放招标文件；

（三）资格预审；

（四）投标预备会；

（五）开标；

（六）评标（资格后审）；

（七）中标；

（八）合同谈判与签订

**70、合同变更的原则和方法，索赔流程**

- **合同变更的原则和方法：**

“公平合理”是合同变更的处理原则，变更合同价款按下列方法进行。

（1）首先确定合同变更量清单，然后确定变更价款。

（2）合同中已有适用于项目变更的价格，按合同已有的价格变更合同价款。

（3）合同中只有类似于项目变更的价格，可以参照类似价格变更合同价款。

（4）合同中没有适用或类似项目变更的价格，由承包人提出适当的变更价格，经监理工程师和业主确认后执行。

- **索赔流程：**


**（1）提出索赔要求**

在知道或应当知道索赔事项发生后 28 天内，索赔方应以书面的索赔通知书形式，向监理工程师正式提出索赔意向通知。

**（2）报送索赔资料**

在索赔通知书发出后的 28 天内，索赔方应向监理工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失

的详细索赔报告及有关资料。索赔报告的内容主要有总论部分、根据部分、计算部分和证据部分。



**（3）监理工程师答复**

监理工程师在收到索赔方送交的索赔报告及有关资料后，应于 28 天内给予答复，或要求索赔方进一步补充索赔理由和证据。

监理工程师逾期答复后果：监理工程师在收到承包人送交的索赔报告及有关资料后，28 天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经得到认可。

**（4）索赔认可**

如果索赔方或发包人均接受监理工程师对索赔的答复，即索赔获得认可。

**71、常见的采购文件**

(1)方案邀请书（RFP）
(2)报价邀请书（RFQ）
(3)征求供应商意见书（RFI）
(4)投标邀请书（IFB）
(5)招标通知
(6)洽谈邀请
(7)承包商初始建议征求书

**72、信息系统项目相关信息（文档）管理的规则和方法**

**信息系统文档的规范化管理主要体现在：**

文档书写规范、图表编号规则、文档目录编写标准和文档管理制度等几个方面。

文件的版本的状态：草稿，正式，修改。

**73、计算机系统安全保护能力的五个等级，即：**

(1)用户自主保护级
(2)系统审计保护级
(3)安全标记保护级
(4)结构化保护级
(5)访问验证保护级

**74、控制工作的内容和输出的五大件**

- **控制工作的内容：**
  1. 监控状态
  2. 对变更的因素施加影响
  3. 判断变更是否发生
  4. 发生了要走变更控制的流程
  5. 提出必要的措施
- **控制输出的五大件：**
  ①项目管理计划更新
  ②变更请求
  ③工作绩效信息
  ④项目文件更新
  ⑤组织过程资产更新

**75、十大管理每个管理下的过程**

看“螃蟹图”

看到**文件缺少什么，想到记叙文，时间，地点，人物，事件！！！
